



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná
www.pmfi.pr.gov.br

Foz do Iguaçu, 08 de novembro de 2023.

Ofício nº 21017/23 – GAB - GABINETE DO PREFEITO

Assunto: **RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 722/2023.**

Senhor Presidente,

Em atenção ao Requerimento nº 722/2023, de autoria do Nobre Vereador Cabo Cassol, encaminhado pelo Ofício nº 1452/2023-GP, de 11 de outubro de 2023, dessa Casa de Leis, sobre prestação de contas na execução do Contrato nº 024/2023, pactuado entre o Município de Foz do Iguaçu e a empresa Vogue, remetemos a manifestação da Secretaria Municipal de Obras, por meio do Memorando nº 58720, de 20 de outubro de 2023, e da Secretaria Municipal da Fazenda, por meio o Memorando nº 59414, de 24 de outubro de 2023.

Atenciosamente,

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:

Nilton Aparecido Bobato – **Secretário Municipal da Transparência e Governança**
 Francisco Lacerda Brasileiro - **Prefeito Municipal**

Ao Senhor
JOÃO MORALES
 Presidente da Câmara Municipal
FOZ DO IGUAÇU – PR

D E S P A C H O

- 1 – Leitura no expediente;
- 2 – À disposição no SAPL.

Em 10/11/2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná
www.pmfi.pr.gov.br

MEMORANDO INTERNO

Emitente:	SMOB/DIOB - DIRETORIA DE OBRAS	Data: 20/10/2023
Destinatário:	SMAD / DIAD / DVCMR - DIVISÃO DE CONTROLE E MONITORAMENTO DOS REQUERIMENTOS LEGISLATIVOS.	Número: 58720/2023
Assunto:	R: REQUERIMENTO Nº 722/2023	

Em resposta ao requerimento nº 722/2023 referente do Contrato 24/2023 especificamente sobre os serviços prestados pela empresa Vogue na Escola Municipal Monteiro Lobato, segue:

- 1) Seguem duas planilhas de medição com os serviços realizados em que está inserida a Escola Municipal Monteiro Lobato.
- 2) Seguem notas fiscais da 1ª e 2ª medição em que está inserida a Escola Municipal Monteiro Lobato.
- 3) Não houve aditivo referente a Escola Municipal Monteiro Lobato.
- 4) Na vistoria final de obra não foram encontradas pendências, conforme segue em relatório final em anexo.

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:

BRUNA ANDRADE PARCIANELLO CAMPOS
 Luis Cezar Furlan - **Secretário Municipal de Obras**
 VALDIR LAVINICKI

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AUMENTO DE CARGA DO PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES ESCOLARES	CONTRATO:	24/2023			
ENDEREÇO:	Escola Municipal Altair Ferraz Zizo – Avenida Andradina, 2290 –Jardim pê, CEP 85869-536; Escola Municipal Antônio Gonçalves Dias – Rua Purus, 234 – Campos do Iguaçu, CEP 85857-130;Escola Municipal Monteiro Lobato – Rua Angela Aparecida Andrade,145 – Foz do Iguaçu Parte II, CEP 85867-500; Escola Municipal Professora Elenice Milhorança – Rua Di Cavalcanti,523 – Jardim América, CEP 85864-290.		DATA CONTRATO:	25/01/2023		
CONTRATADA:	VOUGUE FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA		TOMADA DE PREÇO:	13/02/2022		
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	IGOR DE SOUZA MORAES		DATA ORDEM SERVIÇO:	06/03/2023		
FISCAL	BRUNA ANDRADE PARCIANELLO CAMPOS		VIGÊNCIA CONTRATUAL:	210 dias (23/08/2023)		
PERÍODO MEDIDO :	1ª MEDIDA - 06/03/2023 a 12/06/2023		PRAZO EXECUÇÃO:	150 dias (03/08/2023)		



**Governo do Município
de Foz do Iguaçu**
Construindo uma nova cidade

ITEM	CÓDIGO DO SERVICO	FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO DO ITEM (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	Data: 12/06/2023			
									A MEDIR	A PAGAR	QUANT	CUSTO (R\$)
1			SERVIÇOS INICIAIS					12.430,00	52,05%		48%	R\$ 5.960,00
1.2	PMFI-1288	PMFI-	REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE ITENS DIVERSOS - ESTIMADO POR HORA DE SERVIÇO	H	8,00	55,00	440,00		0,00	R\$ 0,00	8,00	R\$ 440,00
1.2	PMFI	PMFI-115	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TAPUME COM TELA PLÁSTICA LARANJA, COM 1,20 M DE ALTURA, PARA ISOLAMENTO DE OBRAS OU EM VALAS, 2 UTILIZAÇÕES	M	60,00	12,00	720,00		0,00	R\$ 0,00	60,00	R\$ 720,00
1.3	PMFI	PMFI-1313	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - GERENCIAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRA - (ENGENHEIRO CIVIL 10H X MÊS)+(ENCARREGADO GERAL 75H X MÊS)	%	100,00	80,00	8.000,00		40,00	R\$ 3.200,00	60,00	R\$ 4.800,00
2			ALTAIR FERREIRA ZIZO - 400A					R\$ 99.704,09	84,56%		15%	R\$ 15.391,84
2.1			ENTRADA DE ENERGIA					36.427,15	59,51%		40,49%	R\$ 14.750,49
2.1.1	PMFI	PMFI-1015	MURETA EM ALVENARIA PARA ENTRADA DE ENERGIA 3,5M X 2,00M x 0,20M. INCLUI ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO: ESTACAS ARMADAS (H=2M), VIGA BALDRAME 14X30CM, PILARETES 20X20CM E VIGA CINTA. COBERTURA EM TELHAMENTO CERÂMICO - EXCLUSIVO ACABAMENTOS	UN	1,00	2000,00	2.000,00		0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 2.000,00
2.1.2	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	7,00	4,32	30,24		0,00	R\$ 0,00	7,00	R\$ 30,24
2.1.3	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	7,00	35,89	251,23		0,00	R\$ 0,00	7,00	R\$ 251,23
2.1.4	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	7,00	3,15	22,05		0,00	R\$ 0,00	7,00	R\$ 22,05
2.1.5	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	7,00	16,39	114,73		0,00	R\$ 0,00	7,00	R\$ 114,73
2.1.6	PMFI	PMFI-1023	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, 4" APARENTE, INSTALADO EM PAREDE (OU POSTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BASEADO SINAPI 95752)	M	6,00	267,07	1.602,42		0,00	R\$ 0,00	6,00	R\$ 1.602,42
2.1.7	PMFI	PMFI-1024	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO 4", PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BASEADO SINAPI 93026)	UN	1,00	226,05	226,05		0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 226,05
2.1.8	PMFI	PMFI-1022	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO EM CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO 60X60 E SUBTAMPA PADRÃO COPEL (BASEADO SINAPI 97889)	UN	1,00	750,00	750,00		0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 750,00
2.1.9	PMFI	906	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, DN 100 MM (4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BASEADO SINAPI 91856)	M	15,00	21,94	329,10		0,00	R\$ 0,00	15,00	R\$ 329,10

RESPONSÁVEL TÉCNICO: FISCAL PERÍODO MEDIDO :	IGOR DE SOUZA MORAES		DATA ORDEM SERVIÇO: VIGÊNCIA CONTRATUAL: PRAZO EXECUÇÃO:	06/03/2023 210 dias (23/08/2023)		FOZ DO IGUAÇU PARANÁ - BRASIL TO BE FAMOUS IS TO LAST	Construindo uma nova cidade														
	BRUNA ANDRADE PARCIANELLO CAMPOS																				
	1ª MEDIDA - 06/03/2023 a 12/06/2023																				
										Data: 12/06/2023											
										SALDO	1ª MEDIDA										
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO DO ITEM (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	A MEDIR	A PAGAR	QUANT	CUSTO (R\$)									
2.1.10	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	1,35	93,79	126,62		0,00	R\$ 0,00	1,35	R\$ 126,62									
2.1.11	SINAPI	101618	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	M3	0,23	230,00	51,75		0,00	R\$ 0,00	0,23	R\$ 51,75									
2.1.12	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	1,11	56,87	63,38		0,00	R\$ 0,00	1,11	R\$ 63,38									
2.1.13	PMFI	PMFI-543	RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE BLOCO INTERTRAVADO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE PAVER - INCLUSIVE BERÇO, REJUNTAMENTO E COMPACTAÇÃO	M2	7,50	27,77	208,28		0,00	R\$ 0,00	7,50	R\$ 208,28									
2.1.14	SINAPI	93026	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	2,00	109,78	219,56		0,00	R\$ 0,00	2,00	R\$ 219,56									
2.1.15	PMFI	PMFI-907	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 100 MM (4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BASEADO SINAPI 91873)	M	5,00	81,04	405,20		0,00	R\$ 0,00	5,00	R\$ 405,20									
2.1.16	SINAPI	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,00	25,78	51,56		0,00	R\$ 0,00	2,00	R\$ 51,56									
2.1.17	SINAPI	91920	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	25,00	50,00		0,00	R\$ 0,00	2,00	R\$ 50,00									
2.1.18	SINAPI-I	1590	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 95 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	UN	25,00	15,43	385,75		0,00	R\$ 0,00	25,00	R\$ 385,75									
2.1.19	SINAPI-I	39211	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	UN	4,00	1,73	6,92		0,00	R\$ 0,00	4,00	R\$ 6,92									
2.1.20	SINAPI-I	39216	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4", PARA ELETRODUTO	UN	12,00	9,07	108,84		0,00	R\$ 0,00	12,00	R\$ 108,84									
2.1.21	SINAPI-I	39177	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	UN	4,00	1,98	7,92		0,00	R\$ 0,00	4,00	R\$ 7,92									
2.1.22	SINAPI-I	39182	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4", PARA ELETRODUTO	UN	12,00	11,22	134,64		0,00	R\$ 0,00	12,00	R\$ 134,64									
2.1.23	SINAPI	91886	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	15,82	63,28		0,00	R\$ 0,00	4,00	R\$ 63,28									
2.1.24	SINAPI-I	425	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2	UN	1,00	8,74	8,74		0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 8,74									
2.1.25	PMFI	PMFI-177	CAIXA BEP 30 X 30 X 20 CM, BARRAMENTO 210A, 3/4" X 3/16" - PADRÃO COPEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	525,29	525,29		0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 525,29									
2.1.26	PMFI	PMFI-178	CAIXA NS PARA DISJUNTOR 400A COM BARRAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	2909,49	2.909,49		0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 2.909,49									
2.1.27	PMFI	PMFI-180	CAIXA EN PADRÃO COPEL (PARA 2 MEDIDORES) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	531,29	531,29		0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 531,29									
2.1.28	PMFI	181	CAIXA FN PADRÃO COPEL (57 X 75 X 26 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	629,19	629,19		0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 629,19									
2.1.29	PMFI	PMFI-179	CAIXA CN PADRÃO COPEL (45 X 35 X 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	234,06	234,06		1,00	R\$ 234,06	0,00	R\$ 0,00									
2.1.30	PMFI	PMFI-1280	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020. (BASEADO SINAPI 101878)	UN	1,00	936,98	936,98		0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 936,98									
2.1.33	SINAPI	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	186,37	186,37		1,00	R\$ 186,37	0,00	R\$ 0,00									
2.1.37	PMFI	PMFI-1285	EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO, E PEDIDO DE LIGAÇÃO DE ENERGIA NA CONCESSIONÁRIA	UN	1,00	2000,00	2.000,00		0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 2.000,00									

RESPONSÁVEL TÉCNICO: FISCAL PERÍODO MEDIDO :	IGOR DE SOUZA MORAES	DATA ORDEM SERVIÇO: VIGÊNCIA CONTRATUAL: PRAZO EXECUÇÃO:	06/03/2023 210 dias (23/08/2023) 150 dias (03/08/2023)		Construindo uma nova cidade							
	BRUNA ANDRADE PARCIANELLO CAMPOS											
	1ª MEDIDA - 06/03/2023 a 12/06/2023											
									Data: 12/06/2023			
									SALDO			
									1ª MEDIDA			
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	FONTE	DESCRÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO DO ITEM (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	A MEDIR	A PAGAR	QUANT	CUSTO (R\$)
2.2			ATERRAMENTO					641,35	0,00%		100,00%	R\$ 641,35
2.2.1	SINAPI	96979	CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM ² , ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	3,00	109,59	328,77		0,00	R\$ 0,00	3,00	R\$ 328,77
2.2.2	SINAPI	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,00	25,78	77,34		0,00	R\$ 0,00	3,00	R\$ 77,34
2.2.3	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	2,00	45,96	91,92		0,00	R\$ 0,00	2,00	R\$ 91,92
2.2.4	PMFI	PMFI-1115	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COM CONECTOR (BASEADO SINAPI 96986)	UN	1,00	143,32	143,32		0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 143,32
3			ANTONIO GONÇALVES - 300A					R\$ 94.219,28	4,77%		95%	R\$ 89.726,57
3.1			ADAPTAÇÃO DO PLAYGROUND					915,89	0,00%		100,00%	R\$ 915,89
3.1.1	PMFI	PMFI-1288	REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE ITENS DIVERSOS - ESTIMADO POR HORA DE SERVIÇO	H	8,00	55,93	447,44		0,00	R\$ 0,00	8,00	R\$ 447,44
3.1.2	PMFI	PMFI-543	RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE BLOCO INTERTRAVADO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE PAVER - INCLUSIVE BERÇO, REJUNTAMENTO E COMPACTAÇÃO	M2	15,00	27,77	416,55		0,00	R\$ 0,00	15,00	R\$ 416,55
3.1.3	PMFI	PMFI-481	ACERTO DO SOLO NATURAL COM REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO	M2	15,00	3,46	51,90		0,00	R\$ 0,00	15,00	R\$ 51,90
3.2			ENTRADA DE ENERGIA					29.635,60	0,83%		99,17%	R\$ 29.389,11
3.2.1	PMFI	PMFI-1015	MURETA EM ALVENARIA PARA ENTRADA DE ENERGIA 3,5M X 2,00M x 0,20M. INCLUI ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO: ESTACAS ARMADAS (H=2M), VIGA BALDRAME 14X30CM, PILARETES 20X20CM E VIGA CINTA. COBERTURA EM TELHAMENTO CERÂMICO - EXCLUSIVE ACABAMENTOS	UN	1,00	2000,00	2.000,00		0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 2.000,00
3.2.2	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	7,00	4,32	30,24		0,00	R\$ 0,00	7,00	R\$ 30,24
3.2.3	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	7,00	35,89	251,23		0,00	R\$ 0,00	7,00	R\$ 251,23
3.2.4	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	7,00	3,15	22,05		0,00	R\$ 0,00	7,00	R\$ 22,05
3.2.5	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	7,00	16,39	114,73		0,00	R\$ 0,00	7,00	R\$ 114,73
3.2.6	PMFI	PMFI-1023	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, 4" APARENTE, INSTALADO EM PAREDE (OU POSTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BASEADO SINAPI 95752)	M	6,00	267,07	1.602,42		0,00	R\$ 0,00	6,00	R\$ 1.602,42
3.2.7	PMFI	PMFI-1024	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO 4", PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BASEADO SINAPI 93026)	UN	1,00	226,05	226,05		0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 226,05
3.2.8	PMFI	PMFI-1022	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO EM CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO 60X60 E SUBTAMPA PADRÃO COPEL (BASEADO SINAPI 97889)	UN	1,00	750,00	750,00		0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 750,00
3.2.9	PMFI	906	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, DN 100 MM (4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BASEADO SINAPI 91856)	M	12,00	21,94	263,28		0,00	R\$ 0,00	12,00	R\$ 263,28

RESPONSÁVEL TÉCNICO: FISCAL PERÍODO MEDIDO :	IGOR DE SOUZA MORAES	DATA ORDEM SERVIÇO: VIGÊNCIA CONTRATUAL: PRAZO EXECUÇÃO:	06/03/2023 210 dias (23/08/2023) 150 dias (03/08/2023)	Construindo uma nova cidade								
	BRUNA ANDRADE PARCIANELLO CAMPOS											
	1ª MEDIDA - 06/03/2023 a 12/06/2023											
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	FONTE	DESCRÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO DO ITEM (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	A MEDIR	A PAGAR	QUANT	CUSTO (R\$)
3.2.10	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	1,08	93,79	101,29		0,00	R\$ 0,00	1,08	R\$ 101,29
3.2.11	SINAPI	101618	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	M3	0,18	230,00	41,40		0,00	R\$ 0,00	0,18	R\$ 41,40
3.2.12	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	0,89	56,87	50,71		0,00	R\$ 0,00	0,89	R\$ 50,71
3.2.13	PMFI	PMFI-543	RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE BLOCO INTERTRAVADO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE PAVER - INCLUSIVE BERÇO, REJUNTAMENTO E COMPACTAÇÃO	M2	7,50	27,77	208,28		0,00	R\$ 0,00	7,50	R\$ 208,28
3.2.14	SINAPI	93026	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	2,00	109,78	219,56		0,00	R\$ 0,00	2,00	R\$ 219,56
3.2.15	SINAPI	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,00	25,78	51,56		0,00	R\$ 0,00	2,00	R\$ 51,56
3.2.16	PMFI	PMFI-907	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 100 MM (4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BASEADO SINAPI 91873)	M	5,00	81,04	405,20		0,00	R\$ 0,00	5,00	R\$ 405,20
3.2.17	SINAPI	91920	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	25,00	50,00		0,00	R\$ 0,00	2,00	R\$ 50,00
3.2.18	SINAPI-I	1590	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 95 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	UN	25,00	15,43	385,75		0,00	R\$ 0,00	25,00	R\$ 385,75
3.2.19	SINAPI-I	39211	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	UN	4,00	1,73	6,92		0,00	R\$ 0,00	4,00	R\$ 6,92
3.2.20	SINAPI-I	39216	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4", PARA ELETRODUTO	UN	12,00	9,07	108,84		0,00	R\$ 0,00	12,00	R\$ 108,84
3.2.21	SINAPI-I	39177	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	UN	4,00	1,98	7,92		0,00	R\$ 0,00	4,00	R\$ 7,92
3.2.22	SINAPI-I	39182	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4", PARA ELETRODUTO	UN	12,00	11,22	134,64		0,00	R\$ 0,00	12,00	R\$ 134,64
3.2.23	SINAPI	91886	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	15,82	63,28		0,00	R\$ 0,00	4,00	R\$ 63,28
3.2.24	SINAPI-I	425	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2	UN	1,00	8,74	8,74		0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 8,74
3.2.25	PMFI	PMFI-177	CAIXA BEP 30 X 30 X 20 CM, BARRAMENTO 210A, 3/4" X 3/16" - PADRÃO COPEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	525,29	525,29		0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 525,29
3.2.26	PMFI	PMFI-178	CAIXA NS PARA DISJUNTOR 400A COM BARRAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	2909,49	2.909,49		0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 2.909,49
3.2.27	PMFI	PMFI-180	CAIXA EN PADRÃO COPEL (PARA 2 MEDIDORES) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	531,29	531,29		0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 531,29
3.2.28	PMFI	181	CAIXA FN PADRÃO COPEL (57 X 75 X 26 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	629,19	629,19		0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 629,19
3.2.29	PMFI	PMFI-1279	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 300A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020. (BASEADO SINAPI 101878)	UN	1,00	876,23	876,23		0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 876,23
3.2.30	PMFI	912	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 300A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BASEADO SINAPI 101898)	UN	2,00	950,00	1.900,00		0,00	R\$ 0,00	2,00	R\$ 1.900,00
3.2.31	SINAPI	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	186,37	372,74		0,00	R\$ 0,00	2,00	R\$ 372,74

RESPONSÁVEL TÉCNICO: FISCAL PERÍODO MEDIDO :	IGOR DE SOUZA MORAES	DATA ORDEM SERVIÇO: VIGÊNCIA CONTRATUAL: PRAZO EXECUÇÃO:	06/03/2023 210 dias (23/08/2023) 150 dias (03/08/2023)	Construindo uma nova cidade								
	BRUNA ANDRADE PARCIANELLO CAMPOS											
	1ª MEDIDA - 06/03/2023 a 12/06/2023											
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	FONTE	DESCRÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO DO ITEM (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	A MEDIR	A PAGAR	QUANT	CUSTO (R\$)
3.2.33	SINAPI	92992	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	140,00	96,72	13.540,80		0,00	R\$ 0,00	140,00	R\$ 13.540,80
3.2.34	PMFI	PMFI-1285	EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO, E PEDIDO DE LIGAÇÃO DE ENERGIA NA CONCESSIONÁRIA	UN	1,00	1000,00	1.000,00		0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 1.000,00
3.3			ATERRAMENTO					641,35	0,00%		100,00%	R\$ 641,35
3.3.1	SINAPI	96979	CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM ² , ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	3,00	109,59	328,77		0,00	R\$ 0,00	3,00	R\$ 328,77
3.3.2	SINAPI	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,00	25,78	77,34		0,00	R\$ 0,00	3,00	R\$ 77,34
3.3.3	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	2,00	45,96	91,92		0,00	R\$ 0,00	2,00	R\$ 91,92
3.3.4	PMFI	PMFI-1115	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COM CONECTOR (BASEADO SINAPI 96986)	UN	1,00	143,32	143,32		0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 143,32
3.5			ADEQUAÇÃO QUADROS INTERNOS					R\$ 60.600,42	3,00%		97,00%	R\$ 58.780,22
3.5.1			QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO					3.855,07	0,00%		100,00%	R\$ 3.855,07
3.5.1.1	SINAPI	90458	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_05/2015	UN	4,00	25,00	100,00		0,00	R\$ 0,00	4,00	R\$ 100,00
3.5.1.2	SINAPI	101882	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	1.718,15	1.718,15		0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 1.718,15
3.5.1.3	SINAPI	101880	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	838,96	838,96		0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 838,96
3.5.1.4	SINAPI	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	694,99	694,99		0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 694,99
3.5.1.5	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	502,97	502,97		0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 502,97
3.5.2			DISJUNTORES					5.086,72	25,11%		74,89%	R\$ 3.809,52
3.5.2.1	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	13,86	27,72		0,00	R\$ 0,00	2,00	R\$ 27,72
3.5.2.2	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	23,00	14,57	335,11		0,00	R\$ 0,00	23,00	R\$ 335,11
3.5.2.3	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20,00	15,90	318,00		0,00	R\$ 0,00	20,00	R\$ 318,00
3.5.2.4	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	15,90	15,90		0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 15,90
3.5.2.5	SINAPI	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00	17,53	140,24		0,00	R\$ 0,00	8,00	R\$ 140,24
3.5.2.6	SINAPI	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	25,45	76,35		0,00	R\$ 0,00	3,00	R\$ 76,35
3.5.2.7	SINAPI	93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	28,80	86,40		0,00	R\$ 0,00	3,00	R\$ 86,40

RESPONSÁVEL TÉCNICO: FISCAL PERÍODO MEDIDO :	IGOR DE SOUZA MORAES		DATA ORDEM SERVIÇO: VIGÊNCIA CONTRATUAL: PRAZO EXECUÇÃO:	06/03/2023 210 dias (23/08/2023)		CONSTRUINDO UMA NOVA CIDADE 											
	BRUNA ANDRADE PARCIANELLO CAMPOS																
	1ª MEDIDA - 06/03/2023 a 12/06/2023																
							Data: 12/06/2023										
							SALDO	1ª MEDIDA									
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	FONTE	Descrição do Serviço	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO DO ITEM (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	A MEDIR	A PAGAR	QUANT	CUSTO (R\$)					
3.5.2.8	SINAPI	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	72,77	145,54		0,00	R\$ 0,00	2,00	R\$ 145,54					
3.5.2.9	SINAPI	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	76,04	304,16		0,00	R\$ 0,00	4,00	R\$ 304,16					
3.5.2.10	SINAPI	93665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	80,32	80,32		0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 80,32					
3.5.2.11	SINAPI	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	114,69	688,14		0,00	R\$ 0,00	6,00	R\$ 688,14					
3.5.2.12	SINAPI	101895	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	510,21	1.020,42		1,00	R\$ 510,21	1,00	R\$ 510,21					
3.5.2.13	SINAPI	101896	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	766,99	1.533,98		1,00	R\$ 766,99	1,00	R\$ 766,99					
3.5.2.14	PMFI	PMFI-121	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNI	2,00	157,22	314,44		0,00	R\$ 0,00	2,00	R\$ 314,44					
3.5.3			ELETRODUTOS				5.443,10	0,00%		100,00%		R\$ 5.443,10					
3.5.3.1	PMFI	771	CORTE RASO E REMOÇÃO DE RAÍZES DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M	UN	1,00	38,96	38,96		0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 38,96					
3.5.3.2	PMFI	PMFI-303	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS SIMPLES DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.	M3	1,00	138,98	138,98		0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 138,98					
3.5.3.3	SINAPI	97670	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	28,36	23,44	664,76		0,00	R\$ 0,00	28,36	R\$ 664,76					
3.5.3.4	PMFI	PMFI-1293	REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA	M2	7,09	19,93	141,30		0,00	R\$ 0,00	7,09	R\$ 141,30					
3.5.3.5	PMFI	PMFI-543	RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE BLOCO INTERTRAVADO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE PAVER - INCLUSIVE BERÇO, REJUNTAMENTO E COMPACTAÇÃO	M2	7,09	27,77	196,89		0,00	R\$ 0,00	7,09	R\$ 196,89					
3.5.3.6	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	4,25	24,92	106,01		0,00	R\$ 0,00	4,25	R\$ 106,01					
3.5.3.7	SINAPI	90446	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAiores QUE 75 MM. AF_05/2015	M	14,18	35,54	503,96		0,00	R\$ 0,00	14,18	R\$ 503,96					
3.5.3.8	SINAPI	90470	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAiores QUE 75 MM. AF_05/2015	M	14,18	14,17	200,93		0,00	R\$ 0,00	14,18	R\$ 200,93					
3.5.3.9	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	1,28	93,79	119,69		0,00	R\$ 0,00	1,28	R\$ 119,69					
3.5.3.10	SINAPI	101618	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	M3	0,21	230,00	48,92		0,00	R\$ 0,00	0,21	R\$ 48,92					
3.5.3.11	SINAPI	96995	REATERRAMENTO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	1,16	56,87	66,25		0,00	R\$ 0,00	1,16	R\$ 66,25					
3.5.3.12	PMFI	908	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, DN 63 MM (2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASEADO SINAPI 91836)	M	84,22	15,62	1.315,52		0,00	R\$ 0,00	84,22	R\$ 1.315,52					
3.5.3.13	SINAPI	93026	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	1,00	109,78	109,78		0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 109,78					

RESPONSÁVEL TÉCNICO: FISCAL PERÍODO MEDIDO :	IGOR DE SOUZA MORAES		DATA ORDEM SERVIÇO: VIGÊNCIA CONTRATUAL: PRAZO EXECUÇÃO:	06/03/2023 210 dias (23/08/2023)		CONSTRUINDO UMA NOVA CIDADE 												
	BRUNA ANDRADE PARCIANELLO CAMPOS																	
	1ª MEDIDA - 06/03/2023 a 12/06/2023																	
							Data: 12/06/2023											
							SALDO	1ª MEDIDA										
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	FONTE	Descrição do Serviço	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO DO ITEM (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	A MEDIR	A PAGAR	QUANT	CUSTO (R\$)						
3.5.3.14	PMFI	PMFI-1128	PERFILADO PERFORADO ELETROCALHA (38X38)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #22, INCLUSIVE FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVO TAMPA DE ENCAIXE (BASEADO SETOP ELE-PER-030)	M	30,00	43,17	1.295,10		0,00	R\$ 0,00	30,00	R\$ 1.295,10						
3.5.3.15	PMFI	PMFI-576	CAIXA DE PASSAGEM (ELÉTRICA) 30X30X40CM, EXECUTADA EM ALVENARIA, REBOCO IMPERMEABILIZADO, FUNDO EM CAMADAS DE BRITA 3 E AREIA MÉDIA COM TAMPA DE CONCRETO.	UN	3,00	165,35	496,05		0,00	R\$ 0,00	3,00	R\$ 496,05						
3.5.4			CABOS				45.672,53	0,00%			100,00%	R\$ 45.672,53						
3.5.4.1	SINAPI	101567	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM ² , 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	258,22	92,02	23.761,40		0,00	R\$ 0,00	258,22	R\$ 23.761,40						
3.5.4.2	SINAPI	92980	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	354,96	10,24	3.634,79		0,00	R\$ 0,00	354,96	R\$ 3.634,79						
3.5.4.3	SINAPI	101564	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM ² , 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	360,48	50,70	18.276,34		0,00	R\$ 0,00	360,48	R\$ 18.276,34						
4			MONTEIRO LOBATO 300-A				R\$ 54.856,84	24,36%			76%	R\$ 41.491,10						
4.1			ENTRADA DE ENERGIA				36.649,74	1,17%			98,83%	R\$ 36.220,60						
4.1.1	PMFI	PMFI-1015	MURETA EM ALVENARIA PARA ENTRADA DE ENERGIA 3,5M X 2,00M x 0,20M. INCLUI ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO: ESTACAS ARMADAS (H=2M), VIGA BALDRAME 14X30CM, PILARETES 20X20CM E VIGA CINTA. COBERTURA EM TELHAMENTO CERÂMICO - EXCLUSIVAMENTE ACABAMENTOS	UN	1,00	2166,37	2.166,37		0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 2.166,37						
4.1.2	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	7,00	4,32	30,24		0,00	R\$ 0,00	7,00	R\$ 30,24						
4.1.3	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	7,00	35,89	251,23		0,00	R\$ 0,00	7,00	R\$ 251,23						
4.1.4	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	7,00	3,15	22,05		0,00	R\$ 0,00	7,00	R\$ 22,05						
4.1.5	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	7,00	16,39	114,73		0,00	R\$ 0,00	7,00	R\$ 114,73						
4.1.6	PMFI	PMFI-1023	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, 4" APARENTE, INSTALADO EM PAREDE (OU POSTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BASEADO SINAPI 95752)	M	6,00	267,07	1.602,42		0,00	R\$ 0,00	6,00	R\$ 1.602,42						
4.1.7	PMFI	PMFI-1024	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO 4", PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BASEADO SINAPI 93026)	UN	1,00	226,05	226,05		0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 226,05						
4.1.8	PMFI	PMFI-1022	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO EM CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO 60X60 E SUBTAMPA PADRÃO COPEL (BASEADO SINAPI 97889)	UN	1,00	750,00	750,00		0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 750,00						
4.1.9	PMFI	906	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, DN 100 MM (4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BASEADO SINAPI 91856)	M	5,00	21,94	109,70		0,00	R\$ 0,00	5,00	R\$ 109,70						
4.1.10	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,45	93,79	42,21		0,00	R\$ 0,00	0,45	R\$ 42,21						

RESPONSÁVEL TÉCNICO: FISCAL PERÍODO MEDIDO :	IGOR DE SOUZA MORAES	DATA ORDEM SERVIÇO: VIGÊNCIA CONTRATUAL: PRAZO EXECUÇÃO:	06/03/2023 210 dias (23/08/2023) 150 dias (03/08/2023)		Construindo uma nova cidade							
	BRUNA ANDRADE PARCIANELLO CAMPOS											
	1ª MEDIDA - 06/03/2023 a 12/06/2023											
									Data: 12/06/2023			
									SALDO			
									1ª MEDIDA			
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	FONTE	DESCRÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO DO ITEM (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	A MEDIR	A PAGAR	QUANT	CUSTO (R\$)
4.1.11	SINAPI	101618	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	M3	0,08	230,00	17,25		0,00	R\$ 0,00	0,08	R\$ 17,25
4.1.12	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	0,37	56,87	21,13		0,00	R\$ 0,00	0,37	R\$ 21,13
4.1.13	PMFI	PMFI-543	RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE BLOCO INTERTRAVADO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE PAVER - INCLUSIVE BERÇO, REJUNTAMENTO E COMPACTAÇÃO	M2	2,50	27,77	69,43		0,00	R\$ 0,01	2,50	R\$ 69,43
4.1.14	SINAPI	93026	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	2,00	109,78	219,56		0,00	R\$ 0,00	2,00	R\$ 219,56
4.1.15	SINAPI	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,00	25,78	51,56		0,00	R\$ 0,00	2,00	R\$ 51,56
4.1.16	PMFI	PMFI-907	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 100 MM (4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BASEADO SINAPI 91873)	M	5,00	81,04	405,20		0,00	R\$ 0,00	5,00	R\$ 405,20
4.1.17	SINAPI	91920	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	25,00	50,00		0,00	R\$ 0,00	2,00	R\$ 50,00
4.1.18	SINAPI-I	1590	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 95 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	UN	25,00	15,43	385,75		0,00	R\$ 0,00	25,00	R\$ 385,75
4.1.19	SINAPI-I	39211	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	UN	4,00	1,73	6,92		0,00	R\$ 0,00	4,00	R\$ 6,92
4.1.20	SINAPI-I	39216	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4", PARA ELETRODUTO	UN	12,00	9,07	108,84		0,00	R\$ 0,00	12,00	R\$ 108,84
4.1.21	SINAPI-I	39177	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	UN	4,00	1,98	7,92		0,00	R\$ 0,00	4,00	R\$ 7,92
4.1.22	SINAPI-I	39182	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4", PARA ELETRODUTO	UN	12,00	11,22	134,64		0,00	R\$ 0,00	12,00	R\$ 134,64
4.1.23	SINAPI	91886	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	15,82	63,28		0,00	R\$ 0,00	4,00	R\$ 63,28
4.1.24	SINAPI-I	425	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2	UN	1,00	8,74	8,74		0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 8,74
4.1.25	PMFI	PMFI-177	CAIXA BEP 30 X 30 X 20 CM, BARRAMENTO 210A, 3/4" X 3/16" - PADRÃO COPEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	525,29	525,29		0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 525,29
4.1.26	PMFI	PMFI-178	CAIXA NS PARA DISJUNTOR 400A COM BARRAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	2909,49	2.909,49		0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 2.909,49
4.1.27	PMFI	PMFI-180	CAIXA EN PADRÃO COPEL (PARA 2 MEDIDORES) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	531,29	531,29		0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 531,29
4.1.28	PMFI	181	CAIXA FN PADRÃO COPEL (57 X 75 X 26 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	629,19	629,19		0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 629,19
4.1.29	PMFI	PMFI-1279	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 300A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020. (BASEADO SINAPI 101878)	UN	1,00	876,23	876,23		0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 876,23
4.1.30	PMFI	912	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 300A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BASEADO SINAPI 101898)	UN	2,00	1646,71	3.293,42		0,00	R\$ 0,00	2,00	R\$ 3.293,42
4.1.33	SINAPI-I	39465	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	UN	3,00	82,16	246,48		0,00	R\$ 0,00	3,00	R\$ 246,48
4.1.34	SINAPI	92992	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	200,00	96,72	19.344,00		0,00	R\$ 0,00	200,00	R\$ 19.344,00

RESPONSÁVEL TÉCNICO: FISCAL	IGOR DE SOUZA MORAES	PERÍODO MEDIDO :	1ª MEDIDA - 06/03/2023 a 12/06/2023	DATA ORDEM SERVIÇO: VIGÊNCIA CONTRATUAL:	06/03/2023 210 dias (23/08/2023)	PRAZO EXECUÇÃO:	150 dias (03/08/2023)	Construindo uma nova cidade 				
	BRUNA ANDRADE PARCIANELLO CAMPOS											
								Data: 12/06/2023				
							SALDO	1ª MEDIDA				
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	FONTE	DESCRÍÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO DO ITEM (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	A MEDIR	A PAGAR	QUANT	CUSTO (R\$)
4.1.35	PMFI-1285	PMFI	EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO, E PEDIDO DE LIGAÇÃO DE ENERGIA NA CONCESSIONÁRIA	UN	1,00	1000,00	1.000,00		0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 1.000,00
4.2			ATEERRAMENTO					641,35	0,00%		100,00%	R\$ 641,35
4.2.1	SINAPI	96979	CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM ² , ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	3,00	109,59	328,77		0,00	R\$ 0,00	3,00	R\$ 328,77
4.2.2	SINAPI	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,00	25,78	77,34		0,00	R\$ 0,00	3,00	R\$ 77,34
4.2.3	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	2,00	45,96	91,92		0,00	R\$ 0,00	2,00	R\$ 91,92
4.2.4	PMFI	PMFI-1115	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COM CONECTOR (BASEADO SINAPI 96986)	UN	1,00	143,32	143,32		0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 143,32
4.3			ADEQUAÇÃO QUADROS INTERNOS					17.457,15	73,48%		26,52%	R\$ 4.629,15
4.3.1	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	15,90	47,70		0,00	R\$ 0,00	3,00	R\$ 47,70
4.3.2	SINAPI	97669	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	60,00	18,38	1.102,80		0,00	R\$ 0,00	60,00	R\$ 1.102,80
4.3.3	SINAPI	90446	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAiores QUE 75 MM. AF_05/2015	M	60,00	35,54	2.132,40		0,00	R\$ 0,00	60,00	R\$ 2.132,40
4.3.4	SINAPI	90470	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAiores QUE 75 MM. AF_05/2015	M	60,00	14,17	850,20		0,00	R\$ 0,00	60,00	R\$ 850,20
4.3.7	PMFI	PMFI-576	CAIXA DE PASSAGEM (ELÉTRICA) 30X30X40CM, EXECUTADA EM ALVENARIA, REBOCO IMPERMEABILIZADO, FUNDO EM CAMADAS DE BRITA 3 E AREIA MÉDIA COM TAMPA DE CONCRETO.	UN	3,00	165,35	496,05		0,00	R\$ 0,00	3,00	R\$ 496,05
5			HELENICE MILHORANÇA - 300A					R\$ 32.722,28	6,77%		93%	R\$ 30.506,38
5.1			ENTRADA DE ENERGIA					27.728,10	0,89%		99,11%	R\$ 27.481,61
5.1.1	PMFI	PMFI-1015	MURETA EM ALVENARIA PARA ENTRADA DE ENERGIA 3,5M X 2,00M x 0,20M. INCLUI ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO: ESTACAS ARMADAS (H=2M), VIGA BALDRAME 14X30CM, PILARETES 20X20CM E VIGA CINTA. COBERTURA EM TELHAMENTO CERÂMICO - EXCLUSIVE ACABAMENTOS	UN	1,00	2000,00	2.000,00		0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 2.000,00
5.1.2	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	7,00	4,32	30,24		0,00	R\$ 0,00	7,00	R\$ 30,24
5.1.3	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	7,00	35,89	251,23		0,00	R\$ 0,00	7,00	R\$ 251,23
5.1.4	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	7,00	3,15	22,05		0,00	R\$ 0,00	7,00	R\$ 22,05
5.1.5	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	7,00	16,39	114,73		0,00	R\$ 0,00	7,00	R\$ 114,73
5.1.6	PMFI	PMFI-1023	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, 4" APARENTE, INSTALADO EM PAREDE (OU POSTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BASEADO SINAPI 95752)	M	6,00	267,07	1.602,42		0,00	R\$ 0,00	6,00	R\$ 1.602,42

RESPONSÁVEL TÉCNICO: FISCAL PERÍODO MEDIDO :	IGOR DE SOUZA MORAES		DATA ORDEM SERVIÇO: VIGÊNCIA CONTRATUAL: PRAZO EXECUÇÃO:	06/03/2023 210 dias (23/08/2023)		CONSTRUINDO UMA NOVA CIDADE 	Construindo uma nova cidade							
	BRUNA ANDRADE PARCIANELLO CAMPOS													
	1ª MEDIDA - 06/03/2023 a 12/06/2023													
								Data: 12/06/2023						
								SALDO						
								1ª MEDIDA						
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	FONTE	Descrição do Serviço	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO DO ITEM (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	A MEDIR	A PAGAR	QUANT	CUSTO (R\$)		
5.1.7	PMFI	PMFI-1024	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO 4", PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BASEADO SINAPI 93026)	UN	1,00	226,05	226,05		0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 226,05		
5.1.8	PMFI	PMFI-1022	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO EM CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO 60X60 E SUBTAMPA PADRÃO COPEL (BASEADO SINAPI 97889)	UN	1,00	750,00	750,00		0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 750,00		
5.1.9	PMFI	906	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, DN 100 MM (4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BASEADO SINAPI 91856)	M	5,00	21,94	109,70		0,00	R\$ 0,00	5,00	R\$ 109,70		
5.1.10	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,45	93,79	42,21		0,00	R\$ 0,00	0,45	R\$ 42,21		
5.1.11	SINAPI	101618	PREPARE DO FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	M3	0,08	230,00	17,25		0,00	R\$ 0,00	0,08	R\$ 17,25		
5.1.12	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	0,37	56,87	21,13		0,00	R\$ 0,00	0,37	R\$ 21,13		
5.1.13	PMFI	PMFI-543	RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE BLOCO INTERTRAVADO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE PAVER - INCLUSIVE BERÇO, REJUNTAMENTO E COMPACTAÇÃO	M2	2,50	27,77	69,43		0,00	R\$ 0,01	2,50	R\$ 69,43		
5.1.14	SINAPI	93026	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	2,00	109,78	219,56		0,00	R\$ 0,00	2,00	R\$ 219,56		
5.1.15	SINAPI	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,00	25,78	51,56		0,00	R\$ 0,00	2,00	R\$ 51,56		
5.1.16	PMFI	PMFI-907	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 100 MM (4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BASEADO SINAPI 91873)	M	5,00	81,04	405,20		0,00	R\$ 0,00	5,00	R\$ 405,20		
5.1.17	SINAPI	91920	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	25,00	50,00		0,00	R\$ 0,00	2,00	R\$ 50,00		
5.1.18	SINAPI-I	1590	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 95 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	UN	25,00	15,43	385,75		0,00	R\$ 0,00	25,00	R\$ 385,75		
5.1.19	SINAPI-I	39211	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	UN	4,00	1,73	6,92		0,00	R\$ 0,00	4,00	R\$ 6,92		
5.1.20	SINAPI-I	39216	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4", PARA ELETRODUTO	UN	12,00	9,07	108,84		0,00	R\$ 0,00	12,00	R\$ 108,84		
5.1.21	SINAPI-I	39177	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	UN	4,00	1,98	7,92		0,00	R\$ 0,00	4,00	R\$ 7,92		
5.1.22	SINAPI-I	39182	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4", PARA ELETRODUTO	UN	12,00	11,22	134,64		0,00	R\$ 0,00	12,00	R\$ 134,64		
5.1.23	SINAPI	91886	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	15,82	63,28		0,00	R\$ 0,00	4,00	R\$ 63,28		
5.1.24	SINAPI-I	425	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2	UN	1,00	8,74	8,74		0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 8,74		
5.1.25	PMFI	PMFI-177	CAIXA BEP 30 X 30 X 20 CM, BARRAMENTO 210A, 3/4" X 3/16" - PADRÃO COPEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	525,29	525,29		0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 525,29		
5.1.26	PMFI	PMFI-178	CAIXA NS PARA DISJUNTOR 400A COM BARRAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	2909,49	2.909,49		0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 2.909,49		

RESPONSÁVEL TÉCNICO: FISCAL PERÍODO MEDIDO :	IGOR DE SOUZA MORAES	DATA ORDEM SERVIÇO: VIGÊNCIA CONTRATUAL: PRAZO EXECUÇÃO:	06/03/2023 210 dias (23/08/2023) 150 dias (03/08/2023)		Construindo uma nova cidade								
	BRUNA ANDRADE PARCIANELLO CAMPOS												
	1ª MEDIDA - 06/03/2023 a 12/06/2023												
									Data: 12/06/2023				
									SALDO	1ª MEDIDA			
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	FONTE	DESCRÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO DO ITEM (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	A MEDIR	A PAGAR	QUANT	CUSTO (R\$)	
5.1.27	PMFI	PMFI-180	CAIXA EN PADRÃO COPEL (PARA 2 MEDIDORES) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	531,29	531,29		0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 531,29	
5.1.28	PMFI	181	CAIXA FN PADRÃO COPEL (57 X 75 X 26 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	629,19	629,19		0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 629,19	
5.1.29	PMFI	912	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 300A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BASEADO SINAPI 101898)	UN	1,00	1646,71	1.646,71		0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 1.646,71	
5.1.31	SINAPI	92992	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	140,00	96,72	13.540,80		0,00	R\$ 0,00	140,00	R\$ 13.540,80	
5.1.32	PMFI	PMFI-1285	EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO, E PEDIDO DE LIGAÇÃO DE ENERGIA NA CONCESSIONÁRIA	UN	1,00	1000,00	1.000,00		0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 1.000,00	
5.2			ATERRAMENTO					595,39	0,00%		100,00%	R\$ 595,39	
5.2.1	SINAPI	96979	CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM ² , ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	3,00	109,59	328,77		0,00	R\$ 0,00	3,00	R\$ 328,77	
5.2.2	SINAPI	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,00	25,78	77,34		0,00	R\$ 0,00	3,00	R\$ 77,34	
5.2.3	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	45,96	45,96		0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 45,96	
5.2.4	PMFI	PMFI-1115	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COM CONECTOR (BASEADO SINAPI 96986)	UN	1,00	143,32	143,32		0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 143,32	
5.3			ADEQUAÇÃO QUADROS INTERNOS					4.290,19	43,37%		56,63%	R\$ 2.429,39	
5.3.4	SINAPI	97670	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	10,00	23,44	234,40		0,00	R\$ 0,00	10,00	R\$ 234,40	
5.3.5	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,90	93,79	84,41		0,00	R\$ 0,00	0,90	R\$ 84,41	
5.3.6	SINAPI	101618	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	M3	0,15	230,00	34,50		0,00	R\$ 0,00	0,15	R\$ 34,50	
5.3.7	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	0,74	56,87	42,25		0,00	R\$ 0,00	0,74	R\$ 42,25	
5.3.8	SINAPI	90446	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAiores QUE 75 MM. AF_05/2015	M	2,00	35,54	71,08		0,00	R\$ 0,00	2,00	R\$ 71,08	
5.3.9	SINAPI	90470	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAiores QUE 75 MM. AF_05/2015	M	2,00	14,17	28,34		0,00	R\$ 0,00	2,00	R\$ 28,34	
5.3.10	SINAPI	92992	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	20,00	96,72	1.934,40		0,00	R\$ 0,00	20,00	R\$ 1.934,40	
TOTAL								293.932,49	R\$ 0,00			R\$ 183.075,90	
BDI 20,56%								60.432,52	R\$ 0,00			R\$ 37.640,40	
TOTAL GERAL COM BDI								354.364,96	R\$ 0,00			R\$ 220.716,30	
										exec:	62,29%		

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AUMENTO DE CARGA DO PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES ESCOLARES	CONTRATO	24/2023	 <p>Governo do Município de Foz do Iguaçu Construindo uma nova cidade</p>
ENDEREÇO:	Escola Municipal Altair Ferraz Zizo – Avenida Andradina, 2290 – Jardim pê, CEP 85869-536; Escola Municipal Antônio Gonçalves Dias – Rua Purus, 234 – Campos do Iguaçu, CEP 85857-130; Escola Municipal Monteiro Lobato – Rua Angela Aparecida Andrade, 145 – Foz do Iguaçu Parte II, CEP 85867-500; Escola Municipal Professora Elenice Milhorança – Rua Di Cavalcanti, 523 – Jardim América, CEP 85864-290.	DATA CONTRATO	25/01/2023	
CONTRATADA:	VOUGUE FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA	TOMADA DE PREÇO	13/02/2022	
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	IGOR DE SOUZA MORAES	DATA ORDEM SERVIÇO	06/03/2023	
FISCAL	BRUNA ANDRADE PARCIANELLO CAMPOS	VIGÊNCIA CONTRATUAL:	210 dias (23/08/2023)	
PERÍODO MEDIDO :	2ª MEDIDA - 13/06/2023 a 14/08/2023	PRAZO EXECUÇÃO:	150 dias (03/08/2023)	

Data: 15/08/2023

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO DO ITEM (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	SALDO		2ª MEDIDA	
									A MEDIR	A PAGAR	QUANT	CUSTO (R\$)
1			SERVIÇOS INICIAIS					12.430,00	0,00%		52,05%	R\$ 6.470,00
1.1	PMFI	PMFI-1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (BASEADO SINAPI 74209/01)	M2	6,00	545,00	3.270,00		0,00	R\$ 0,00	6,00	R\$ 3.270,00
1.3	PMFI	PMFI-1313	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - GERENCIAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRA - (ENGENHEIRO CIVIL 10H X MÊS)+(ENCARREGADO GERAL 75H X MÊS)	%	100,00	80,00	8.000,00		0,00	R\$ 0,00	40,00	R\$ 3.200,00
2			ALTAIR FERREIRA ZIZO - 400A					R\$ 99.704,09	0,42%		84,14%	R\$ 83.891,81
2.1			ENTRADA DE ENERGIA					36.427,15	59,51%		58,35%	R\$ 21.256,22
2.1.29	PMFI	PMFI-179	CAIXA CN PADRÃO COPEL (45 X 35 X 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	234,06	234,06		1,00	R\$ 234,06	0,00	R\$ 0,00
2.1.33	SINAPI	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	186,37	186,37		1,00	R\$ 186,37	0,00	R\$ 0,00
2.1.34	SINAPI-I	39465	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	UN	3,00	82,16	246,48		0,00	R\$ 0,00	3,00	R\$ 246,48
2.1.35	SINAPI	92992	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	15,00	96,72	1.450,80		0,00	R\$ 0,00	15,00	R\$ 1.450,80
2.1.36	SINAPI	92994	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	125,00	125,59	15.698,75		0,00	R\$ 0,00	125,00	R\$ 15.698,75
2.3			ALIMENTAÇÃO QUADRA DE ESPORTES					62.526,99	0,00%		100,00%	R\$ 62.526,99
2.3.1	SINAPI	97670	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	95,00	23,44	2.226,80		0,00	R\$ 0,00	95,00	R\$ 2.226,80
2.3.2	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	8,55	93,79	801,90		0,00	R\$ 0,00	8,55	R\$ 801,90
2.3.3	SINAPI	101618	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	M3	1,43	230,00	327,75		0,00	R\$ 0,00	1,43	R\$ 327,75
2.3.4	SINAPI	96995	REATERRAMENTO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	7,80	56,87	443,83		0,00	R\$ 0,00	7,80	R\$ 443,83
2.3.5	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M2	23,70	10,55	250,04		0,00	R\$ 0,00	23,70	R\$ 250,04
2.3.6	PMFI	PMFI-543	RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE BLOCO INTERTRAVADO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE PAVER - INCLUSIVE BERÇO, REJUNTAMENTO E COMPACTAÇÃO	M2	6,00	27,77	166,62		0,00	R\$ 0,00	6,00	R\$ 166,62
2.3.7	SINAPI	90446	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAiores QUE 75 MM. AF_05/2015	M	5,00	35,54	177,70		0,00	R\$ 0,00	5,00	R\$ 177,70
2.3.8	SINAPI	90470	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAiores QUE 75 MM. AF_05/2015	M	5,00	14,17	70,85		0,00	R\$ 0,00	5,00	R\$ 70,85
2.3.9	PMFI	PMFI-576	CAIXA DE PASSAGEM (ELÉTRICA) 30X30X40CM, EXECUTADA EM ALVENARIA, REBOCO IMPERMEABILIZADO, FUNDO EM CAMADAS DE BRITA 3 E AREIA MÉDIA COM TAMPA DE CONCRETO.	UN	3,00	165,35	496,05		0,00	R\$ 0,00	3,00	R\$ 496,05

RESPONSÁVEL TÉCNICO: FISCAL PERÍODO MEDIDO :	IGOR DE SOUZA MORAES	DATA ORDEM SERVIÇO: 06/03/2023 VIGÊNCIA CONTRATUAL: 210 dias (23/08/2023)	PRAZO EXECUÇÃO: 150 dias (03/08/2023)	Construindo uma nova cidade								
	BRUNA ANDRADE PARCIANELLO CAMPOS											
2ª MEDIDA - 13/06/2023 a 14/08/2023								Data: 15/08/2023		2ª MEDIDA		
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	FONTE	DESCRÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO DO ITEM (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	A MEDIR	A PAGAR	QUANT	CUSTO (R\$)
2.3.10	SINAPI	92996	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	285,00	151,91	43.294,35		0,00	R\$ 0,00	285,00	R\$ 43.294,35
2.3.11	SINAPI	92990	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	190,00	74,86	14.223,40		0,00	R\$ 0,00	190,00	R\$ 14.223,40
2.3.12	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	15,90	47,70		0,00	R\$ 0,00	3,00	R\$ 47,70
2.4			LIMPEZA FINAL DE OBRA					108,60	0,00%			100,00% R\$ 108,60
2.4.1	PMFI	PMFI-92	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	30,00	3,62	108,60		0,00	R\$ 0,00	30,00	R\$ 108,60
3			ANTONIO GONÇALVES - 300A					R\$ 94.219,28	0,00%			4,77% R\$ 4.492,70
3.2			ENTRADA DE ENERGIA					29.635,60	0,00%			0,83% R\$ 246,48
3.2.32	SINAPI-I	39465	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	UN	3,00	82,16	246,48		0,00	R\$ 0,00	3,00	R\$ 246,48
3.4			GRADE DE PROTEÇÃO					2.426,02	0,00%			100,00% R\$ 2.426,02
3.4.1	PMFI	PMFI-511	PORTÃO DE ABRIR PARA GRADIL, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, MONTANTES VERTICais E HORIZONTais DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME DE AÇO ZINCADO, FIO 5 MM, MALHA 50X200 MM. INCLUSO FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	5,92	409,80	2.426,02		0,00	R\$ 0,00	5,92	R\$ 2.426,02
3.5			ADEQUAÇÃO QUADROS INTERNOS					R\$ 60.600,42	0,90%			2,11% R\$ 1.277,20
3.5.2			DISJUNTORES					5.086,72	0,00%			25,11% R\$ 1.277,20
3.5.2.12	SINAPI	101895	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	510,21	1.020,42		0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 510,21
3.5.2.13	SINAPI	101896	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	766,99	1.533,98		0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 766,99
3.5.5			LIMPEZA FINAL DE OBRA					543,00	0,00%			100,00% R\$ 543,00
3.5.5.1	PMFI	PMFI-92	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	150,00	3,62	543,00		0,00	R\$ 0,00	150,00	R\$ 543,00
4			MONTEIRO LOBATO 300-A					R\$ 54.856,84	0,00%			24,36% R\$ 13.365,73
4.1			ENTRADA DE ENERGIA					36.649,74	0,00%			1,17% R\$ 429,13
4.1.31	PMFI	PMFI-121	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNI	2,00	157,22	314,44		0,00	R\$ 0,00	2,00	R\$ 314,44
4.1.32	SINAPI	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	114,69	114,69		0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 114,69
4.3			ADEQUAÇÃO QUADROS INTERNOS					17.457,15	0,00%			73,48% R\$ 12.828,00
4.3.5	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300,00	15,64	4.692,00		0,00	R\$ 0,00	300,00	R\$ 4.692,00
4.3.6	SINAPI	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	300,00	27,12	8.136,00		0,00	R\$ 0,00	300,00	R\$ 8.136,00
4.4			LIMPEZA FINAL DE OBRA					108,60	0,00%			100,00% R\$ 108,60
4.4.1	PMFI	PMFI-92	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	30,00	3,62	108,60		0,00	R\$ 0,00	30,00	R\$ 108,60
5			HELENICE MILHORANÇA - 300A					R\$ 32.722,28	6,77%			6,77% R\$ 2.215,89
5.1			ENTRADA DE ENERGIA					27.728,10	0,00%			0,89% R\$ 246,48
5.1.30	SINAPI-I	39465	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	UN	3,00	82,16	246,48		0,00	R\$ 0,00	3,00	R\$ 246,48
5.3			ADEQUAÇÃO QUADROS INTERNOS					4.290,19	0,00%			43,37% R\$ 1.860,81

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	IGOR DE SOUZA MORAES		DATA ORDEM SERVIÇO	06/03/2023		VIGÊNCIA CONTRATUAL:	210 dias (23/08/2023)			Construindo uma nova cidade		
FISCAL	BRUNA ANDRADE PARCIANELLO CAMPOS											
PERÍODO MEDIDO :	2ª MEDIDA - 13/06/2023 a 14/08/2023			PRAZO EXECUÇÃO:	150 dias (03/08/2023)							
								Data: 15/08/2023				
								SALDO	2ª MEDIDA			
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	FONTE	Descrição do Serviço	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO DO ITEM (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	A MEDIR	A PAGAR	QUANT	CUSTO (R\$)
5.3.1	PMFI	184	BARRAMENTO DE 300 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	166,40	166,40		0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 166,40
5.3.2	PMFI	912	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 300A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BASEADO SINAPI 101898)	UN	1,00	1646,71	1.646,71		0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 1.646,71
5.3.3	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	15,90	47,70		0,00	R\$ 0,00	3,00	R\$ 47,70
5.4			LIMPEZA FINAL DE OBRA					108,60	0,00%		100,00%	R\$ 108,60
5.4.1	PMFI	PMFI-92	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	30,00	3,62	108,60		30,00	R\$ 108,60	30,00	R\$ 108,60
			TOTAL					293.932,49	R\$ 0,00			R\$ 110.436,12
			BDI 20,56%					60.432,52	R\$ 0,00			R\$ 22.705,67
			TOTAL GERAL COM BDI					354.364,96	R\$ 0,00			R\$ 133.141,79

exec: 37,57%

 <p>MUNICÍPIO DE TOLEDO Secretaria Municipal da Fazenda e Captação de Recursos NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e www.esnfs.com.br</p>	Número da Nota: 9270															
	Data e Hora da Emissão: 18/08/2023 10:02:55															
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 10738123000188 I.E.: 90475398-00 I.M.: 969774 Telefone: 3054-6808 Nome/Razão: VOUGUE FABRICACAO DE ESTRUTURAS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA Endereço: ROD PR-585, SN - JARDIM RECANTO - 85915090 Município: Toledo UF: PR e-Mail: vouguetelecom@pop.com.br																
TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 76206606000140 I.E.: ISENTO I.M.: Nome/Razão: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU Endereço: RUA LISBOA , 510 - JARDIM ALICE - 85858050 Município: Foz do Iguaçu UF: PR e-Mail: cale_bike@hotmail.com																
Cód.	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cálc.	Aliq.	ISS										
7.02	Prestação de serviço para aumento de carga do padrão de entrada de energia elétrica das unidades escolares, no Município de Foz do Iguaçu/PR CONTRATO 24/2023 EMPENHOS 2805/2023 TOMADA DE PREÇO 13/2022 MATERIAL : 119.827,61 MÃO DE OBRA : 13.314,18 Dedução: MATERIAL	133.141,79	119.827,61	13.314,18	5,00	665,71										
<table border="1"> <tr> <td>Total Serviços (R\$) 133.141,79</td> </tr> <tr> <td>Total ISS (R\$) 665,71</td> </tr> <tr> <td>Retenções (R\$)</td> <td>COFINS 0,00</td> <td>ISS (5,00) 665,71</td> <td>PIS 0,00</td> <td>IRRF 0,00</td> <td>CSLL 0,00</td> <td>INSS 1.464,55</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido (R\$) 131.011,53</td> </tr> </table>							Total Serviços (R\$) 133.141,79	Total ISS (R\$) 665,71	Retenções (R\$)	COFINS 0,00	ISS (5,00) 665,71	PIS 0,00	IRRF 0,00	CSLL 0,00	INSS 1.464,55	Total Líquido (R\$) 131.011,53
Total Serviços (R\$) 133.141,79																
Total ISS (R\$) 665,71																
Retenções (R\$)	COFINS 0,00	ISS (5,00) 665,71	PIS 0,00	IRRF 0,00	CSLL 0,00	INSS 1.464,55										
Total Líquido (R\$) 131.011,53																
OUTRAS INFORMAÇÕES <p>Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei R nº 100/2009 A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado em outro município (Foz do Iguaçu). O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador do Serviço. Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.</p>																
DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS																
PROCON																

Autenticidade: 44C71F65.05887823.D84535E6.883489BD (verificada em 18/08/2023 às 10:03:16)

Equiplano - NFS-e 500.2005u



 <p>MUNICÍPIO DE TOLEDO Secretaria Municipal da Fazenda e Captação de Recursos NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e www.esnfs.com.br</p>						Número da Nota: 9198																												
						Data e Hora da Emissão: 13/06/2023 09:27:05																												
						Operador Emissor: VOUGUE F. E. C																												
PRESTADOR DE SERVIÇOS																																		
 <p>CPF/CNPJ: 10738123000188</p>		I.E.: 90475398-00	I.M.: 969774	Telefone: 3054-6808																														
Nome/Razão: VOUGUE FABRICACAO DE ESTRUTURAS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA																																		
Endereço: ROD PR-585, SN - JARDIM RECANTO - 85915090																																		
Município: Toledo		UF: PR	e-Mail: vouguetelecom@pop.com.br																															
TOMADOR DE SERVIÇOS																																		
<p>CPF/CNPJ: 76206606000140</p>		I.E.: ISENTO	I.M.:																															
Nome/Razão: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU																																		
Endereço: RUA LISBOA , 510 - JARDIM ALICE - 85858050																																		
Município: Foz do Iguaçu		UF: PR	e-Mail:																															
Cód.	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cálc.	Aliq.	ISS																												
7.02	Prestação de serviço para aumento de carga do padrão de entrada de energia elétrica das unidades escolares, no Município de Foz do Iguaçu/PR	220.716,30	198.644,67	22.071,63	5,00	1.103,58																												
CONTRATO 24/2023 EMPENHOS 2805/2023 TOMADA DE PREÇO 13/2022																																		
MATERIAL : 198.644,67 MÃO DE OBRA 22.071,63																																		
Dedução: material																																		
<table border="1"> <tr> <td>Total Serviços (R\$)</td> <td colspan="6">220.716,30</td> </tr> <tr> <td>Total ISS (R\$)</td> <td colspan="6">1.103,58</td> </tr> <tr> <td>Retenções (R\$)</td> <td>COFINS 0,00</td> <td>ISS (5,00) 1.103,58</td> <td>PIS 0,00</td> <td>IRRF 0,00</td> <td>CSLL 0,00</td> <td>INSS 2.427,87</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido (R\$)</td> <td colspan="6">217.184,85</td> </tr> </table>							Total Serviços (R\$)	220.716,30						Total ISS (R\$)	1.103,58						Retenções (R\$)	COFINS 0,00	ISS (5,00) 1.103,58	PIS 0,00	IRRF 0,00	CSLL 0,00	INSS 2.427,87	Total Líquido (R\$)	217.184,85					
Total Serviços (R\$)	220.716,30																																	
Total ISS (R\$)	1.103,58																																	
Retenções (R\$)	COFINS 0,00	ISS (5,00) 1.103,58	PIS 0,00	IRRF 0,00	CSLL 0,00	INSS 2.427,87																												
Total Líquido (R\$)	217.184,85																																	
OUTRAS INFORMAÇÕES																																		
<p>Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei R nº 100/2009 A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado em outro município (Foz do Iguaçu). O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador do Serviço. Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.</p>																																		
DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS																																		
<table border="1"> <tr> <td>PROCON</td> </tr> </table>							PROCON																											
PROCON																																		

Autenticidade: 4A5D9FF9.76C9D448.88B7A1BF.AC8756E (verificada em 13/06/2023 às 09:27:18)

Equiplano - NFS-e 500.2005u





PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU – PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SMOB
DIRETORIA DE OBRAS – DIOB



ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	FONTE	Descrição do Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	Custo do Item Total (R\$)	Saldo		1ª MEDIÇÃO	
								A MEDIR	A PAGAR	QUANT	CUSTO (R\$)
4			MONTEIRO LOBATO 300-A				RS 54.856,84	24,36%	76%	RS 41.491,10	
4.1			ENTRADA DE ENERGIA				36.649,74	1,17%	98,83%	RS 36.220,60	
4.1.1	PMFI-1015		MURETA EM ALVENARIA PARA ENTRADA DE ENERGIA 3,5M X 2,00M x 0,20M, INCLUI ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO: ESTACAS ARMADAS [H=2m], VIGA BALDRAME 14X30CM, PILARETES 20X20CM E VIGA CINTA. COBERTURA EM TELHAMENTO CERÂMICO - EXCLUSIVO ACABAMENTOS	UN	1,00	2166,37	2.166,37	0,00	R\$ 0,00	1,00	RS 2.166,37
4.1.2	SINAPI 87879		CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COHLER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇÃO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014	M2	7,00	4,32	30,24	0,00	R\$ 0,00	7,00	RS 30,24
4.1.3	SINAPI 87529		MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇÃO 1:2,8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	7,00	35,89	251,23	0,00	R\$ 0,00	7,00	RS 251,23
4.1.4	SINAPI 88485	AF_06/2014	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO,	M2	7,00	3,15	22,05	0,00	R\$ 0,00	7,00	RS 22,05
4.1.5	SINAPI 88489	AF_06/2014	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	7,00	16,39	114,73	0,00	R\$ 0,00	7,00	RS 114,73
4.1.6	PMFI-1023		ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, 4" APARENTE, INSTALADO EM PAREDE (OU POSTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BASEADO SINAPI 95752)	M	6,00	267,07	1.602,42	0,00	R\$ 0,00	6,00	RS 1.602,42
4.1.7	PMFI-1024		CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO 4", PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BASEADO SINAPI 93026)	UN	1,00	226,05	226,05	0,00	R\$ 0,00	1,00	RS 226,05
4.1.8	PMFI-1022		CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO EM CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO 60X60 E SUBTAMPA PADRÃO COPEL (BASEADO SINAPI 97889)	UN	1,00	750,00	750,00	0,00	R\$ 0,00	1,00	RS 750,00
4.1.9	PMFI 906		ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, DN 100 MM (4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BASEADO SINAPI 91856)	M	5,00	21,94	109,70	0,00	R\$ 0,00	5,00	RS 109,70
4.1.10	SINAPI 93358	AF_02/2021	ESCAVACÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	M3	0,45	93,79	42,21	0,00	R\$ 0,00	0,45	RS 42,21
4.1.11	SINAPI 101618	AF_08/2020	PREPARE DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	M3	0,08	230,00	17,25	0,00	R\$ 0,00	0,08	RS 17,25
4.1.12	SINAPI 96995	AF_10/2017	RETERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	0,37	56,87	21,13	0,00	R\$ 0,00	0,37	RS 21,13
4.1.13	PMFI PMFI-543		RETRÍADA E REINSTALAÇÃO DE BLOCO INTERTRAVADO, CONSIDERANDO RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE PAVER - INCLUSIVE BERÇO, REJUNTAMENTO E COMPACTAÇÃO	M2	2,50	27,77	69,43	0,00	R\$ 0,01	2,50	RS 69,43
4.1.14	SINAPI 93026	AF_12/2021	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	2,00	109,78	219,56	0,00	R\$ 0,00	2,00	RS 219,56
4.1.15	SINAPI 91873	AF_12/2015	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BASEADO SINAPI 91873)	M	2,00	25,78	51,56	0,00	R\$ 0,00	2,00	RS 51,56
4.1.16	PMFI PMFI-907	AF_12/2015	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 100 MM (4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BASEADO SINAPI 91873)	M	5,00	81,04	405,20	0,00	R\$ 0,00	5,00	RS 405,20
4.1.17	SINAPI 91920	AF_12/2015	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	25,00	50,00	0,00	R\$ 0,00	2,00	RS 50,00
4.1.18	SINAPI-I 1590		TERMINAL METÁLICO A PRESSÃO PARA 1 CABO DE 95 MM ² , COM 1 FURO DE FIXAÇÃO	UN	25,00	15,43	385,75	0,00	R\$ 0,00	25,00	RS 385,75
4.1.19	SINAPI-I 39211		ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	UN	4,00	1,73	6,92	0,00	R\$ 0,00	4,00	RS 6,92
4.1.20	SINAPI-I 39212		ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	UN	12,00	9,07	108,84	0,00	R\$ 0,00	12,00	RS 108,84
4.1.21	SINAPI-I 39177		BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	UN	4,00	1,98	7,92	0,00	R\$ 0,00	4,00	RS 7,92
4.1.22	SINAPI-I 39182		BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4", PARA ELETRODUTO	UN	12,00	11,22	134,64	0,00	R\$ 0,00	12,00	RS 134,64
4.1.23	SINAPI 91886	AF_12/2015	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	15,82	63,28	0,00	R\$ 0,00	4,00	RS 63,28
4.1.24	SINAPI-I 425		GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CONDUTOR DE *10 A 50 MM ²	UN	1,00	8,74	8,74	0,00	R\$ 0,00	1,00	RS 8,74
4.1.25	PMFI PMFI-177		CAIXA BEP 30 X 30 X 20 CM, BARRAMENTO 210A, 3/4" X 3/16" - PADRÃO COPEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	525,29	525,29	0,00	R\$ 0,00	1,00	RS 525,29
4.1.26	PMFI PMFI-178		CAIXA NS PARA DISJUNTOR 400A COM BARRAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	2909,49	2.909,49	0,00	R\$ 0,00	1,00	RS 2.909,49
4.1.27	PMFI PMFI-180		CAIXA EN PADRÃO COPEL (PARA 2 MEDIDORES) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	531,29	531,29	0,00	R\$ 0,00	1,00	RS 531,29
4.1.28	PMFI 181		CAIXA FN PADRÃO COPEL (57 X 75 X 26 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	629,19	629,19	0,00	R\$ 0,00	1,00	RS 629,19
4.1.29	PMFI-1279		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 1,5MM, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DE 300A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020. (BASEADO SINAPI 101878)	UN	1,00	876,23	876,23	0,00	R\$ 0,00	1,00	RS 876,23
4.1.30	PMFI 912		DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 300A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BASEADO SINAPI 101898)	UN	2,00	1646,71	3.293,42	0,00	R\$ 0,00	2,00	RS 3.293,42
4.1.31	SINAPI-I 39465		DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE *20 KA (TIPO AC)	UN	3,00	82,16	246,48	0,00	R\$ 0,00	3,00	RS 246,48
4.1.34	SINAPI 92992	AF_12/2021	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	200,00	36,72	19.344,00	0,00	R\$ 0,00	200,00	RS 19.344,00
4.1.35	PMFI PMFI-1285		EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO, E PEDIDO DE LIGAÇÃO DE ENERGIA NA CONCESSIONARIA	UN	1,00	1000,00	1.000,00	0,00	R\$ 0,00	1,00	RS 1.000,00
4.2			ATERRAMENTO				641,35	0,00%		100,00%	RS 641,35
4.2.1	SINAPI 96979	AF_12/2017	CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM ² , ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	3,00	109,59	328,77	0,00	R\$ 0,00	3,00	RS 328,77
4.2.2	SINAPI 91873	AF_12/2015	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,00	25,78	77,34	0,00	R\$ 0,00	3,00	RS 77,34
4.2.3	SINAPI 98111	AF_12/2020	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	2,00	45,96	91,92	0,00	R\$ 0,00	2,00	RS 91,92
4.2.4	PMFI 1115		HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" SPA RDPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COM CONECTOR (BASEADO SINAPI 96986)	UN	1,00	143,32	143,32	0,00	R\$ 0,00	1,00	RS 143,32
4.3			ADEQUAÇÃO QUADROS INTERNOS				17.457,15	73,48%		26,52%	RS 4.629,15
4.3.1	SINAPI 93655	AF_10/2020	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	15,90	47,70	0,00	R\$ 0,00	3,00	RS 47,70
4.3.2	SINAPI 97669	AF_12/2021	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	60,00	18,38	1.102,80	0,00	R\$ 0,00	60,00	RS 1.102,80
4.3.3	SINAPI 90446	AF_05/2015	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAiores QUE 75 MM. AF_05/2015	M	60,00	35,54	2.132,40	0,00	R\$ 0,00	60,00	RS 2.132,40
4.3.4	SINAPI 90470	AF_05/2015	CHUMBAVENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAiores QUE 75 MM. AF_05/2015	M	60,00	14,17	850,20	0,00	R\$ 0,00	60,00	RS 850,20
4.3.7	PMFI PMFI-576		CAIXA DE PASSAGEM (ELETTRICA) 30X30X40CM, EXECUTADA EM ALVENARIA, REBOCO IMPERMEABILIZADO, FUNDO EM CAMADAS DE BRITA 3 E AREIA MÉDIA COM TAMPAS DE CONCRETO.	UN	3,00	165,35	496,05	0,00	R\$ 0,00	3,00	RS 496,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU – PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SMOB
DIRETORIA DE OBRAS – DIOB



<p>Rua Ângela Aparecida Andrade, Jardim Marisa, Foz do Iguaçu, 85867-500, PR, Brasil</p> <p>Latitude 25.4692° S Longitude 54.5863° W Altitude 194,0 metros quarta-feira, 05/10/2023</p>	<p>Rua Ângela Aparecida Andrade, Jardim Porto Belo, Foz do Iguaçu, 85867-500, PR, Brasil</p> <p>Latitude 25.4692° S Longitude 54.5863° W Altitude 194,0 metros quarta-feira, 05/10/2023</p>
<p>Rua Ângela Aparecida Andrade, Jardim Porto Belo, Foz do Iguaçu, 85867-500, PR, Brasil</p> <p>Latitude 25.4692° S Longitude 54.5863° W Altitude 194,1 metros quarta-feira, 05/10/2023</p>	<p>Rua Ângela Aparecida Andrade, Jardim Porto Belo, Foz do Iguaçu, 85867-500, PR, Brasil</p> <p>Latitude 25.4692° S Longitude 54.5863° W Altitude 194,4 metros quarta-feira, 05/10/2023</p>
<p>Rua Ângela Aparecida Andrade, Jardim Porto Belo, Foz do Iguaçu, 85867-500, PR, Brasil</p> <p>Latitude 25.4691° S Longitude 54.5862° W Altitude 194,0 metros quarta-feira, 05/10/2023</p>	<p>quarta-feira, 7 de junho de 2023 09:51:14 -25.469186, -54.586323 1° N Rua Ângela Aparecida Andrade, 200 Jardim Porto Belo Foz do Iguaçu PR 85867-500 Brasil</p>



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU – PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SMOB
DIRETORIA DE OBRAS – DIOB



<p>Rua Ángela Aparecida Andrade, Jardim Marisa, Foz do Iguaçu, 85867-500, PR, Brasil Latitude 25.469186° S Longitude 54.586312° W Altitude 194.0 metros quarta-feira, 07 de junho de 2023 (18:45:04) Local 15:45:04 GMT 18:45:04</p>	<p>Rua Ángela Aparecida Andrade, Jardim Marisa, Foz do Iguaçu, 85867-500, PR, Brasil Latitude 25.4692° S Longitude 54.5862° W Altitude 194.0 metros quarta-feira, 05/10/2023 Local 15:45:04 GMT 18:45:04</p>
<p>Rua Ángela Aparecida Andrade, Jardim Porto Belo, Foz do Iguaçu, 85867-500, PR, Brasil Latitude 25.4692° S Longitude 54.5863° W Altitude 194.0 metros quarta-feira, 05/10/2023 Local 14:02:03 GMT 17:02:03</p>	<p>Rua Ángela Aparecida Andrade, Jardim Porto Belo, Foz do Iguaçu, 85867-500, PR, Brasil Latitude 25.4692° S Longitude 54.5863° W Altitude 194.0 metros quarta-feira, 05/10/2023 Local 12:02:42 GMT 15:02:42</p>
<p>Rua Ángela Aparecida Andrade, Jardim Porto Belo, Foz do Iguaçu, 85867-500, PR, Brasil Latitude 25.4692° S Longitude 54.5863° W Altitude 194.0 metros quarta-feira, 05/10/2023 Local 12:03:34 GMT 15:03:34</p>	<p>Rua Ángela Aparecida Andrade, Jardim Porto Belo, Foz do Iguaçu, 85867-500, PR, Brasil Latitude 25.4692° S Longitude 54.5863° W Altitude 194.0 metros quarta-feira, 05/10/2023 Local 17:01:49 GMT 20:01:49</p>




PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU – PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SMOB
DIRETORIA DE OBRAS – DIOB






PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU – PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SMOB
DIRETORIA DE OBRAS – DIOB

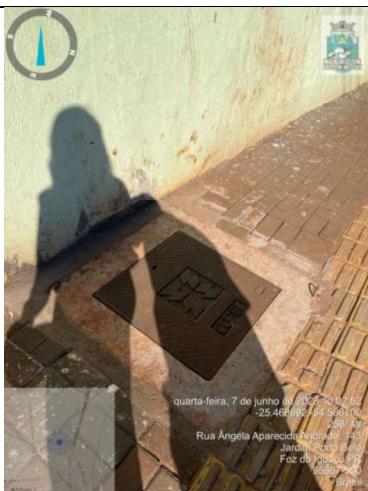


ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO DO ITEM	CUSTO TOTAL (R\$)	SALDO		2ª MEDIDAÇÃO	
									A MEDIR	A PAGAR	QUANT	CUSTO (R\$)
4			MONTEIRO LOBATO 300-A					R\$ 54.856,84	0,00%	24,36%		R\$ 12.365,73
4.1			ENTRADA DE ENERGIA					36.649,74	0,00%	1,17%		R\$ 429,13
4.1.31	PMFI	PMFI-121	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 300A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNI	2,00	157,22	314,44		0,00	R\$ 0,00	2,00	R\$ 314,44
4.1.32	SINAPI	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020	UN	1,00	114,69	114,69		0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 114,69
4.3			ADEQUAÇÃO QUADROS INTERNOS					17.457,15	0,00%	73,48%		R\$ 12.828,00
4.3.5	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	300,00	15,64	4.692,00		0,00	R\$ 0,00	300,00	R\$ 4.692,00
4.3.6	SINAPI	92984	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2021	M	300,00	27,12	8.136,00		0,00	R\$ 0,00	300,00	R\$ 8.136,00
4.4			LIMPEZA FINAL DE OBRA					108,60	0,00%	100,00%		R\$ 108,60
4.4.1	PMFI	PMFI-92	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	30,00	3,62	108,60		0,00	R\$ 0,00	30,00	R\$ 108,60



ITEM 4.1 – PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA

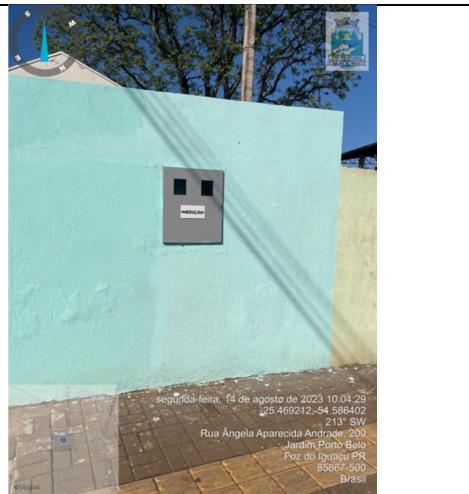

ITEM 4.1 – PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA

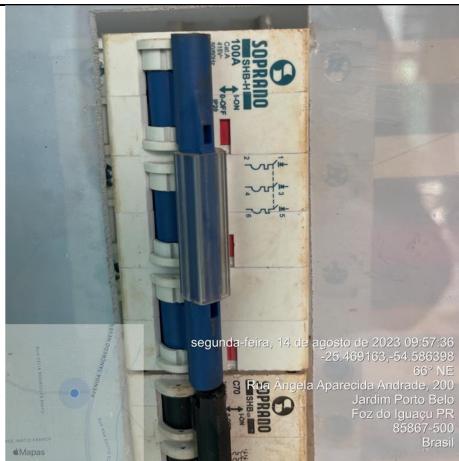

ITEM 4.1.31 – DISJUNTOR TRIFÁSICO 60 A 100A



ITEM 4.1.32 – DISJUNTOR TRIFÁSICO 50A



ITEM 4.3 – ADEQUAÇÃO QUADROS INTERNOS



ITEM 4.3 – ADEQUAÇÃO QUADROS INTERNOS

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **MEMORANDO INTERNO**

Número: **58.720/2023**

Assunto: **R: REQUERIMENTO Nº 722/2023**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.

Para verificar as assinaturas clique no link:

<https://sistemas.pmfipr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=cb9e8812-b143-48dd-a0d2-a230566ee40e&cpf=66209358934>

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:

cb9e8812-b143-48dd-a0d2-a230566ee40e

Hash do Documento

544F1BF33D77396BC9DE4CDDE7CC0659FC7DC0413B9B627BFEEEBA1EF8F0A9C8

Anexos

MEDIÇÃO 1 - MONTEIRO LOBATO.pdf - f8310fff-73dc-4e6f-b04e-e4dbb37d0198

MEDIÇÃO 2 - MONTEIRO LOBATO.pdf - 120d07ce-e814-4840-9124-0094c01ddec7

NF MEDIÇÃO 1 CERTO.pdf - d6366f46-a404-4803-9596-f05db593d126

NF MEDIÇÃO 2 CERTO.pdf - 6a41b553-a758-48b6-8b7f-396823b690e3

MEDICAO 1 PADRÕES ESCOLAS ATT.pdf - 0e7468c3-61d0-4847-b95c-fe892c9a0296

MEDICAO 2 - PADRÕES ESCOLAS CERTO.pdf - 4d47e540-3e13-468d-8dbc-da8311ebe920

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 24/10/2023 é(são) :

BRUNA ANDRADE PARCIANELLO CAMPOS (Signatário) - CPF: ***25414960** em 20/10/2023
12:24:03 - **OK**

Tipo: Assinatura Eletrônica

LUIS CEZAR FURLAN (Signatário) - CPF: ***87548900** em 23/10/2023 8:02:25 - **OK**

Tipo: Assinatura Eletrônica

VALDIR LAVINICKI (Signatário) - CPF: ***09358934** em 23/10/2023 8:52:17 - **OK**

Tipo: Assinatura Eletrônica



A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo, produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná
www.pmfi.pr.gov.br

MEMORANDO INTERNO

Emitente:	SMFA / DIGF / DVACO - DIVISÃO DE ARQUIVO CONTÁBIL	Data: 24/10/2023
Destinatário:	SMAD / DIAD / DVCMR - DIVISÃO DE CONTROLE E MONITORAMENTO DOS REQUERIMENTOS LEGISLATIVOS.	Número: 59414/2023
Assunto:	R: REQUERIMENTO Nº 722/2023	

À SMAD/DIAD/DVCMR

DIVISÃO DE CONTROLE E MONITORAMENTO DOS REQUERIMENTOS LEGISLATIVOS.

A/c Vilma Irene Prokopowiski Bochi

Diretoria de Administração.

Venho por meio deste, encaminhar resposta ao MEMO 57.568/2023, o qual faz menção ao Requerimento nº 722/2023, da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, que requer informações pertinentes ao Contrato nº 024/2023, referente a empresa Vougue Fabricação de Estruturas e Comércio de Equipamentos Elétricos Ltda.

Segue anexa documentação em questão.

Sem mais, atenciosamente

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:

CLEUNICE DE OLIVEIRA

Erviro Ferreira - Diretoria de Gestão Financeira

Darlei Finkler - Diretor de Gestão Orçamentária/ Responsável pela Secretaria Municipal da Fazenda - Interino

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **MEMORANDO INTERNO**

Número: **59.414/2023**

Assunto: **R: REQUERIMENTO Nº 722/2023**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.

Para verificar as assinaturas clique no link:

<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=a48f10ab-bb2d-4c5e-9145-e64568458428&cpf=02319476903>

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

**Código para verificação:
a48f10ab-bb2d-4c5e-9145-e64568458428**

Hash do Documento

A21963197ECA842E6ED41222858716043A7AB21589515DAD1EA3F934029DF770

Anexos

MEMORANDO INTERNO- Nº 57568/2023.pdf - **e19c8026-fa39-4709-82c9-023c20e81c53**

ESTORNO EMP 10501-23.pdf - **6bbd0960-9141-43d2-9324-8c3c2863a3e6**

EXTR CONTR 024-2023.pdf - **7853f51b-7941-4a6a-9db5-fde538ca06c1**

EXTR DESP 2805-23.pdf - **8fdb7505-e31a-43a5-87aa-d3b73949643f**

EXTR DESP 10501-23.pdf - **ac016b3e-72c0-4972-b20b-ec3d3004781a**

DOC01181520231023090025.pdf - **4daf190a-8f87-446e-ace8-575da8acf360**

DOC01181320231023084044.pdf - **05d67123-cb43-4604-ba4b-d4436d967218**

MEMORANDO INTERNO- Nº 57568/2023.pdf - **c985b6fb-32da-40b2-a276-7361ddd46b6d**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 26/10/2023 é(são) :

CLEUNICE DE OLIVEIRA (Signatário) - CPF: ***60844941** em 26/10/2023 8:38:59 - **OK**

Tipo: Assinatura Eletrônica

ERVIRO FERREIRA (Signatário) - CPF: ***19476903** em 26/10/2023 8:40:59 - **OK**

Tipo: Assinatura Eletrônica

DARLEI FINKLER (Signatário) - CPF: ***44755904** em 26/10/2023 8:48:34 - **OK**

Tipo: Assinatura Eletrônica



A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo, produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G337040723043153047
04/07/2023 07:30:12

Dados consultados

Agência	140-6
Conta	44057-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO
Descrição lote	PAG FORNEC DOC
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/06/2023
Data para pagamento	03/07/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ESCOLAR GARCIA EIRELE ME	PROCESSADO	748	0710	79.515	63.320,91
VOUGUE FABRICACAO DE ESTR	PROCESSADO	748	0710	88.483	217.184,85

Transação efetuada com sucesso por: JG301078 JUSELMAR FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

<http://www.pmfipr.gov.br> - pmfi@pmfi.pr.gov.br

Nota de Liquidação N° 1 / 2023 - Data:26/06/2023 Empenho N° 2.805 / 2023 - Tipo G – Global

Razão Social : **VOUGUE FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA**

Nome Fantasia :

Endereço : ROD PR-585,S/N

Bairro : JARDIM RECANTO

CEP : 85915090 TOLEDO-PR

CNPJ/CPF : 10.738.123/0001-88

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
756 - BANCO SICOOB	4351 - Toledo -Pr	13793-6 - VOGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
237 - BANCO BRADESCO S.A.	3280 - TOLEDO	39999-0 - VOGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSCREDI	0710 - SICREDI (Foz do Iguaçu)	88483-1 - VOGUE

Orgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO					
--------	---------------------------------------	--	--	--	--	--

Unidade:	02 - DIRETORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL					
----------	--------------------------------------	--	--	--	--	--

Projeto Atividade:	12.02.12.361.0600.1032 - REFORMA, RECONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS DE CONVIVÊNCIA ESCOLA BAIRRO					
--------------------	---	--	--	--	--	--

Nat. Despesa:	4490510105.1.104 - ESCOLAS/COLÉGIOS					
---------------	-------------------------------------	--	--	--	--	--

Resumo da Despesa

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr. Liquidado	Vlr. Consignado	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
354.364,96	0,00	220.716,30	3.531,45	0,00	217.184,85	133.648,66

Licitação:	Tomada de Preços Nº13/2.022					
------------	-----------------------------	--	--	--	--	--

Recurso:	66 - Educação 25% sobre Impostos					
----------	----------------------------------	--	--	--	--	--

Contrato:	24	Valor :	354.364,96	Data :	25/1/23	
-----------	----	---------	------------	--------	---------	--

Aditivo:		Valor :		Data :		
----------	--	---------	--	--------	--	--

Condição de Pagto:	Apresentação da N.F.			Prazo de Entrega :	90 dias	
--------------------	----------------------	--	--	--------------------	---------	--

Hist. Empenho:	Reforma e ampliação do padrão de energia das Escolas Municipais: ALTAIR FERRAIS DA SILVA, ANTONIO GONÇALVES DIAS, PROFª ELENICE MILHORANÇA e MONTEIRO LOBATO.					
----------------	---	--	--	--	--	--

Hist. Liquidação:	Liquidação ref. a 1º Medição do Ct 24/23 aumento de padrões de energia elétrica nas unidades escolares - SMED/SMOB.					
-------------------	---	--	--	--	--	--

Data da Liquidação:	26/06/2023					
---------------------	------------	--	--	--	--	--

Documentos Fiscais

Documento	Data	Número	Vencimento	Série	Vlr. Liquidado	Vlr. Consign.	Vlr. Pago	Saldo Pagar
Retenções	Data	Conta Contabil/		Description		Valor		
Nota Fiscal	13/06/2023	9198	03/07/2023	F	220.716,30	3.531,45	0,00	217.184,85
	26/06/2023	2188101030201000000	INSS RETIDO DE TERCEIROS			2.427,87		
	26/06/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE			1.103,58		
							0,00	
		Totais...			220.716,30	3.531,45	0,00	217.184,85

BRICAÇÃO DE ESTRUTURAS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELET

RG :

CPF :

Empresa diferenciada, conforme Decreto: 25.676/2017

**Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu**

Praça Getúlio Vargas 280, Centro - CEP: 85851-340 Foz do Iguaçu - PR

E-mail: 24horas@fozdoiguacu.pr.gov.br | Site: <http://www.pmfipr.gov.br/>

Telefone: (45) 3521-1000

COMPROVANTE DO PROCESSONº Processo: **033176** Ano: **2023**Data Processo: **13/06/2023** Hora: **10:06:56**Tipo Processo: **[PROCESSO DIGITAL] - COBRANÇA DE FATURA (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)**Requerente: **DIOGO RAFAEL GONÇALVES**

04917035970

Telefone: **4530546808**Endereço: **ÁREA AP, 604 - COOPAGRO**CEP: **85903748** Cidade: **Toledo** UF: **MG**Descrição: **AOS CUIDADOS DE HELOISA SETOR DE OBRAS**

Resultados, pareceres, informações deverão ser consultados através da internet em
<http://www.pmfipr.gov.br/prefeitura24h>, na aba **Protocolo** ou pelo telefone (45)3521-1371 ou (45)21051371.

OBSERVAÇÃO: Informações e retiradas de documentos, só serão fornecidas através deste documento/carimbado e assinado pelo responsável da entrada do processo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
FOZ DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ

ASSUNTO: **EMPRESA:** VOGUE
TELECOMUNICAÇÕES, **OBRA:** LIGAÇÃO
ENERGIA ESCOLAS MUN., PROC.: 33176/2023

CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS

Certificamos os serviços constantes neste documento: Protocolo Digital n.33176/2023, Nota Fiscal n.9198 valor: R\$ 220.716,30, empenho 2805/2023 - SMED, no qual foram executados de acordo ao Contrato n. 24/2023, os serviços são referente à 1º medição do contrato, valor aplicado em aumento de padrão de energias nas Escolas Municipais deste Município. As medições destes serviços estão devidamente assinadas pela fiscal da obra Eng. Bruna Andrade.

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:

VALDIR LAVINICKI

Luis Cezar Furlan - Secretário Municipal de Obras

Maria Justina da Silva - Secretária Municipal da Educação

	MUNICÍPIO DE TOLEDO Secretaria Municipal da Fazenda e Captação de Recursos NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e www.esnfs.com.br	Número da Nota: 9198 Data e Hora da Emissão: 13/06/2023 09:27:05 Operador Emissor: VOUGUE F. E. C														
PRESTADOR DE SERVIÇOS																
CPF/CNPJ: 10738123000188 I.E.: 90475398-00 I.M.: 969774 Telefone: 3054-6808 Nome/Razão: VOUGUE FABRICACAO DE ESTRUTURAS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA Endereço: ROD PR-585, SN - JARDIM RECANTO - 85915090 Município: Toledo UF: PR e-Mail: vouguetelecom@pop.com.br																
TOMADOR DE SERVIÇOS																
CPF/CNPJ: 76206606000140 I.E.: ISENTO I.M.: Nome/Razão: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU Endereço: RUA LISBOA , 510 - JARDIM ALICE - 85858050 Município: Foz do Iguaçu UF: PR e-Mail:																
Cód.	Discriminação	Val.Serviço Dedução Base Cálc. Alíq. ISS														
7.02	Prestação de serviço para aumento de carga do padrão de entrada de energia elétrica das unidades escolares, no Município de Foz do Iguaçu/PR	220.716,30 198.644,67 22.071,63 5,00 1.103,58														
CONTRATO 24/2023 EMPENHO 2805/2023 TOMADA DE PREÇO 13/2022 MATERIAL : 198.644,67 MÃO DE OBRA 22.071,63 Dedução: material																
Total Serviços (R\$) 220.716,30 Total ISS (R\$) 1.103,58 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: left; padding-bottom: 2px;"> Retenções (R\$) </td> <td style="width: 15%; text-align: left; padding-bottom: 2px;"> COFINS </td> <td style="width: 15%; text-align: left; padding-bottom: 2px;"> ISS (5,00) </td> <td style="width: 15%; text-align: left; padding-bottom: 2px;"> PIS </td> <td style="width: 15%; text-align: left; padding-bottom: 2px;"> IRRF </td> <td style="width: 15%; text-align: left; padding-bottom: 2px;"> CSLL </td> <td style="width: 15%; text-align: left; padding-bottom: 2px;"> INSS </td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.103,58</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.427,87</td> </tr> </table> Total Líquido (R\$) 217.184,85			Retenções (R\$)	COFINS	ISS (5,00)	PIS	IRRF	CSLL	INSS	0,00	0,00	1.103,58	0,00	0,00	0,00	2.427,87
Retenções (R\$)	COFINS	ISS (5,00)	PIS	IRRF	CSLL	INSS										
0,00	0,00	1.103,58	0,00	0,00	0,00	2.427,87										
OUTRAS INFORMAÇÕES																
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei R nº 100/2009 A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado em outro município (Foz do Iguaçu). O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador do Serviço. Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.																
DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS																
PROCON																

Autenticidade: 4A5D9FF9.76C9D448.88B7A1BF.AC8756E (verificada em 13/06/2023 às 09:27:18)

Equiplano - NFS-e 500.2005u



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AUMENTO DE CARGA DO PÁDRAO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES ESCOLARES				CONTRATO 24/2023
OBRA:				
ENDERECO:	Governo do Município de Foz do Iguaçu Construindo uma nova cidade 			
CONTRATADA:				
RESPONSÁVEL TÉCNICO:				
FISCAL:				
PERÍODO MEDIDO:	1 ^ª MEDIDA - 06/03/2023 a 12/06/2023			
DATA CONTRATO:	25/01/2023			
TOMADA DE PREÇO	13/02/22			
DATA ORDEM SERVIÇO	06/03/2023			
VIGÊNCIA CONTRATUAL:	210 dias (23/08/2023)			
PRAZO EXECUÇÃO:	150 dias (03/08/2023)			
Data: 12/06/2023				
1 ^ª MEDIDA				
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	PONTE	UNIDADE DE MEDIDA	SALDO
		DESCRIPÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADE	A MEDIR
1	PMFI-1288	SERVICOS INICIAIS		CUSTO TOTAL (R\$)
1.2	PMFI-1115	REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE ITENS DIVERSOS - ESTIMADO POR HORA DE SERVIÇO	H	CUSTO UNITÁRIO (R\$)
1.2	PMFI-1313	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TAPUME COM TELA PLÁSTICA LARANJA, COM 1,20 M DE ALTURA, PARA ISOLAMENTO DE OBRAS OU EM VÁLAS, 2 UTILIZAÇÕES	M	CUSTO TOTAL (R\$)
1.3	PMFI-1313	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - GERENCIAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRA - (ENGENHEIRO CIVIL 10H X MÊS)+ENCARREGADO GERAL 75H X MÊS)	%	A PAGAR
2		ALTAIR FERREIRA ZIZO - 400A		QUANT.
2.1	PMFI-1015	ENTRADA DE ENERGIA		CUSTO TOTAL (R\$)
2.1.1	SINAPI 87879	MURETA EM ALVENARIA PARA ENTRADA DE ENERGIA 3,5M X 2,00M X 0,20M, INCLUI ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO: ESTACAS ARMADAS (H=2M), VIGA BALDRAME 14X30CM, PILARETES 20X20CM E VIGA CINTA, COBERTURA EM TELHAMENTO CERÂMICO EXCLUSIVO ACABAMENTOS	UN	52,05%
2.1.2	SINAPI 87529	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇÃO 1:2:8, MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ESTACAS, ARMADAS (H=2M), VIGA BALDRAME 14X30CM, PILARETES 20X20CM, COM PREPARO EM BETÔNEIRA 400L, AF_06/2014	M2	52,05%
2.1.3	SINAPI 88485	PREPARO MECÂNICO COM BETÔNEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014	M2	52,05%
2.1.4	SINAPI 88489	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014	M2	52,05%
2.1.5	SINAPI 1023	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	M2	52,05%
2.1.6	PMFI-1024	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, 4" APARENTE, INSTALADO EM PAREDE (OU POSTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, (BASEADO SINAPI95752)	M	52,05%
2.1.7	PMFI-1024	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO 4", PARA REDE ENTERRADA DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, (BASEADO SINAPI 93026)	UN	52,05%
2.1.8	PMFI-1022	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TÜDOLS CERÂMICOS MACICOS, FUNDO EM CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M, COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO 60X60 E SUBTAMPA PADRÃO COPEL (BASEADO SINAPI 97889)	UN	52,05%
2.1.9	PMFI-906	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, DN 100 MM (4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, (BASEADO SINAPI 91856)	M	52,05%

Este documento foi assinado eletronicamente por **BETIM BORGES** PARCIELLO CARPOS, **Carmos e Assinaturas** e **Assinaturas**. Para verificar as assinaturas, vá ao site <https://sistemas.pmfipr.gov.br/rp/sidpublico/verificar> e utilize o código 89b225d7-fbf9-454f-a2e1-867e0555d473.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:		IGOR DE SOUZA MORAES		DATA ORDEM SERVIÇO		08/03/2023		POZ DO IJUCAU		Construindo uma nova cidade		
FISCAL		BRUNA ANDRADE PARCIANELLO CAMPOS		VIGÊNCIA CONTRATUAL:		210 dias (23/08/2023)		ESTADUAIS				
PERÍODO MEDIDO:		1ª MEDIDA - 06/03/2023 a 12/03/2023		PRAZO EXECUÇÃO:		150 dias (03/08/2023)		MUNICIPAIS				
Data: 12/06/2023											1ª MEDIDA	
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO DO ITEM (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	A MEDIR	A PAGAR	QUANT.	CUSTO (R\$)
2.1.10	SINAPI 93358	AF_02/2021	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	M3	1,35	93,79	126,62		0,00	R\$ 0,00	1,35	R\$ 126,62
2.1.11	SINAPI 101618	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CÂMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL AF_08/2020	M3	0,23	230,00	51,75		0,00	R\$ 0,00	0,23		R\$ 51,75
2.1.12	SINAPI 96995	REATERRO MANUAL APILODO COM SOQUETE AF_10/2017	M3	1,11	56,87	63,38		0,00	R\$ 0,00	1,11		R\$ 63,38
2.1.13	PMFI-543	REINSTALAÇÃO E REARROVETAMENTO DE PAVER, INCLUSIVO BERTO, REUNIAMENTO E COMPACTAÇÃO	M2	7,50	27,77	208,28		0,00	R\$ 0,00	7,50		R\$ 208,28
2.1.14	SINAPI AF 12/2021	REARROVETAMENTO DE PAVER, INCLUSIVO BERTO, REUNIAMENTO E COMPACTAÇÃO	UN	2,00	109,78	219,56		0,00	R\$ 0,00	2,00		R\$ 219,56
2.1.15	PMFI-907	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC, DN 100 MM (4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BASEADO SINAPI 91873)	M	5,00	81,04	405,20		0,00	R\$ 0,00	5,00		R\$ 405,20
2.1.16	SINAPI 91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,00	25,78	51,56		0,00	R\$ 0,00	2,00		R\$ 51,56
2.1.17	SINAPI 91920	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	25,00	50,00		0,00	R\$ 0,00	2,00		R\$ 50,00
2.1.18	SINAPI-1 1590	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2, COM 1 FURU DE FRIACAO	UN	25,00	15,43	385,75		0,00	R\$ 0,00	25,00		R\$ 385,75
2.1.19	SINAPI-1 39211	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	UN	4,00	1,73	6,92		0,00	R\$ 0,00	4,00		R\$ 6,92
2.1.20	SINAPI-1 39216	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4", PARA ELETRODUTO	UN	12,00	9,07	108,84		0,00	R\$ 0,00	12,00		R\$ 108,84
2.1.21	SINAPI-1 39177	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	UN	4,00	1,98	7,92		0,00	R\$ 0,00	4,00		R\$ 7,92
2.1.22	SINAPI-1 39182	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4", PARA ELETRODUTO	UN	12,00	11,22	134,64		0,00	R\$ 0,00	12,00		R\$ 134,64
2.1.23	SINAPI 91886	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	4,00	15,82	63,28		0,00	R\$ 0,00	4,00		R\$ 63,28
2.1.24	SINAPI-1 425	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE AERRAMENTO DE 5/8", CONDUTOR DE *10* A50 NM2	UN	1,00	8,74	8,74		0,00	R\$ 0,00	1,00		R\$ 8,74
2.1.25	PMFI-177	CAIXA BEP 30 X 30 X 20 CM, BARRAMENTO 210A, 3/4" X 3/16" - PADRÃO COPEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	525,29	525,29		0,00	R\$ 0,00	1,00		R\$ 525,29
2.1.26	PMFI-178	CAIXA NS PARA DISJUNTOR 400A COM BARRAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	2909,49	2909,49		0,00	R\$ 0,00	1,00		R\$ 2909,49
2.1.27	PMFI-180	CAIXA EN PADRÃO COPEL (PARA 2 MEDIDORES) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	531,29	531,29		0,00	R\$ 0,00	1,00		R\$ 531,29
2.1.28	PMFI-181	CAIXA EN PADRÃO COPEL (57 X 75 X 26 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	629,19	629,19		0,00	R\$ 0,00	1,00		R\$ 629,19
2.1.29	PMFI-179	CAIXA EN PADRÃO COPEL (45 X 35 X 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	234,06	234,06		1,00	R\$ 234,06	0,00		R\$ 0,00
2.1.30	PMFI-1280	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE 180X120CM, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020. (BASEADO SINAPI 101878)	UN	1,00	936,98	936,98		0,00	R\$ 0,00	1,00		R\$ 936,98
2.1.33	SINAPI 101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	1,00	186,37	186,37		1,00	R\$ 186,37	0,00		R\$ 0,00
2.1.37	PMFI-1285	EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO, E PEDIDO DE LIGAÇÃO DE ENERGIA NA CONCESSIONÁRIA	UN	1,00	2000,00	2000,00		0,00	R\$ 0,00	1,00		R\$ 2000,00

RESPONSÁVEL TÉCNICO:		IGOR DE SOUZA MORAES		DATA ORDEN SERVIÇO		08/03/2023		CUSTO (R\$)		1ª MEDIDA	
FISCAL		BRUNA ANDRADE PARCHANELLO CAMPOS		VIGÊNCIA CONTRATUAL:		210 dias (23/08/2023)		CUSTO TOTAL (R\$)		QUANT	
PERÍODO MEDIDO:		1ª MEDIDA - 08/03/2023 a 12/06/2023		PRAZO EXECUÇÃO:		150 dias (03/09/2023)		A MEDIR		A PAGAR	
Construindo uma nova cidade											Data: 12/06/2023
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	FONTE	DESCRICAÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITARIO	CUSTO DO ITEM (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	A MEDIR	A PAGAR	SALDO
			ATERRAMENTO						0,00%	0,00%	
2.2.1	SINAPI	96979	CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM ² , ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	3,00	109,59	328,77	641,35	0,00%	100,00%	R\$ 641,35
2.2.2	SINAPI	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,00	25,78	77,34		0,00	R\$ 0,00	3,00
2.2.3	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POULETEN, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COM CONECTOR (BASEADO SINAPI 95986)	UN	2,00	45,96	91,92		0,00	R\$ 0,00	2,00
2.2.4	PMFI	11115	ADAPTAÇÃO DO PLAYGROUND	UN	1,00	143,32	143,32		R\$ 94,219,28	4,77%	R\$ 915,89
3			REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE ITENS DIVERSOS - ESTIMADO POR HORA DE SERVIÇO	H	8,00	55,93	441,44		0,00	R\$ 0,00	1,00
3.1.1	PMFI	1288	RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE BLOCO INTERTRAVADO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE PAVER - INCLUSIVE BERCO, REJUNTAMENTO E COMPACTAÇÃO	M2	15,00	27,77	416,55		0,00	R\$ 0,00	R\$ 89,726,57
3.1.2	PMFI	PMFI-543	ACERTO DO SOLO NATURAL COM REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO	M2	15,00	3,46	51,90		0,00	R\$ 0,00	R\$ 915,89
3.1.3	PMFI	PMFI-481	ENTRADA DE ENERGIA				29,635,60	0,83%		99,17%	R\$ 29,369,11
3.2.1	PMFI	1015	MURETA EM ALVENARIA PARA ENTRADA DE ENERGIA 3,5M X 2,00M X 0,20M. INCLUI ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO: ESTACAS ARMADAS (H=2M), VIGA BALDRAME 14X30CM, PILARETES 20X20CM E VIGA CINTA. COBERTURA EM TELHAMENTO CERÂMICO -EXCLUSIVO ACABAMENTOS	UN	1,00	2000,00			0,00	R\$ 0,00	1,00
3.2.2	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONERA 400L AF_06/2014 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2,8; PREPARO MECÂNICO COM BETONERA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	7,00	4,32	30,24		0,00	R\$ 0,00	7,00
3.2.3	SINAPI	87529	AF_06/2014 APPLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	7,00	3,15	22,05		0,00	R\$ 0,00	7,00
3.2.4	SINAPI	88485	AF_06/2014 APPLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAS. AF_05/2014 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, 4" APARENTE, INSTALADO EM PAREDE (OU POSTE) -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BASEADO SINAPI 95752)	M2	7,00	16,39	114,73		0,00	R\$ 0,00	7,00
3.2.5	SINAPI	88489	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO 4", PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BASEADO SINAPI 93026)	M	6,00	267,07	1602,42		0,00	R\$ 0,00	6,00
3.2.6	PMFI	1023	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUJOS CERÂMICOS MACICOS, FUNDO EM CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,80x0,80x0,6 M. COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO 60X60 E SUBTAMPA PADRÃO COPEL (BASEADO SINAPI 97889)	UN	1,00	226,05	226,05		0,00	R\$ 0,00	1,00
3.2.7	PMFI	1024	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, DN 100 MM (4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BASEADO SINAPI 91856)	M	12,00	21,94	263,28		0,00	R\$ 0,00	12,00
3.2.8	PMFI	1022									R\$ 263,28
3.2.9	PMFI	906									

Este documento foi assinado eletronicamente por BERNILÁSIO JOSÉ DE PAZ PARCIANELLO CAMPOS e Assinaturas. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sistemas.pmfipr.gov.br/rp/sidpublico/verificar> e utilize o código 89b225d7-fbf9-454f-a2e1-867e0555d473.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:		IGOR DE SOUZA MORAES		DATA ORDEM SERVIÇO [06/03/2023]		POZ DO IGUAÇU - Fazenda das Margens		Construindo uma nova cidade	
FISCAL		BRUNA ANDRADE PARCIANELLO CAMPOS		VIGÊNCIA CONTRATUAL: [210 dias (23/08/2023)]		PRAZO EXECUÇÃO: [150 dias (03/08/2023)]		Data: 12/06/2023	
PERÍODO MEDIDO:		1ª MEDIDA - 06/03/2023 à 12/06/2023		PRAZO EXECUÇÃO: [03/08/2023]		Data: 12/06/2023		1ª MEDIDA	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO									
Nº EM	CÓDIGO DO SERVIÇO	FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO DO ITEM (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	A MEDIR
3.2.10	SINAPI 93358	AF 02/2021	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	M3	1,08	93,79	101,29	0,00	R\$ 0,00
3.2.11	SINAPI 101618	AF 08/2020	PREPÁRIO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CÂMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	M3	0,18	230,00	41,40	0,00	R\$ 0,00
3.2.12	SINAPI 96595	AF 10/2017	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	0,89	56,87	50,71	0,00	R\$ 0,00
3.2.13	PMFI-543	AF 12/2021	RETRÍDA E REINSTALAÇÃO DE BLOCO INTERTRAVADO, CONSIDERANDO REAPROVETAMENTO DE PAVÉR - INCLUSIVE BEÇO, REUNTAVAMENTO E COMPACTAÇÃO	M2	7,50	27,77	208,28	0,00	R\$ 0,00
3.2.14	SINAPI 93026	AF 12/2021	CURVA 90 GRaus PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAvEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	109,78	219,56	0,00	R\$ 0,00
3.2.15	SINAPI 91873	AF 12/2015	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAvEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BASEADO SINAPI 91873)	M	2,00	25,78	51,56	0,00	R\$ 0,00
3.2.16	PMFI-907	AF 12/2015	CURVA 90 GRaus PARA ELETRODUTO, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	5,00	81,04	405,20	0,00	R\$ 0,00
3.2.17	SINAPI 91920	AF 12/2015	TERMINAL METÁLICO A PRESSÃO PARA 1 CABO DE 95 MM2, COM 1 FURU DE FIXAÇÃO ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	UN	2,00	25,00	50,00	0,00	R\$ 0,00
3.2.18	SINAPI-1 1590	AF 12/2015	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	UN	4,00	1,73	6,92	0,00	R\$ 0,00
3.2.19	SINAPI-1 39211	AF 12/2015	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4", PARA ELETRODUTO	UN	12,00	9,07	108,84	0,00	R\$ 0,00
3.2.20	SINAPI-1 39216	AF 12/2015	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	UN	4,00	1,98	7,92	0,00	R\$ 0,00
3.2.21	SINAPI-1 39177	AF 12/2015	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4", PARA ELETRODUTO	UN	12,00	11,22	134,64	0,00	R\$ 0,00
3.2.22	SINAPI-1 39182	AF 12/2015	LUVU PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAvEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	15,82	63,28	0,00	R\$ 0,00
3.2.23	SINAPI 91886	AF 12/2015	GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE AERRAMENTO DE 5/8", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2	UN	1,00	8,74	8,74	0,00	R\$ 0,00
3.2.24	SINAPI-1 425	AF 10/2020	CAIXA BEP 30 X 30 X 20 CM, BARRAMENTO 210A, 3/4" X 3/16" - PADRÃO COPEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	525,29	525,29	0,00	R\$ 0,00
3.2.25	PMFI-177	AF 10/2020	CAIXA NS PARA DISJUNTOR 400A COM BARRAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	2.909,49	2.909,49	0,00	R\$ 0,00
3.2.26	PMFI-178	AF 10/2020	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR - CORRENTE NOMINAL DE 300A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BASEADO SINAPI 101898)	UN	2,00	950,00	1.900,00	0,00	R\$ 0,00
3.2.27	PMFI-180	AF 10/2020	CAIXA EN PADRÃO COPEL (PARA 2 MEDIDORES) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	531,29	531,29	0,00	R\$ 0,00
3.2.28	PMFI 181	AF 10/2020	CAIXA EN PADRÃO COPEL (57 X 75 X 26 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	629,19	629,19	0,00	R\$ 0,00
3.2.29	PMFI-1279	AF 10/2020	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 300A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020. (BASEADO SINAPI 101878)	UN	1,00	876,23	876,23	0,00	R\$ 0,00
3.2.30	PMFI 912	AF 10/2020	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	186,37	372,74	0,00	R\$ 0,00
3.2.31	SINAPI 101894	AF 10/2020	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	186,37	372,74	0,00	R\$ 0,00

Este documento foi assinado eletronicamente por **BRUNA ANDRADE PARCIANELLO CAMPOS**.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar> e utilize o código 89b225d7-fbf9-454f-a2e1-867e0555d473.

RESPOSTA FISCAL:				GOR DE SOUZA MORAES				Construindo uma nova cidade				
BRUNA ANDRADE PARCIANELLO CAMPOS				Foz do Iguaçu - Paraná				Foz do Iguaçu - Paraná				
PERÍODO MEDIDO :				1ª MEDIDA - 06/03/2023 a 12/06/2023				PRAZO EXECUÇÃO:				
DATA ORDEM SERVIÇO 06/03/2023 VIGÊNCIA CONTRATUAL: 210 dias (23/08/2023)						DATA: 12/06/2023 1ª MEDIDA SALDO						
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO DO ITEM (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	A MEDIR	A PAGAR	QUANT.	CUSTO (R\$)
3.2.33	SINAPI	92992	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	140,00	96,72	13.540,80		0,00	R\$ 0,00	140,00	R\$ 13.540,80
3.2.34	PMFI-1285		EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO, E PEDIDO DE LIGAÇÃO DE ENERGIA NA CONCESSIONÁRIA	UN	1,00	1000,00	1.000,00		0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 1.000,00
3.3			A TERRAMENTO						641,35	0,00%		R\$ 641,35
3.3.1	SINAPI	96979	CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM ² , ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	3,00	109,59	328,77		0,00	R\$ 0,00	3,00	R\$ 328,77
3.3.2	SINAPI	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,00	25,78	77,34		0,00	R\$ 0,00	3,00	R\$ 77,34
3.3.3	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	2,00	45,96	91,92		0,00	R\$ 0,00	2,00	R\$ 91,92
3.3.4	PMFI-1115		HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COM CONECTOR (BASEADO SINAPI 96986)	UN	1,00	143,32	143,32		0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 143,32
3.5			ADEQUAÇÃO QUADROS/INTERNO'S						R\$ 60.600,42	3,00%		R\$ 68.780,22
3.5.1	SINAPI	90458	QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76x40 CM). AF_05/2015	UN	4,00	25,00	100,00		3.855,07	0,00%		R\$ 3.895,07
3.5.1.1	SINAPI	101882	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE BARRAMENTO, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	1.718,15	1.718,15		0,00	R\$ 0,00	4,00	R\$ 0,00
3.5.1.2	SINAPI	101880	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE BARRAMENTO, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	838,96	838,96		0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 1.718,15
3.5.1.3	SINAPI	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE BARRAMENTO, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	694,99	694,99		0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 694,99
3.5.1.5	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE BARRAMENTO, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	502,97	502,97		0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 502,97
3.5.2			DISJUNTORES						5.086,72	25,11%		R\$ 3.809,52
3.5.2.1	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	13,86	27,72		0,00	R\$ 0,00	2,00	R\$ 27,72
3.5.2.2	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	23,00	14,57	335,11		0,00	R\$ 0,00	23,00	R\$ 335,11
3.5.2.3	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20,00	15,90	318,00		0,00	R\$ 0,00	20,00	R\$ 318,00
3.5.2.4	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	15,90	15,90		0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 15,90
3.5.2.5	SINAPI	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00	17,53	140,24		0,00	R\$ 0,00	8,00	R\$ 140,24
3.5.2.6	SINAPI	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	25,45	76,35		0,00	R\$ 0,00	3,00	R\$ 76,35
3.5.2.7	SINAPI	93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	28,30	86,40		0,00	R\$ 0,00	3,00	R\$ 86,40

Construindo uma nova cidade									
TOZ DO IGUAÇU			Data: 12/06/2023						
VIGÊNCIA CONTRATUAL: (23/06/2023)			PRAZO EXECUÇÃO: (03/06/2023)			1ª MEDIDA			
Data: 12/06/2023									
NºEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO DO ITEM (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	A MEDIR
				M3	0,08	230,00	17,25	0,00	R\$ 0,00
4.1.11	SINAPI	101618	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL AF_08/2020	M3	0,37	56,87	21,13	0,00	R\$ 0,00
4.1.12	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOquete AF_10/2017	M3	2,50	27,77	69,43	0,00	R\$ 0,00
4.1.13	PMFI	PMFI-543	RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE BLOCO INTERTRAVADO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE PAVER - INCLUSIVE BERÇO, REJUNTAMENTO E COMPACTAÇÃO	M2	2,00	109,78	219,56	0,00	R\$ 0,01
4.1.14	SINAPI	93026	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	2,00	25,78	51,56	0,00	R\$ 0,00
4.1.15	SINAPI	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_14/2015	M	5,00	81,04	405,20	0,00	R\$ 0,00
4.1.16	PMFI	PMFI-907	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 100 MM (4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BASEADO SINAPI 91873)	M	2,00	25,00	50,00	0,00	R\$ 0,00
4.1.17	SINAPI	91920	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	15,43	385,75	0,00	R\$ 0,00
4.1.18	SINAPI	1590	TERMINAL METÁLICO A PRESSÃO PARA 1 CABO DE 95 MM2, COM 1 FURO DE FIXAÇÃO	UN	4,00	1,73	6,92	0,00	R\$ 0,00
4.1.19	SINAPI	39211	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	UN	12,00	9,07	108,84	0,00	R\$ 0,00
4.1.20	SINAPI	39216	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4", PARA ELETRODUTO	UN	4,00	1,98	7,92	0,00	R\$ 0,00
4.1.21	SINAPI	39177	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	UN	12,00	11,22	134,64	0,00	R\$ 0,00
4.1.22	SINAPI	39182	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4", PARA ELETRODUTO	UN	4,00	15,82	63,28	0,00	R\$ 0,00
4.1.23	SINAPI	91886	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	8,74	8,74	0,00	R\$ 0,00
4.1.24	SINAPI	425	GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAR PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CONDUTOR DE 1 1/8" A 50 MM2	UN	1,00	525,29	525,29	0,00	R\$ 0,00
4.1.25	PMFI	PMFI-177	CAIXA BEP 30 X 30 X 20 CM, BARRAMENTO 210A, 3/4" X 3/16" - PADRÃO COPEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	531,29	531,29	0,00	R\$ 0,00
4.1.26	PMFI	PMFI-178	CAIXA NS PARA DISJUNTOR 400A COM BARRAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	2909,49	2.909,49	0,00	R\$ 0,00
4.1.27	PMFI	PMFI-180	CAIXA EM PADRÃO COPEL (PARA 2 MEDIDORES) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	629,19	629,19	0,00	R\$ 0,00
4.1.28	PMFI	181	CAIXA FN PADRÃO COPEL (57 X 75 X 26 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1646,71	3.293,42	0,00	R\$ 0,00
4.1.29	PMFI	PMFI-1279	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 300A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020. (BASEADO SINAPI 1018/8)	UN	3,00	82,16	246,48	0,00	R\$ 0,00
4.1.30	PMFI	912	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 300A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BASEADO SINAPI 1018/89)	UN	2,00	876,23	1.752,46	0,00	R\$ 0,00
4.1.33	SINAPI	39465	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE 20* KA (TIPO AC)	M	200,00	19.344,00	386,88	0,00	R\$ 0,00
4.1.34	SINAPI	92992	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	96,72	19.344,00	386,88	0,00	R\$ 0,00

Este documento foi assinado eletronicamente por BRUNA ANDRADE PARCIANELLO CAMPOS.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar> e utilize o código 89b225d7-fbf9-454f-a2e1-867e0555d473.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:		IGOR DE SOUZA MORAES		DATA ORDEN SERVIÇO		08/03/2023	08/03/2023	Construindo uma nova cidade				
FISCAL		BRUNA ANDRADE PARCANELLO CAMPOS		VIGÊNCIA CONTRATUAL:		210 dias (23/08/2023)	150 dias (03/08/2023)					
PERÍODO MEDIDO :		1ª MEDIDA - 05/03/2023 a 12/06/2023		PRAZO EXECUÇÃO:		150 dias (03/08/2023)	150 dias (03/08/2023)					
									Dia: 12/06/2023			
ITEM	CÓDIGO DO SERVICO	FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVICO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITARIO	CUSTO DO ITEM (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	A MEDIR	A PAGAR	QUANT	CUSTO (R\$)
4.1.35	PMFI-1285	PMFI-	EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO, E PEDIDO DE LIGAÇÃO DE ENERGIA NA CONCESSIONÁRIA	UN	1,00	1000,00	1,000,00	1,000,00	0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 1.000,00
4.2.			ATERRAMENTO						641,35	0,00%		R\$ 641,35
4.2.1	SINAPI 96979	PMFI-	CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM ² , ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	3,00	109,59	328,77	328,77	0,00	R\$ 0,00	3,00	R\$ 328,77
4.2.2	SINAPI 91873	PMFI-	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVÉL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,00	25,78	77,34	77,34	0,00	R\$ 0,00	3,00	R\$ 77,34
4.2.3	SINAPI 98111	PMFI-	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,31M. AF_12/2020	UN	2,00	45,96	91,92	91,92	0,00	R\$ 0,00	2,00	R\$ 91,92
4.2.4	PMFI-1115	PMFI-	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COM CONECTOR (BASEADO SINAPI 96986)	UN	1,00	143,32	143,32	143,32	0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 143,32
4.3.			ADEQUAÇÃO QUADROS INTERNOS						17.457,15	73,48%		R\$ 4.629,45
4.3.1	SINAPI 93655	PMFI-	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	15,90	47,70	47,70	0,00	R\$ 0,00	3,00	R\$ 47,70
4.3.2	SINAPI 97669	PMFI-	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	60,00	18,38	1.028,80	1.028,80	0,00	R\$ 0,00	60,00	R\$ 1.028,80
4.3.3	SINAPI 90446	PMFI-	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAiores QUE 75MM. AF_05/2015	M	60,00	35,54	2.132,40	2.132,40	0,00	R\$ 0,00	60,00	R\$ 2.132,40
4.3.4	SINAPI 90470	PMFI-	CHUMBAVENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAiores QUE 75 MM. AF_05/2015	M	60,00	14,17	850,20	850,20	0,00	R\$ 0,00	60,00	R\$ 850,20
4.3.7	PMFI-576	PMFI-	CAIXA DE PASSAGEM (ELÉTRICA) 30X30X40CM, EXECUTADA EM ALVENARIA, REBOCO IMPERMEABILIZADO, FUNDO EM CAMADAS DE BRITA 3 E AREIA MÉDIA COM TAMPA DE CONCRETO.	UN	3,00	165,35	496,05	496,05	0,00	R\$ 0,00	3,00	R\$ 496,05
5			HELENICE MILHORANÇA - 300A						R\$ 32.722,28	6,77%		R\$ 496,05
5.1.			ENTRADA DE ENERGIA						27.728,10	0,89%		R\$ 27.481,61
5.1.1	PMFI-1015	PMFI-	MURETA EM ALVENARIA PARA ENTRADA DE ENERGIA 3,5M X 2,00M X 0,20M, INCLUI ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO: ESTACAS, ARMADAS (H=2M), VIGA BALDRAME 14X30CM, PILARES 20X20CM E VIGA CINTA. COBERTURA EM TELHAMENTO CERÂMICO -EXCLUSIVO ACABAMENTO CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	UN	1,00	2000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 2.000,00
5.1.2	SINAPI 87879	PMFI-	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TAUSCAS. AF_06/2014	M2	7,00	35,89	251,23	251,23	0,00	R\$ 0,00	7,00	R\$ 30,24
5.1.3	SINAPI 87529	PMFI-	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	7,00	3,15	22,05	22,05	0,00	R\$ 0,00	7,00	R\$ 25,123
5.1.4	SINAPI 88485	PMFI-	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	7,00	16,39	114,73	114,73	0,00	R\$ 0,00	7,00	R\$ 114,73
5.1.5	SINAPI 88489	PMFI-	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, 4" APARENTE, INSTALADO EM PAREDE (OU POSTE)	M	6,00	267,07	1.602,42	1.602,42	0,00	R\$ 0,00	6,00	R\$ 1.602,42
5.1.6	PMFI-1023	PMFI-	-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BASEADO SINAPI 95752)									

Este documento foi assinado eletronicamente por ERIVALDO GATTOSE JOSÉ PARCANELLO CAMPOS.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sistemas.pmfipr.gov.br/rp/sidpublico/> e utilize o código 89b225d7-fbf9-454f-a2e1-867e0555d473.

Contratando uma nova cidade									
TOZ DO IGUAÇU				Fazenda do Iguaçu					
Projeto de Infraestrutura				Projeto de Infraestrutura					
RESPONSAVÉL TÉCNICO:				Data Ordem Serviço 06/03/2023					
FISCAL:				VIGÊNCIA CONTRATUAL: 210 dias (23/06/2023)					
PERÍODO MEDIDO:				PRAZO EXECUÇÃO: 150 dias (03/06/2023)					
1ª MEDIDA - 06/03/2023 a 12/06/2023				Data: 12/06/2023					
DESCRÍPCAO DO SERVIÇO				1ª MEDICAO					
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	FONTE	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO DO ITEM (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	A MEDIR	A PAGAR
5.1.7	PMFI-1024	PMFI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO 4", PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BASEADO SINAPI 91826)	UN	1,00	226,05	226,05	0,00	R\$ 0,00
5.1.8	PMFI-1022	PMFI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO EM CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO 60X60 E SUBTAMPA PADRÃO COPEL (BASEADO SINAPI 97489)	UN	1,00	750,00	750,00	0,00	R\$ 0,00
5.1.9	906	PMFI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, DN 100 MM (4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BASEADO SINAPI 91856)	M	5,00	21,94	109,70	0,00	R\$ 0,00
5.1.10	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	M3	0,45	93,79	42,21	0,00	R\$ 0,00
5.1.11	101618	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	M3	0,08	230,00	17,25	0,00	R\$ 0,00
5.1.12	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOCUTE. AF_10/2017	M3	0,37	56,87	21,13	0,00	R\$ 0,00
5.1.13	PMFI-543	PMFI	RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE BLOCO INTERTRAVADO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE PAVÉ - INCLUSIVE BERÇO, REUNTAPEAMENTO E COMPACTAÇÃO	M2	2,50	27,77	69,43	0,00	R\$ 0,01
5.1.14	93026	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	2,00	109,78	219,56	0,00	R\$ 0,00
5.1.15	91873	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,00	25,78	51,56	0,00	R\$ 0,00
5.1.16	PMFI-907	PMFI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC, DN 100 MM (4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BASEADO SINAPI 91873)	M	5,00	81,04	405,20	0,00	R\$ 0,00
5.1.17	91920	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	25,00	50,00	0,00	R\$ 0,00
5.1.18	1590	SINAPI	TERMINAL METÁLICO A PRESSÃO PARA 1 CABO DE 95 MM2, COM 1 FURO DE FIXAÇÃO	UN	25,00	15,43	385,75	0,00	R\$ 0,00
5.1.19	39211	SINAPI	ARRUELA EM ALUMINÍUM, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	UN	4,00	1,73	6,92	0,00	R\$ 0,00
5.1.20	39216	SINAPI	ARRUELA EM ALUMINÍUM, COM ROSCA, DE 4", PARA ELETRODUTO	UN	12,00	9,07	108,84	0,00	R\$ 0,00
5.1.21	39177	SINAPI	BUCHA EM ALUMINÍUM, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	UN	4,00	1,98	7,92	0,00	R\$ 0,00
5.1.22	39182	SINAPI	BUCHA EM ALUMINÍUM, COM ROSCA, DE 4", PARA ELETRODUTO	UN	12,00	11,22	134,64	0,00	R\$ 0,00
5.1.23	91886	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	15,82	63,28	0,00	R\$ 0,00
5.1.24	425	SINAPI	GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" DE "10" A 50 MM2	UN	1,00	8,74	8,74	0,00	R\$ 0,00
5.1.25	PMFI-177	PMFI	CAIXA BEP 30 X 30 X 20 CM, BARRAMENTO 210A, 3/4" X 3/16" - PADRÃO COPEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	525,29	525,29	0,00	R\$ 0,00
5.1.26	PMFI-178	PMFI	CAIXA NS PARA DISJUNTOR 400A COM BARRAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	2909,49	2909,49	0,00	R\$ 0,00

RESPONSÁVEL TÉCNICO:		GOR DE SOUZAMORAES		DATA ORDEM SERVIÇO		06/03/2023		Custo do Iguaçu		Construindo uma nova cidade		
FISCAL		BRUNA ANDRADE PARCIANELLO CAMPOS		VIGÊNCIA CONTRATUAL:		210 dias (23/08/2023)		PRAZO EXECUÇÃO:		150 dias (03/08/2023)		
PERÍODO MEDIDO :		1ª MEDIDA - 06/03/2023 a 12/06/2023		PRAZO EXECUÇÃO:		Data: 12/06/2023		1ª MEDIDA		Data: 12/06/2023		
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO DO ITEM (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	A MEDIR	A PAGAR	QUANT	CUSTO (R\$)
5.1.27	PMFI	PMFI-180	CAIXA EN PADRÃO COPEL (PARA 2 MEDIODORES) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	531,29	531,29		0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 531,29
5.1.28	PMFI	181	CAIXA EN PADRÃO COPEL (57 X 75 X 26 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	629,19	629,19		0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 629,19
5.1.29	PMFI	912	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 300A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.(BASEADO SINAPI 101898)	UN	1,00	1.646,71	1.646,71		0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 1.646,71
5.1.31	SINAPI	92992	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	140,00	96,72	13.540,80		0,00	R\$ 0,00	140,00	R\$ 13.540,80
5.1.32	PMFI	PMFI-1285	EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO, E PEDIDO DE LIGAÇÃO DE ENERGIA NA CONCESSIONÁRIA	UN	1,00	1000,00	1.000,00		0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 1.000,00
5.2	ATERRAMENTO						595,39	0,00%				R\$ 595,39
5.2.1	SINAPI	96979	CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM ² , ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	3,00	109,59	328,77		0,00	R\$ 0,00	3,00	R\$ 328,77
5.2.2	SINAPI	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,00	25,78	77,34		0,00	R\$ 0,00	3,00	R\$ 77,34
5.2.3	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	45,96	45,96		0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 45,96
5.2.4	PMFI	PMFI-1115	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COM CONECTOR (BASEADO SINAPI 96986)	UN	1,00	143,32	143,32		0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 143,32
5.3	ADEAQUAÇÃO QUADROS/INTERNO'S						4.290,19	43,37%				R\$ 4.290,19
5.3.4	SINAPI	97670	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	10,00	23,44	234,40		0,00	R\$ 0,00	10,00	R\$ 234,40
5.3.5	SINAPI	93358	ESCAVACÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	M3	0,90	93,79	84,41		0,00	R\$ 0,00	0,90	R\$ 84,41
5.3.6	SINAPI	101618	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL.AF_08/2020	M3	0,15	230,00	34,50		0,00	R\$ 0,00	0,15	R\$ 34,50
5.3.7	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILADO COM SOquete AF_10/2017	M3	0,74	56,87	42,25		0,00	R\$ 0,00	0,74	R\$ 42,25
5.3.8	SINAPI	90446	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAiores QUE 75 MM. AF_05/2015	M	2,00	35,54	71,08		0,00	R\$ 0,00	2,00	R\$ 71,08
5.3.9	SINAPI	90470	CHUMBARMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAiores QUE 75 MM. AF_05/2015	M	2,00	14,17	28,34		0,00	R\$ 0,00	2,00	R\$ 28,34
5.3.10	SINAPI	92992	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	20,00	96,72	1.934,40		0,00	R\$ 0,00	20,00	R\$ 1.934,40
			TOTAL				293.932,49	R\$ 0,00				R\$ 183.075,90
			BDI 20,56%									R\$ 37.640,40
			TOTAL GERAL COM BDI				354.364,96	R\$ 0,00				R\$ 220.716,30
												exec: 62,29%

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar> e utilize o código 89b225d7-fbf9-454f-a2e1-867e0555d473.



NOTIFICAÇÃO

CONTRATO:	024/2023	TOMADA DE PREÇO:	013/2022
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AUMENTO DE CARGA DO PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES ESCOLARES	VALOR:	R\$ 354.364,96
ENDEREÇOS:	Escola Municipal Altair Ferraz Zizo – Avenida Andradina, 2290 – Jardim pê, CEP 85869-536; Escola Municipal Antônio Gonçalves Dias – Rua Purus, 234 – Campos do Iguaçu, CEP 85857-130; Escola Municipal Monteiro Lobato – Rua Angela Aparecida Andrade, 145 – Foz do Iguaçu Parte II, CEP 85867-500; Escola Municipal Professora Elenice Milhorança – Rua Di Cavalcanti, 523 – Jardim América, CEP 85864-290.	DATA DO CONTRATO: O.S:	25/01/2023 04/2023 (06/03/2023)
MUNICÍPIO:	Foz do Iguaçu - PR	PRAZO EXECUÇÃO:	150 dias (03/08/2023)
CONTRATADA:	VOUGUE FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	VIGÊNCIA CONTR:	210 dias (23/08/2023)
RESP. TÉC.:	Igor de Souza Moraes	FISCAL DE CAMPO:	Engª Bruna A. P. Campos

Segue relatório fotográfico referente aos serviços executados do contrato supracitado.

O valor total da 1ª medição é R\$ 220.716,30, conforme planilha anexa, o que corresponde a uma execução de aproximadamente 62,29% dos serviços previstos no contrato. Os itens 2.1.29 e 2.1.33 destacados em vermelho foram suprimidos conforme o 1º Termo aditivo ao contrato nº 24/2023.

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO DO ITEM (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	SALDO		MEDIÇÃO UNICA	
									A MEDIR	A PAGAR	QUANT	CUSTO (R\$)
1			SERVIÇOS INICIAIS					12.430,00	52,05%		48%	R\$ 5.960,00
1.2	PMFI-1288	PMFI-	REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE ITENS DIVERSOS - ESTIMADO POR HORA DE SERVIÇO	H	8,00	55,00	440,00		0,00	R\$ 0,00	8,00	R\$ 440,00
1.2	PMFI-115	PMFI-	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TAPUME COM TELA PLÁSTICA LARANJA, COM 1,20 M DE ALTURA, PARA ISOLAMENTO DE OBRAS OU EM VALAS, 2 UTILIZAÇÕES	M	60,00	12,00	720,00		0,00	R\$ 0,00	60,00	R\$ 720,00
1.3	PMFI-1313	PMFI-	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - GERENCIAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRA - (ENGENHEIRO CIVIL 10H X MÊS) + (ENCARREGADO GERAL 75H X MÊS)	%	100,00	80,00	8.000,00		40,00	R\$ 3.200,00	60,00	R\$ 4.800,00




PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU – PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SMOB
DIRETORIA DE OBRAS – DIOB



ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO DO ITEN (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	BALDO		QUANT	CUSTO (R\$)
									A MEDR	A PAGAR		
2			ALTAIR FERREIRA ZIZO - 400A					R\$ 99.704,09	84,58%		15%	R\$ 15.391,84
2.1			ENTRADA DE ENERGIA					36.427,15	59,51%		40,49%	R\$ 14.750,49
2.1.1	PMFI-1015	PMFI-	MURETA EM ALVENARIA PARA ENTRADA DE ENERGIA 3,5M X 2,00M x 0,20M, INCLUI ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO: ESTACAS ARMADAS (H=2M), VIGA BALDRAMA 14X30CM, PILARETES 20X20CM E VIGA CINTA, COBERTURA EM TELHAMENTO CERÂMICO - EXCLUSIVO ACABAMENTOS	UN	1,00	2000,00	2.000,00		0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 2.000,00
2.1.2	SINAPI-87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇÃO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF 06/2014	M2	7,00	4,32	30,24		0,00	R\$ 0,00	7,00	R\$ 30,24
2.1.3	SINAPI-87529	SINAPI	MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇÃO 1:2,8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCA, AF 06/2014	M2	7,00	35,89	251,23		0,00	R\$ 0,00	7,00	R\$ 251,23
2.1.4	SINAPI-88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍUCO EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF 06/2014	M2	7,00	3,15	22,05		0,00	R\$ 0,00	7,00	R\$ 22,05
2.1.5	SINAPI-88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF 06/2014	M2	7,00	16,39	114,73		0,00	R\$ 0,00	7,00	R\$ 114,73
2.1.6	PMFI-1023	PMFI-	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, 4" APARENTE, INSTALADO EM PAREDE (OU POSTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BASEADO SINAPI 97575)	M	6,00	267,07	1.602,42		0,00	R\$ 0,00	6,00	R\$ 1.602,42
2.1.7	PMFI-1024	PMFI-	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO 4", PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BASEADO SINAPI 93026)	UN	1,00	226,05	226,05		0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 226,05
2.1.8	PMFI-1022	PMFI-	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUJOSOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO EM CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M, COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO 60X60 E SUBTAMPA PADRÃO COPEL (BASEADO SINAPI 97829)	UN	1,00	750,00	750,00		0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 750,00
2.1.9	PMFI-906	PMFI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, DN 100 MM (4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BASEADO SINAPI 91856)	M	15,00	21,94	328,10		0,00	R\$ 0,00	15,00	R\$ 329,10
2.1.10	SINAPI-93358	SINAPI	ESCAVACÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF 02/2021	M3	1,35	93,79	126,62		0,00	R\$ 0,00	1,35	R\$ 126,62
2.1.11	SINAPI-101518	SINAPI	PREPÁRIO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL AF 08/2020	M3	0,23	230,00	51,75		0,00	R\$ 0,00	0,23	R\$ 51,75
2.1.12	SINAPI-90995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE, AF 10/2017	M3	1,11	56,87	63,38		0,00	R\$ 0,00	1,11	R\$ 63,38
2.1.13	PMFI-543	PMFI	RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE BLOCO INTERTRAVADO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE PAVER - INCLUSIVE BERÇO, REUNIMENTO E COMPACTAÇÃO	M2	7,50	27,77	208,28		0,00	R\$ 0,00	7,50	R\$ 208,28
2.1.14	SINAPI-93026	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	UN	2,00	109,78	219,56		0,00	R\$ 0,00	2,00	R\$ 219,56
2.1.15	PMFI-907	PMFI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 100 MM (4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BASEADO SINAPI 91873)	M	5,00	81,04	405,20		0,00	R\$ 0,00	5,00	R\$ 405,20
2.1.16	SINAPI-91873	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	2,00	25,78	51,56		0,00	R\$ 0,00	2,00	R\$ 51,56
2.1.17	SINAPI-91920	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	2,00	25,00	50,00		0,00	R\$ 0,00	2,00	R\$ 50,00
2.1.18	SINAPI-I-1590	SINAPI-I	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 95 MM2, COM 1 FURU DE FIXACAO	UN	25,00	15,43	385,75		0,00	R\$ 0,00	25,00	R\$ 385,75
2.1.19	SINAPI-I-39211	SINAPI-I	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	UN	4,00	1,73	6,92		0,00	R\$ 0,00	4,00	R\$ 6,92
2.1.20	SINAPI-I-39212	SINAPI-I	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4", PARA ELETRODUTO	UN	12,00	9,07	108,84		0,00	R\$ 0,00	12,00	R\$ 108,84
2.1.21	SINAPI-I-39177	SINAPI-I	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	UN	4,00	1,98	7,92		0,00	R\$ 0,00	4,00	R\$ 7,92
2.1.22	SINAPI-I-39182	SINAPI-I	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4", PARA ELETRODUTO	UN	12,00	11,22	134,64		0,00	R\$ 0,00	12,00	R\$ 134,64
2.1.23	SINAPI-91886	SINAPI	LUVIA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	4,00	15,82	63,28		0,00	R\$ 0,00	4,00	R\$ 63,28
2.1.24	SINAPI-I-425	SINAPI-I	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CONDUTOR DE 10" A 50 MM2	UN	1,00	8,74	8,74		0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 8,74
2.1.25	PMFI-177	PMFI	CAIXA BEP 30 X 30 X 20 CM, BARRAMENTO 210A, 3/4" X 3/16" - PADRÃO COPEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	525,29	525,29		0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 525,29
2.1.26	PMFI-178	PMFI	CAIXA NS PARA DISJUNTOR 400A COM BARRAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	2509,49	2509,49		0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 2.509,49
2.1.27	PMFI-180	PMFI	CAIXA EN PADRÃO COPEL (PARA 2 MEDIDORES) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	531,29	531,29		0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 531,29
2.1.28	PMFI-181	PMFI	CAIXA FN PADRÃO COPEL (57 X 75 X 26 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	625,19	625,19		0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 629,19
2.1.29	PMFI-179	PMFI	CAIXA CN PADRÃO COPEL (45 X 35 X 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	234,06	234,06		1,00	R\$ 234,06	0,00	R\$ 0,00
2.1.30	PMFI-1280	PMFI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 (BASEADO SINAPI 101878)	UN	1,00	936,98	936,98		0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 936,98
2.1.31	SINAPI-101894	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	166,37	166,37		1,00	R\$ 166,37	0,00	R\$ 0,00
2.1.32	PMFI-1285	PMFI	EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO, E PEDIDO DE LIGAÇÃO DE ENERGIA NA CONCESSIONÁRIA	UN	1,00	2000,00	2.000,00		641,35	0,00%	100,00%	R\$ 641,35
2.2			ATERRAMENTO									
2.2.1	SINAPI-96979	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	M	3,00	109,59	328,77		0,00	R\$ 0,00	3,00	R\$ 328,77
2.2.2	SINAPI-91873	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	3,00	25,78	77,34		0,00	R\$ 0,00	3,00	R\$ 77,34
2.2.3	SINAPI-98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020	UN	2,00	45,96	91,92		0,00	R\$ 0,00	2,00	R\$ 91,92
2.2.4	PMFI-1115	PMFI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COM CONECTOR (BASEADO SINAPI 96986)	UN	1,00	143,32	143,32		0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 143,32




PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU – PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SMOB
DIRETORIA DE OBRAS – DIOB

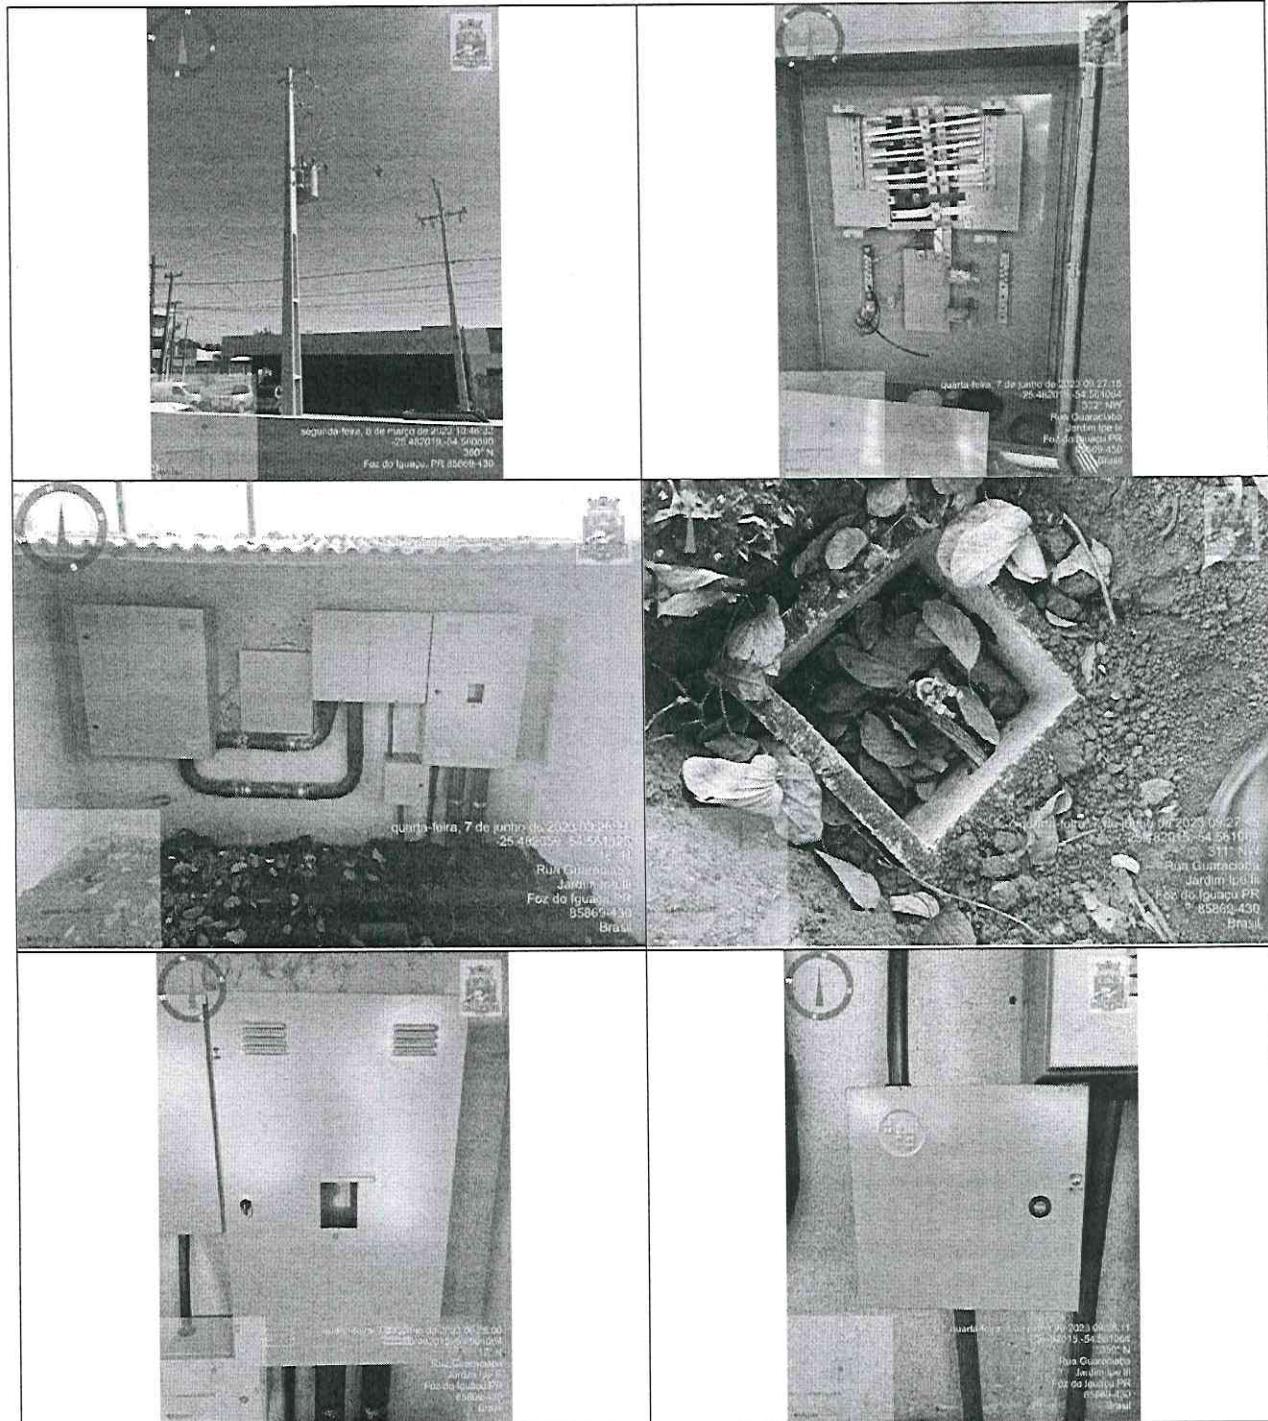



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU – PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SMOB
DIRETORIA DE OBRAS – DIOB

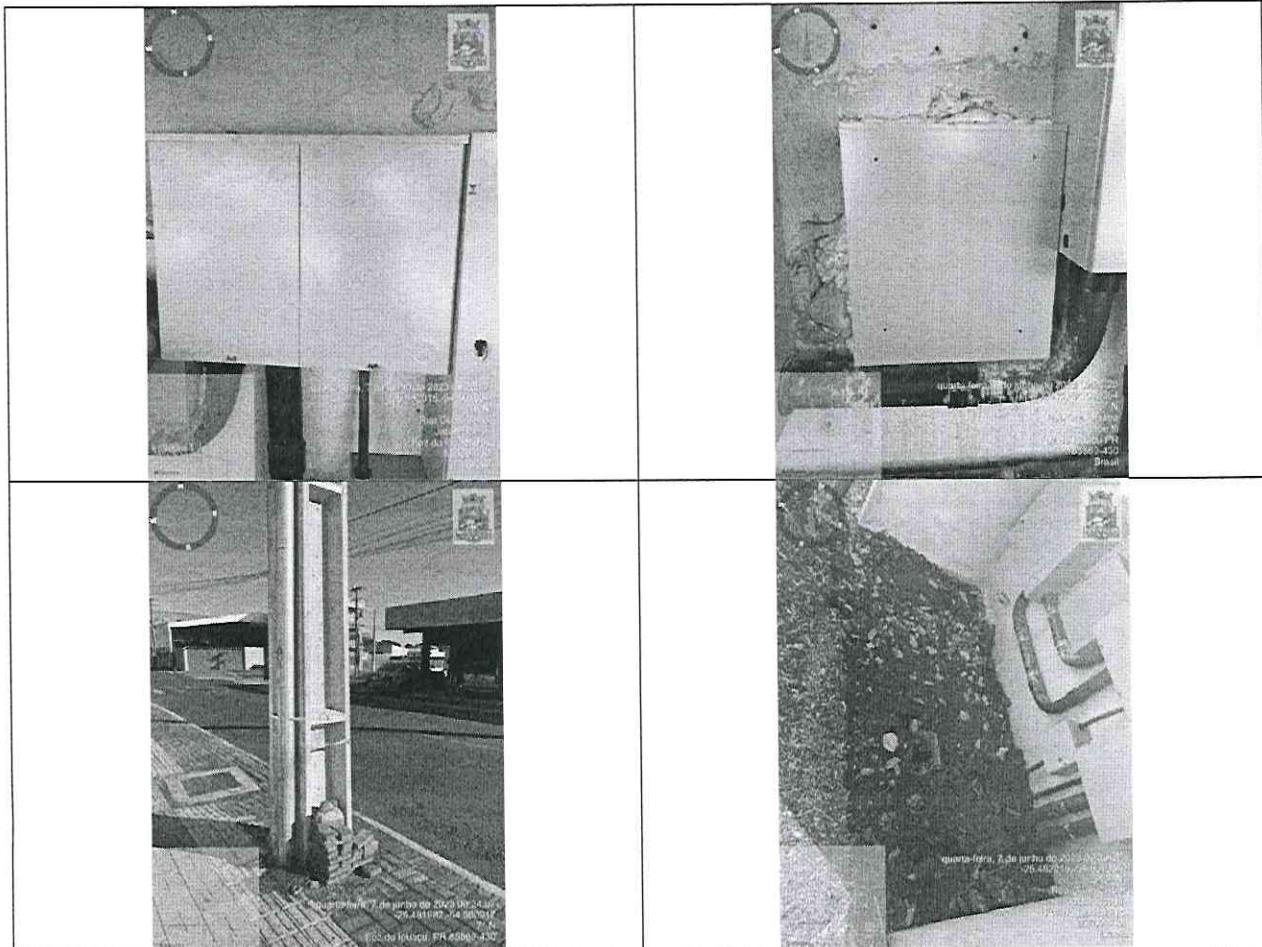

Este documento foi assinado eletronicamente por **DIRceu Andrade Parcianello Campos**.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sistemas.pmfj.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar> e utilize o código **25009633-36a8-4267-9645-021624372525**.

Este documento foi assinado eletronicamente por **Vários Signatários**.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sistemas.pmfj.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar> e utilize o código **89b225d7-fbf9-454f-a2e1-867e0555d473**.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU – PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SMOB
DIRETORIA DE OBRAS – DIOB



ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	PONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO DO ITEM (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	SALDO		1ª MEDICAO	
									A MEDIR	A PAGAR	QUANT	CUSTO (R\$)
3			ANTONIO GONÇALVES - 300A					RS 94.219,28	4,77%		85%	RS 89.726,57
3.1			ADAPTAÇÃO DO PLAYGROUND					915,69	0,00%		100,00%	RS 915,69
3.1.1	PMFI-1288	PMFI	REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE ITENS DIVERSOS - ESTIMADO POR HORA DE SERVICO	H	8,00	55,93	447,44		0,00	R\$ 0,00	8,00	RS 447,44
3.1.2	PMFI-543	PMFI	RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE BLOCO INTERTRAVADO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE PAVER - INCLUSIVE BERÇO, REJUNTAMENTO E COMPACTAÇÃO	M2	15,00	27,77	416,55		0,00	R\$ 0,00	15,00	RS 416,55
3.1.3	PMFI-481	PMFI	ACERTO DO SOLO NATURAL COM REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO	M2	15,00	3,46	51,90		0,00	R\$ 0,00	15,00	RS 51,90
3.2			ENTRADA DE ENERGIA					29.835,60	0,83%		99,17%	RS 29.399,11
3.2.1	PMFI-1025	PMFI	MURETA EM ALVENARIA PARA ENTRADA DE ENERGIA 3,5M X 2,00M x 0,20M, INCLUI ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO: ESTACAS ARMADAS (H=2M), VIGA BALDRAME 24X30CM, PILARETES 20X20CM E VIGA CINTA. COBERTURA EM TELHARME CERÂMICO - EXCLUSIVE ACABAMENTOS	UN	1,00	2000,00	2.000,00		0,00	R\$ 0,00	1,00	RS 2.000,00
3.2.2	SINAPI-87879	SINAPI	CHAPISCO APUCADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇÃO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014	M2	7,00	4,32	30,24		0,00	R\$ 0,00	7,00	RS 30,24
3.2.3	SINAPI-87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇÃO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APUCADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAIS. AF_06/2014	M2	7,00	35,89	251,23		0,00	R\$ 0,00	7,00	RS 251,23
3.2.4	SINAPI-88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	7,00	3,15	22,05		0,00	R\$ 0,00	7,00	RS 22,05
3.2.5	SINAPI-88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	7,00	16,39	114,73		0,00	R\$ 0,00	7,00	RS 114,73
3.2.6	PMFI-1023	PMFI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, 4" APARENTE, INSTALADO EM PAREDE (OU POSTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BASEADO SINAPI 95752)	M	6,00	267,07	1.602,42		0,00	R\$ 0,00	6,00	RS 1.602,42
3.2.7	PMFI-1024	PMFI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO 4", PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BASEADO SINAPI 93026)	UN	1,00	226,05	226,05		0,00	R\$ 0,00	1,00	RS 226,05
3.2.8	PMFI-1022	PMFI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDIDO EM CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,80X0,80X0,6 M. COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO 60X60 E SUSTAMPA PADRÃO COPEL (BASEADO SINAPI 97889)	UN	1,00	750,00	750,00		0,00	R\$ 0,00	1,00	RS 750,00
3.2.9	906		ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, DN 100 MM (4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BASEADO SINAPI 91856)	M	12,00	21,94	263,28		0,00	R\$ 0,00	12,00	RS 263,28
3.2.10	SINAPI-93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUALA 1,30 M. AF_02/2021	M3	1,08	93,79	101,29		0,00	R\$ 0,00	1,08	RS 101,29
3.2.11	SINAPI-101618	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	M3	0,18	230,00	41,40		0,00	R\$ 0,00	0,18	RS 41,40
3.2.12	SINAPI-96995	SINAPI	REATORIO MANUAL APILOADO COM SODUOTE. AF_10/2017	M3	0,89	56,87	50,71		0,00	R\$ 0,00	0,89	RS 50,71
3.2.13	PMFI-543	PMFI	RETRADA E REINSTALAÇÃO DE BLOCO INTERTRAVADO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE PAVER - INCLUSIVE BERÇO, REJUNTAMENTO E COMPACTAÇÃO	M2	7,50	27,77	208,28		0,00	R\$ 0,00	7,50	RS 208,28
3.2.14	SINAPI-93026	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	2,00	109,78	219,56		0,00	R\$ 0,00	2,00	RS 219,56
3.2.15	SINAPI-91873	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,00	25,78	51,56		0,00	R\$ 0,00	2,00	RS 51,56
3.2.16	PMFI-907	PMFI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC, DN 100 MM (4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BASEADO SINAPI 91873)	M	5,00	81,04	405,20		0,00	R\$ 0,00	5,00	RS 405,20
3.2.17	SINAPI-91920	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	25,00	50,00		0,00	R\$ 0,00	2,00	RS 50,00
3.2.18	SINAPI-I-159	SINAPI-I	TERMINAL METÁLICO A PRESSÃO PARA 1 CABO DE 95 MM ² , COM 1 FURADO DE FIXAÇÃO	UN	25,00	15,43	386,75		0,00	R\$ 0,00	25,00	RS 386,75
3.2.19	SINAPI-I-39211	SINAPI-I	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	UN	4,00	1,73	6,92		0,00	R\$ 0,00	4,00	RS 6,92
3.2.20	SINAPI-I-39216	SINAPI-I	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4", PARA ELETRODUTO	UN	12,00	9,07	108,84		0,00	R\$ 0,00	12,00	RS 108,84
3.2.21	SINAPI-I-39177	SINAPI-I	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	UN	4,00	1,98	7,92		0,00	R\$ 0,00	4,00	RS 7,92
3.2.22	SINAPI-I-39182	SINAPI-I	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4", PARA ELETRODUTO	UN	12,00	11,22	134,64		0,00	R\$ 0,00	12,00	RS 134,64
3.2.23	SINAPI-91886	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	15,82	63,28		0,00	R\$ 0,00	4,00	RS 63,28
3.2.24	SINAPI-I-425	SINAPI-I	GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CONDUTOR DE 10 ³ A 50 MM ²	UN	1,00	8,74	8,74		0,00	R\$ 0,00	1,00	RS 8,74
3.2.25	PMFI-177	PMFI	CAIXA BEP 30 X 30 X 20 CM, BARRAMENTO 210A, 3/4" X 3/16" - PADRÃO COPEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	525,29	525,29		0,00	R\$ 0,00	1,00	RS 525,29
3.2.26	PMFI-178	PMFI	CAIXA NS PARA DISJUNTOR 400A COM BARRAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	2909,49	2909,49		0,00	R\$ 0,00	1,00	RS 2.909,49
3.2.27	PMFI-180	PMFI	CAIXA EN PADRÃO COPEL (PARA 2 MEDIDORES) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	531,29	531,29		0,00	R\$ 0,00	1,00	RS 531,29
3.2.28	PMFI-181	PMFI	CAIXA EN PADRÃO COPEL (57X75X26 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	629,19	629,19		0,00	R\$ 0,00	1,00	RS 629,19
3.2.29	PMFI-1279	PMFI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 300A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020. (BASEADO SINAPI 101878)	UN	1,00	876,23	876,23		0,00	R\$ 0,00	1,00	RS 876,23
3.2.30	912	PMFI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRÍPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 300A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BASEADO SINAPI 101898)	UN	2,00	950,00	1.900,00		0,00	R\$ 0,00	2,00	RS 1.900,00
3.2.31	SINAPI-101894	SINAPI	DISJUNTOR TRÍPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 AT 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	186,37	372,74		0,00	R\$ 0,00	2,00	RS 372,74
3.2.32	SINAPI-92952	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	140,00	96,72	13.540,80		0,00	R\$ 0,00	140,00	RS 13.540,80
3.2.33	PMFI-1285	PMFI	EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO, E PEDIDO DE LIGAÇÃO DE ENERGIA NA CONCESSIONARIA	UN	1,00	1000,00	1.000,00		0,00	R\$ 0,00	1,00	RS 1.000,00
3.3			ATERRAMENTO					641,38	0,00%		100,00%	RS 641,38
3.3.1	SINAPI-96979	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM ² , ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	3,00	109,59	328,77		0,00	R\$ 0,00	3,00	RS 328,77
3.3.2	SINAPI-91873	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,00	25,78	77,34		0,00	R\$ 0,00	3,00	RS 77,34
3.3.3	SINAPI-98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	2,00	45,96	91,92		0,00	R\$ 0,00	2,00	RS 91,92
3.3.4	PMFI-1115	PMFI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COM CONECTOR (BASEADO SINAPI 96986)	UN	1,00	143,32	143,32		0,00	R\$ 0,00	1,00	RS 143,32

Este documento foi assinado eletronicamente por BERNARDO ANDRADE PARCIANELLO CAMPOS.


Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sistemas.pmfipr.gov.br/rp/sidpublico/verificar> e utilize o código 2B009657-36a5-4287-9868-00b12D453273.

Este documento foi assinado eletronicamente por Vânia Signatário.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sistemas.pmfipr.gov.br/rp/sidpublico/verificar> e utilize o código 89b225d7-fbf9-454f-a2e1-867e0555d473.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU – PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SMOB
DIRETORIA DE OBRAS – DIOB

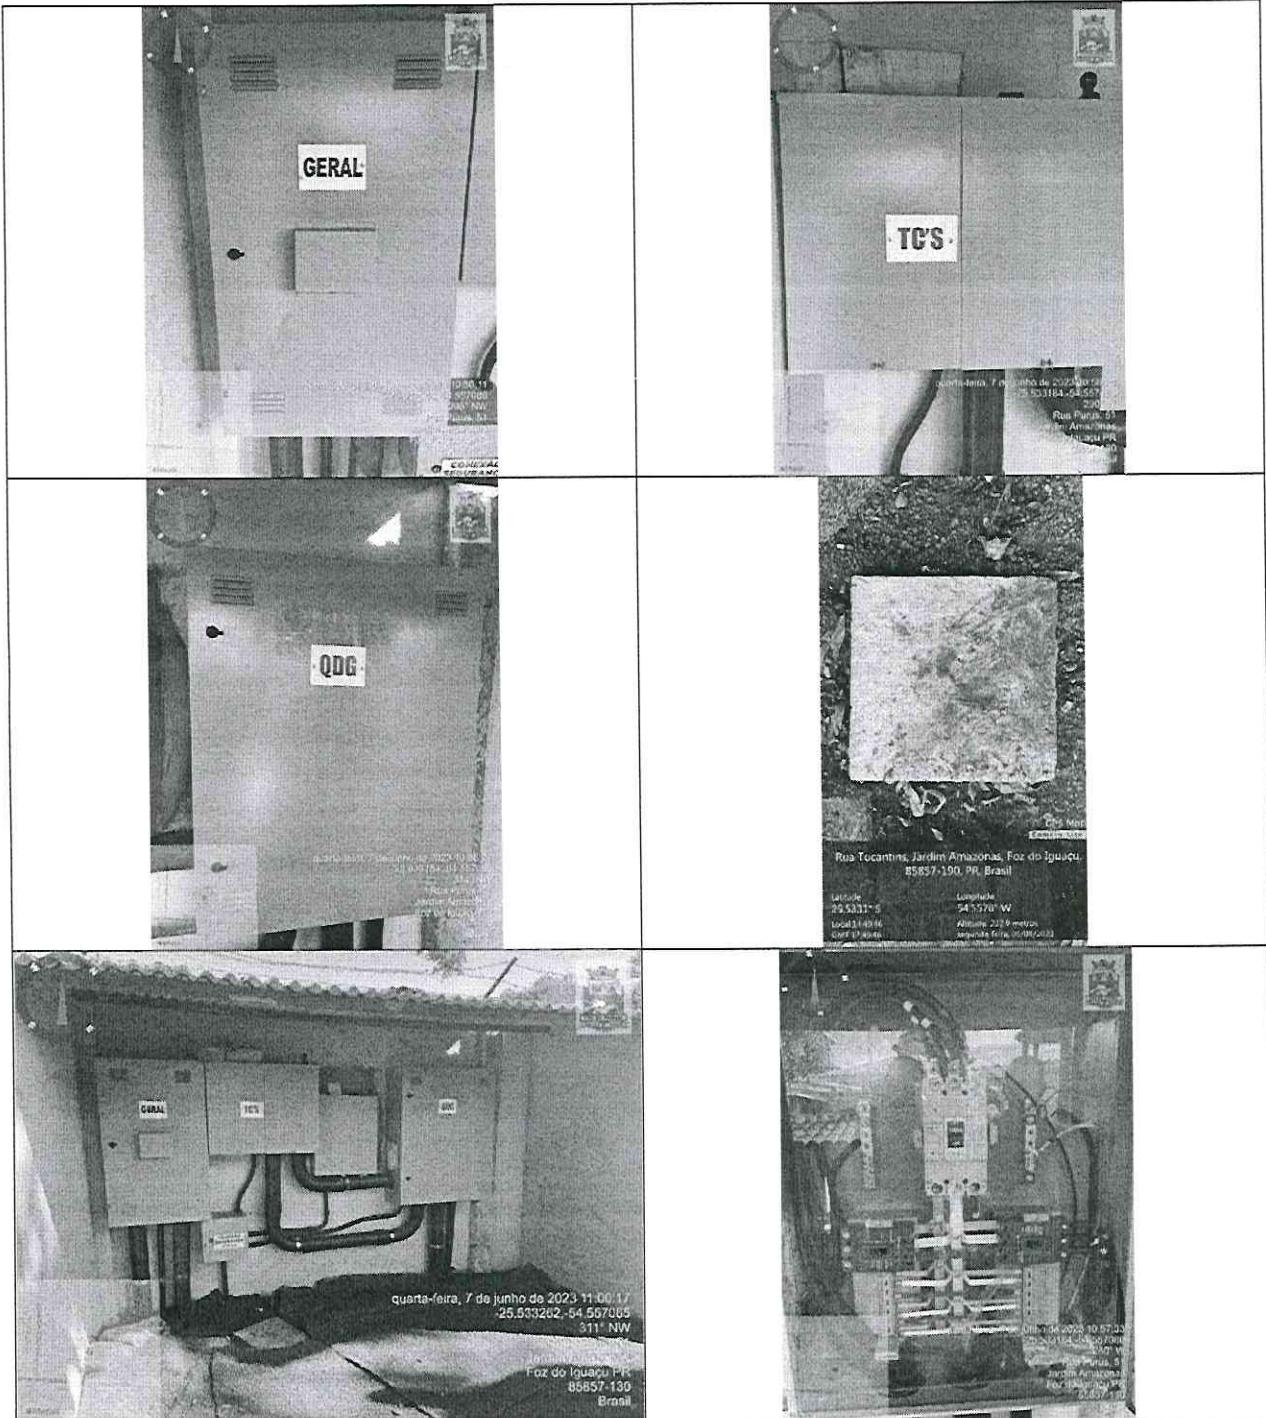

Este documento foi assinado eletronicamente por **DIRIBELA ANDRADE PARCIANELLO CAMPOS**.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sistemas.pmfj.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar> e utilize o código 20009883-36e0-4267-9683-861121a60725.


Este documento foi assinado eletronicamente por Vários Signatários.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sistemas.pmfj.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar> e utilize o código 89b225d7-fbf9-454f-a2e1-867e0555d473.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU – PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SMOB
DIRETORIA DE OBRAS – DIOB

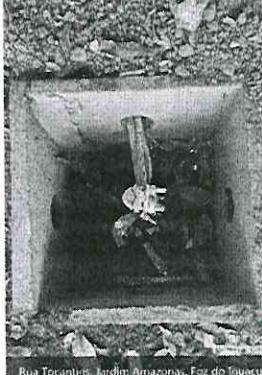

 <p>Rua Tocantins, Jardim Amazonas, Foz do Iguaçu, 85857-130, PR, Brasil</p> <p>Latitude: 25.53134° S Longitude: 54.5570° W Altitude: 223.0 metros segundo lev.p. 05/06/2023</p>	 <p>Rua Tocantins, Jardim Amazonas, Foz do Iguaçu, 85857-130, PR, Brasil</p> <p>Latitude: 25.53132° S Longitude: 54.5570° W Altitude: 223.0 metros segundo lev.p. 05/06/2023</p>
 <p>Rua Purus, Jardim Amazonas, Foz do Iguaçu, 85857-130, PR, Brasil</p> <p>Latitude: 25.5334° S Longitude: 54.5572° W Altitude: 223.1 metros Data hora: 01/07/2023</p>	 <p>Rua Tocantins, Jardim Amazonas, Foz do Iguaçu, 85857-130, PR, Brasil</p> <p>Latitude: 25.5332° S Longitude: 54.5570° W Altitude: 223.1 metros Data hora: 01/07/2023</p>
 <p>A junho de 2023 11:00:23 25.533262 -54.557065 41° N Rua Purus, 51 Jardim Amazonas Foz do Iguaçu - PR Brasil</p>	 <p>7 de junho de 2023 11:00:53 25.533269 -54.557065 41° N Rua Purus, 51 Jardim Amazonas Foz do Iguaçu - PR Brasil</p>

Este documento foi assinado eletronicamente por BRIDIBAI ANDRADE PARCIANELLO CAMPOS.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar> e utilize o código 80899857-36e8-4257-9683-82b62070320d.




Este documento foi assinado eletronicamente por Vânia Signatário.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar> e utilize o código 89b225d7-fbf9-454f-a2e1-867e0555d473.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU – PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SMOB
DIRETORIA DE OBRAS – DIOB

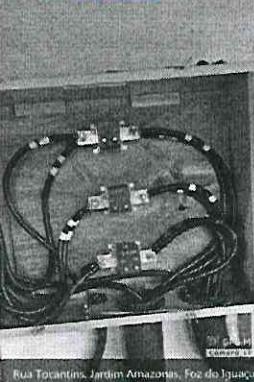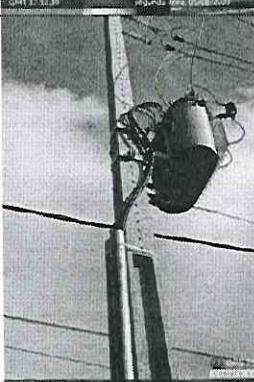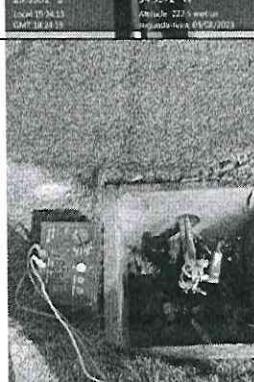

		
<p>Rua Tocantins, Jardim Amazonas, Foz do Iguaçu, 85857-130, PR, Brasil</p> <p>Latitude: 25.5332° S Longitude: 54.5570° W Altitude: 224 metros Data da foto: 09/08/2013</p>		<p>Rua Purus, Jardim Amazonas, Foz do Iguaçu, 85857-130, PR, Brasil</p> <p>Latitude: 25.5332° S Longitude: 54.5570° W Altitude: 223 metros Data da foto: 09/08/2013</p>
		
<p>Rua Purus, Jardim Amazonas, Foz do Iguaçu, 85857-130, PR, Brasil</p> <p>Latitude: 25.5332° S Longitude: 54.5570° W Altitude: 223 metros Data da foto: 09/08/2013</p>		<p>Rua Purus, Jardim Amazonas, Foz do Iguaçu, 85857-130, PR, Brasil</p> <p>Latitude: 25.5332° S Longitude: 54.5570° W Altitude: 222 metros Data da foto: 09/08/2013</p>
		
<p>Rua Tocantins, Jardim Amazonas, Foz do Iguaçu, 85857-130, PR, Brasil</p> <p>Latitude: 25.5332° S Longitude: 54.5570° W Altitude: 222 metros Data da foto: 09/08/2013</p>		<p>Rua Purus, Jardim Amazonas, Foz do Iguaçu, 85857-130, PR, Brasil</p> <p>Latitude: 25.5332° S Longitude: 54.5570° W Altitude: 222 metros Data da foto: 09/08/2013</p>

Este documento foi assinado eletronicamente por BRIDGIA ANDRADE PARCIANELLO CAMPOS.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sistemas.pmfj.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar> e utilize o código 20099657-26e8-4267-9865-021427a022d2.


Este documento foi assinado eletronicamente por Vânia Signatário.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sistemas.pmfj.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar> e utilize o código 89b225d7-fbf9-454f-a2e1-867e0555d473.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU – PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SMOB
DIRETORIA DE OBRAS – DIOB

Foz
108
6

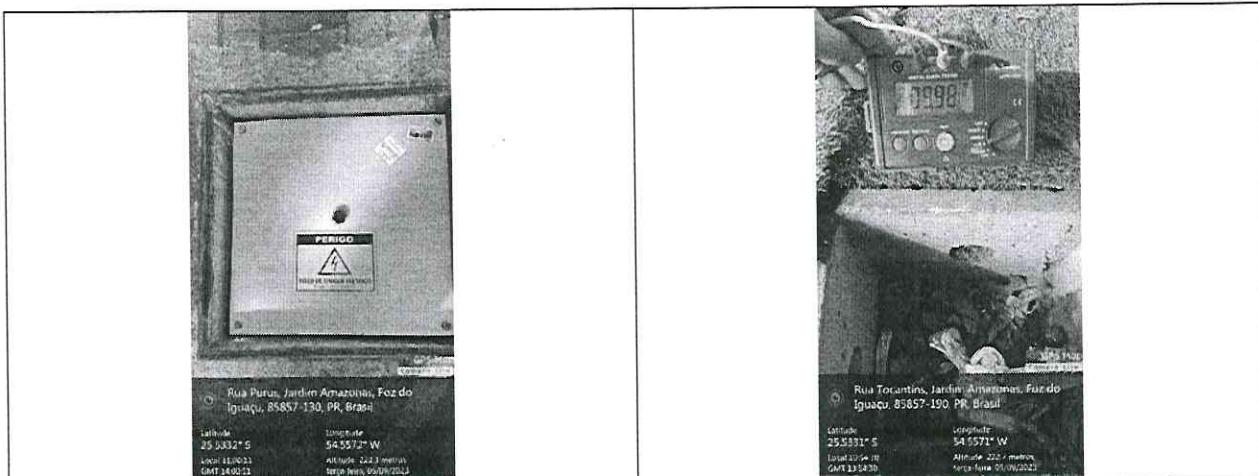

Este documento foi assinado eletronicamente por ~~DIRETORIA DE OBRAS - DIOB~~ PARCIANELLO CAMPOS.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sistemas.pmfipr.gov.br/rp/sidpublico/verificar> e utilize o código 20009657-36a8-4257-9685-62b12d020220.

Este documento foi assinado eletronicamente por Vários signatários.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sistemas.pmfipr.gov.br/rp/sidpublico/verificar> e utilize o código 89b225d7-fbf9-454f-a2e1-867e0555d473.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU – PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SMOB
DIRETORIA DE OBRAS – DIOB**



ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO DO ITEM (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	SALDO		1ª EDIÇÃO	
									A MEDR	A PAGAR	QUANT	CUSTO (R\$)
3			ANTONIO GONÇALVES - 300A					R\$ 94.219,28	4,77%	95%		R\$ 89.726,57
3.5			ADÉQUAÇÃO QUADROS INTERNOS					R\$ 60.890,42	3,00%	97,00%		R\$ 58.780,22
3.5.1			QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO					3.855,07	0,00%	100,00%		R\$ 3.855,07
3.5.1.1	SINAPI	90458	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (78X40 CM). AF_05/2015	UN	4,00	25,00	100,00		0,00	R\$ 0,00	4,00	R\$ 100,00
3.5.1.2	SINAPI	101882	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	1.718,15	1.718,15		0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 1.718,15
3.5.1.3	SINAPI	101880	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	838,96	838,96		0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 838,96
3.5.1.4	SINAPI	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	694,99	694,99		0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 694,99
3.5.1.5	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	502,97	502,97		0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 502,97
3.5.2			DISJUNTORES					5.088,72	25,11%	74,89%		R\$ 3.809,52
3.5.2.1	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	13,86	27,72		0,00	R\$ 0,00	2,00	R\$ 27,72
3.5.2.2	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	23,00	14,57	335,11		0,00	R\$ 0,00	23,00	R\$ 335,11
3.5.2.3	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20,00	15,90	318,00		0,00	R\$ 0,00	20,00	R\$ 318,00
3.5.2.4	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	15,90	15,90		0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 15,90
3.5.2.5	SINAPI	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00	17,53	140,24		0,00	R\$ 0,00	8,00	R\$ 140,24
3.5.2.6	SINAPI	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	25,45	76,35		0,00	R\$ 0,00	3,00	R\$ 76,35
3.5.2.7	SINAPI	93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	28,80	86,40		0,00	R\$ 0,00	3,00	R\$ 86,40
3.5.2.8	SINAPI	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	72,77	145,54		0,00	R\$ 0,00	2,00	R\$ 145,54
3.5.2.9	SINAPI	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	76,04	304,16		0,00	R\$ 0,00	4,00	R\$ 304,16
3.5.2.10	SINAPI	93665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	80,32	80,32		0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 80,32
3.5.2.11	SINAPI	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	114,69	688,14		0,00	R\$ 0,00	6,00	R\$ 688,14
3.5.2.12	SINAPI	101895	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	510,21	1.020,42		1,00	R\$ 510,21	1,00	R\$ 510,21
3.5.2.13	SINAPI	101896	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	766,99	1.533,98		1,00	R\$ 766,99	1,00	R\$ 766,99
3.5.2.14	PMFI	PMFI-121	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNI	2,00	157,22	314,44		0,00	R\$ 0,00	2,00	R\$ 314,44
3.5.3			ELETRODUTOS					5.443,10	0,00%	100,00%		R\$ 5.443,10
3.5.3.1	PMFI	771	CORTE RASO E REMOÇÃO DE RAÍZES DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M	UN	1,00	38,96	38,96		0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 38,96
3.5.3.2	PMFI	PMFI-303	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS SIMPLES DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE COM REAPROVEITAMENTO.	M3	1,00	138,98	138,98		0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 138,98
3.5.3.3	SINAPI	97670	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA, DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	28,36	23,44	664,76		0,00	R\$ 0,00	28,36	R\$ 664,76
3.5.3.4	PMFI	PMFI-1293	REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA	M2	7,09	19,93	141,30		0,00	R\$ 0,00	7,09	R\$ 141,30
3.5.3.5	PMFI	PMFI-543	RETRÍADA E REINSTALAÇÃO DE BLOCO INTERTRAVADO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE PAVER - INCLUSIVE BERÇO, REJUNTAMENTO E COMPACTAÇÃO	M2	7,09	27,77	196,89		0,00	R\$ 0,00	7,09	R\$ 196,89
3.5.3.6	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	4,25	24,92	106,01		0,00	R\$ 0,00	4,25	R\$ 106,01
3.5.3.7	SINAPI	90446	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAiores QUE 75MM. AF_05/2015	M	14,18	35,54	503,96		0,00	R\$ 0,00	14,18	R\$ 503,96
3.5.3.8	SINAPI	90470	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAiores QUE 75 MM. AF_05/2015	M	14,18	14,17	200,93		0,00	R\$ 0,00	14,18	R\$ 200,93
3.5.3.9	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	1,28	93,79	119,69		0,00	R\$ 0,00	1,28	R\$ 119,69
3.5.3.10	SINAPI	101618	PREPARE DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	M3	0,21	230,00	48,92		0,00	R\$ 0,00	0,21	R\$ 48,92
3.5.3.11	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	1,16	56,87	66,25		0,00	R\$ 0,00	1,16	R\$ 66,25
3.5.3.12	PMFI	908	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, DN 63 MM (2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASEADO SINAPI 91836)	M	84,22	15,62	1.315,52		0,00	R\$ 0,00	84,22	R\$ 1.315,52
3.5.3.13	SINAPI	93026	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	1,00	109,78	109,78		0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 109,78
3.5.3.14	PMFI	PMFI-1128	PERFILADO PERFORADO ELETROCALHA (30X38)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #22, INCLUSIVO FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVO TAMPÃO DE ENCAIXE (BASEADO SETOP ELE-PER-030)	M	30,00	43,17	1.295,10		0,00	R\$ 0,00	30,00	R\$ 1.295,10
3.5.3.15	PMFI	PMFI-576	CAIXA DE PASSAGEM (ELÉTRICA) 30X30X40CM, EXECUTADA EM ALVENARIA, REBOCO IMPERMEABILIZADO, FUNDIDO EM CAMADAS DE BRITA 3 E ÁREA MÉDIA COM TAMPÃO DE CONCRETO.	UN	3,00	165,35	496,05		0,00	R\$ 0,00	3,00	R\$ 496,05
3.5.4			CABOS					45.672,53	0,00%	100,00%		R\$ 45.672,53
3.5.4.1	SINAPI	101567	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM ² , 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	258,22	92,02	23.761,40		0,00	R\$ 0,00	258,22	R\$ 23.761,40
3.5.4.2	SINAPI	92980	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	354,96	10,24	3.634,79		0,00	R\$ 0,00	354,96	R\$ 3.634,79
3.5.4.3	SINAPI	101564	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM ² , 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	360,48	50,70	18.276,34		0,00	R\$ 0,00	360,48	R\$ 18.276,34

Este documento foi assinado eletronicamente por BRUNA ANDRADE PARCIANELLO CAMPOS.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sistemas.pmfipr.gov.br/rp/sidpublico/verificar> e utilize o código 20009653-36e0-4267-9648-0d1f2d4e3260.

Este documento foi assinado eletronicamente por Vâlos Sighatário.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sistemas.pmfipr.gov.br/rp/sidpublico/verificar> e utilize o código 89b225d7-fbf9-454f-a2e1-867e0555d473.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU – PR
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SMOB
 DIRETORIA DE OBRAS – DIOB



Este documento foi assinado eletronicamente por DIOGO ANDRADE PARCIANELLO CAMPOS.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sistemas.pmfj.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar> e utilize o código 250096b3-36e3-42d7-9063-a614214022c3.


Este documento foi assinado eletronicamente por Vânia Signatário.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sistemas.pmfj.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar> e utilize o código 89b225d7-fbf9-454f-a2e1-867e0555d473.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU – PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SMOB
DIRETORIA DE OBRAS – DIOB

Foz
108
6

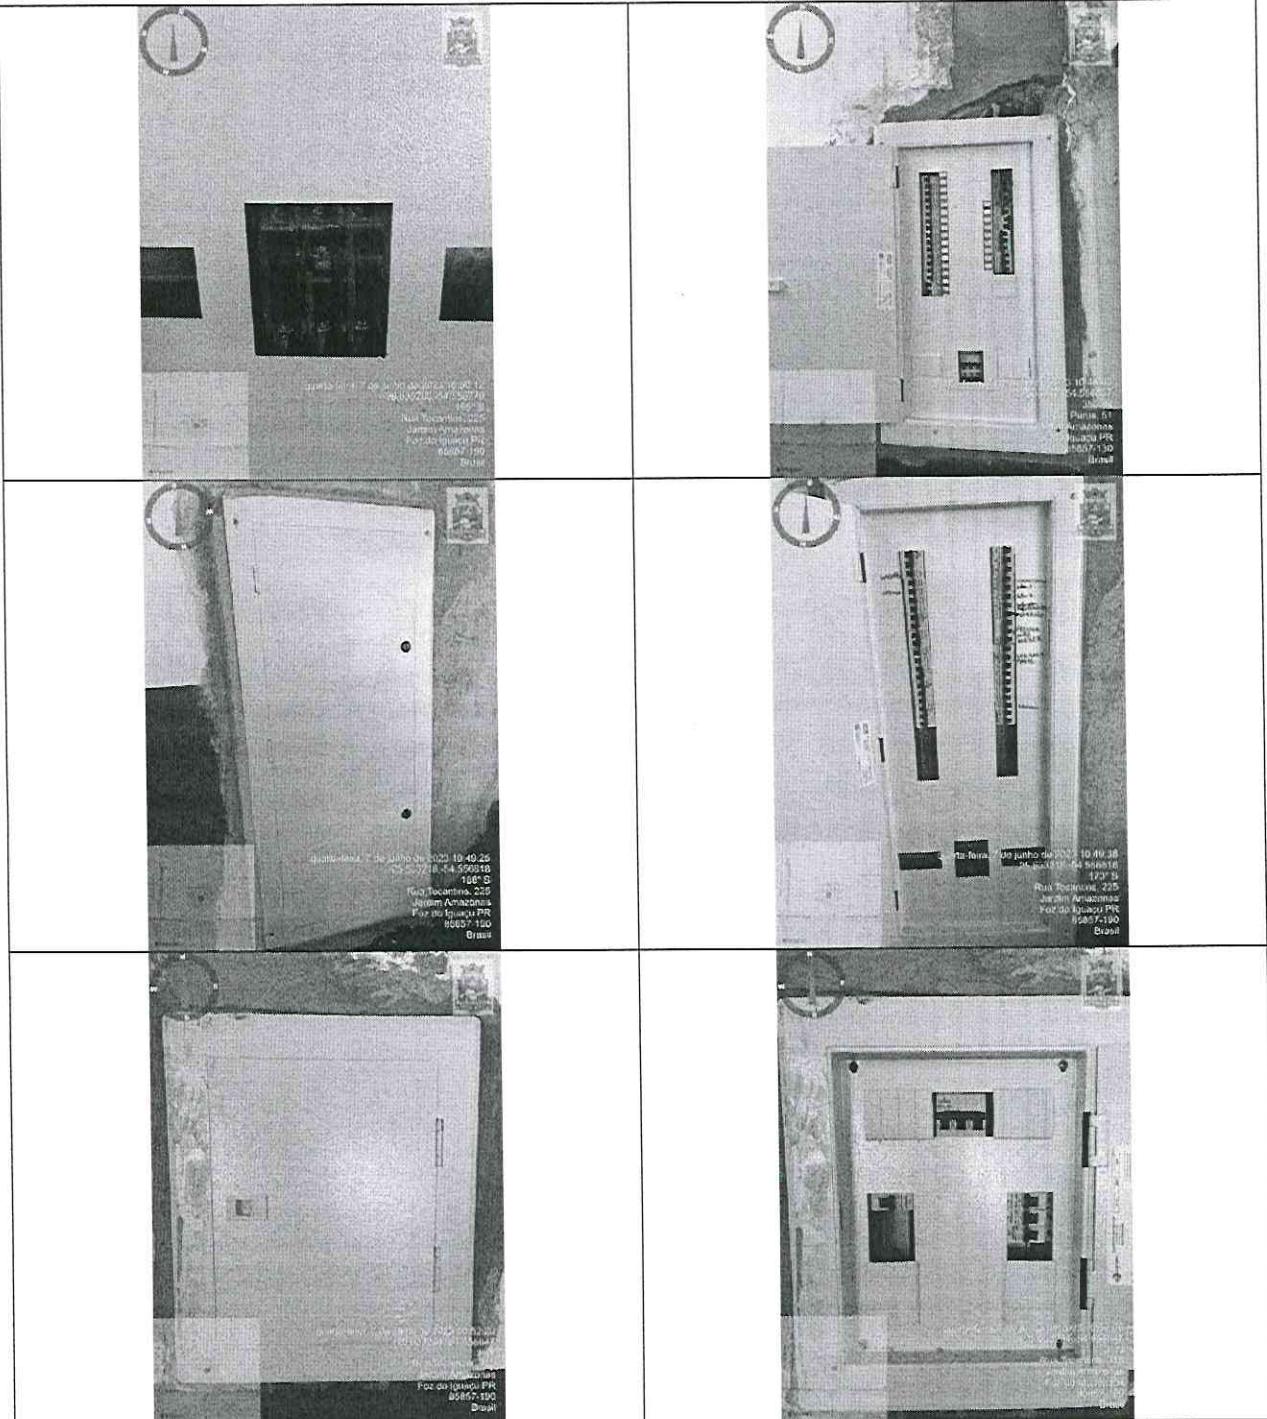

Este documento foi assinado eletronicamente por BRUNA MARIA PARCIANELLO CAMPOS.


Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar> e utilize o código 2B0006B7-36e8-4267-9868-0fb1b23e0260.

Este documento foi assinado eletronicamente por Vânia Signatário.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar> e utilize o código 89b225d7-fbf9-454f-a2e1-867e0555d473.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU – PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SMOB
DIRETORIA DE OBRAS – DIOB

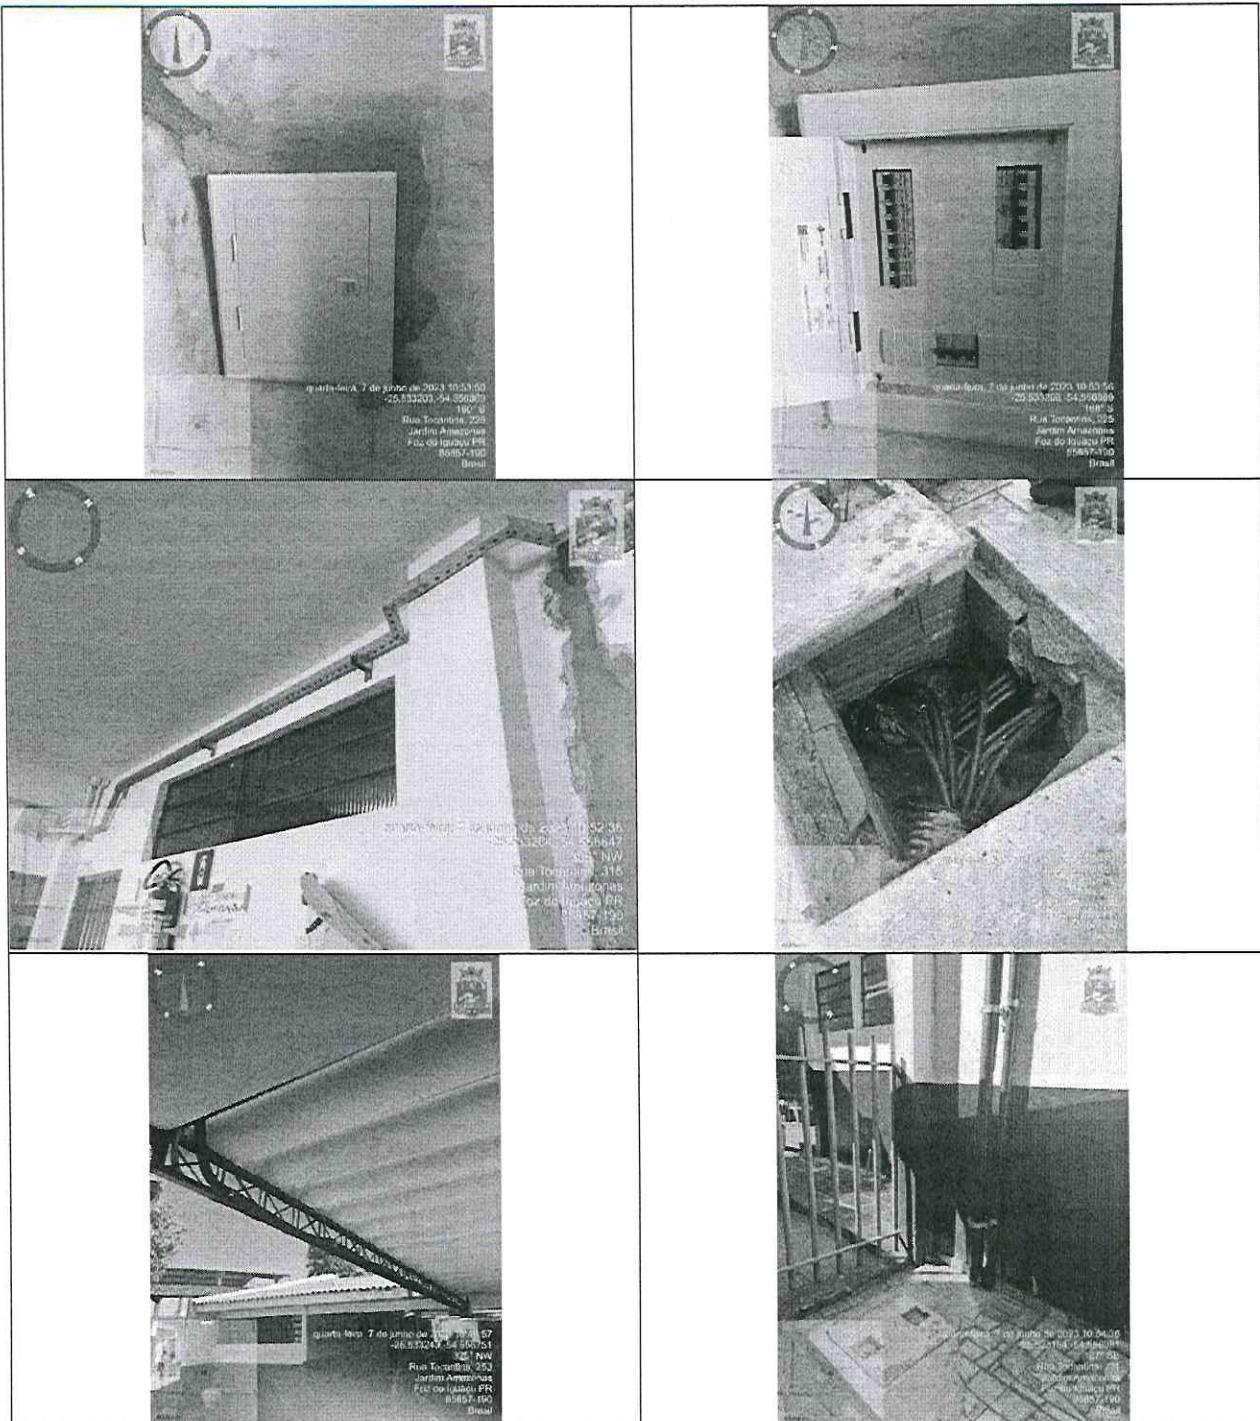

Este documento foi assinado eletronicamente por BRUNA ANDRADE PARCIANELLO CAMPOS.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sistemas.pmfj.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar> e utilize o código 25009607-36e8-4280-9603-0ebf23e027ed.

Este documento foi assinado eletronicamente por Vânia Signatário.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sistemas.pmfj.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar> e utilize o código 89b225d7-fbf9-454f-a2e1-867e0555d473.




PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU – PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SMOB
DIRETORIA DE OBRAS – DIOB

**FOZ
108
D**

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	PONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO DO ITEM (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	SALDO		1ª EDIÇÃO	
									A MEDIR	A PAGAR	QUANT.	CUSTO (R\$)
4			MONTEIRO LOBATO 300-A				RS 54.856,84	24,38%			76%	RS 41.491,10
4.1			ENTRADA DE ENERGIA				35.646,74	1,17%			98,83%	RS 36.220,66
4.1.1	PMFI-1035		MURETA EM ALVENARIA PARA ENTRADA DE ENERGIA 3,5M X 2,00M X 0,20M, INCLUI ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO: ESTACAS ARMADAS (H=2M), VIGA BALDRAME 14X30CM, PILARETES 20X20CM E VIGA CINTA. COBERTURA EM TEJIMENTO CERÂMICO - EXCLUSIVO ACABAMENTOS	UN	1,00	2166,37	2.166,37		0,00	R\$ 0,00	1,00	RS 2.166,37
4.1.2	SINAPI-87879		CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇÃO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014	M2	7,00	4,32	30,24		0,00	R\$ 0,00	7,00	RS 30,24
4.1.3	SINAPI-87529		MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇÃO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	7,00	35,89	251,23		0,00	R\$ 0,00	7,00	RS 251,23
4.1.4	SINAPI-88485		APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	7,00	3,15	22,05		0,00	R\$ 0,00	7,00	RS 22,05
4.1.5	SINAPI-88489		APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	7,00	16,39	114,73		0,00	R\$ 0,00	7,00	RS 114,73
4.1.6	PMFI-1023		ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, 4" APARENTE, INSTALADO EM PAREDE (OU PÓSTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BASEADO SINAPI 9572)	M	6,00	267,07	1.602,42		0,00	R\$ 0,00	6,00	RS 1.602,42
4.1.7	PMFI-1024		CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO 4", PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BASEADO SINAPI 93206)	UN	1,00	226,05	226,05		0,00	R\$ 0,00	1,00	RS 226,05
4.1.8	PMFI-1022		CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO EM CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,80X0,80X0,6 M. COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO 60X60 E SUBTAMPA PADRÃO COPEL (BASEADO SINAPI 97889)	UN	1,00	750,00	750,00		0,00	R\$ 0,00	1,00	RS 750,00
4.1.9	PMFI-906		ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, DN 100 MM (4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BASEADO SINAPI 91856)	M	5,00	21,94	109,70		0,00	R\$ 0,00	5,00	RS 109,70
4.1.10	SINAPI-93358		ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR QUE IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,45	93,79	42,21		0,00	R\$ 0,00	0,45	RS 42,21
4.1.11	SINAPI-101618		PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	M3	0,08	230,00	17,25		0,00	R\$ 0,00	0,08	RS 17,25
4.1.12	SINAPI-96995		REATERRO MANUAL APILOADO COM SOquete. AF_10/2017	M3	0,37	56,87	21,13		0,00	R\$ 0,00	0,37	RS 21,13
4.1.13	PMFI-543		RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE BLOCO INTERTRAVADO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE PAVER - INCLUSIVE BERÇO, REJUNTAMENTO E COMPACTAÇÃO	M2	2,50	27,77	69,43		0,00	R\$ 0,01	2,50	RS 69,43
4.1.14	SINAPI-93026		CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	2,00	109,78	219,56		0,00	R\$ 0,00	2,00	RS 219,56
4.1.15	SINAPI-91873		ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,00	25,78	51,56		0,00	R\$ 0,00	2,00	RS 51,56
4.1.16	PMFI-907		ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 100 MM (4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BASEADO SINAPI 91873)	M	5,00	81,04	405,20		0,00	R\$ 0,00	5,00	RS 405,20
4.1.17	SINAPI-91920		CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (2 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	25,00	50,00		0,00	R\$ 0,00	2,00	RS 50,00
4.1.18	SINAPI-I-1590		TERMINAL METÁLICO A PRESSÃO PARA 1 CABO DE 95 MM ² , COM 1 FURO DE FIXAÇÃO	UN	25,00	15,43	385,75		0,00	R\$ 0,00	25,00	RS 385,75
4.1.19	SINAPI-I-39221		ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	UN	4,00	1,73	6,92		0,00	R\$ 0,00	4,00	RS 6,92
4.1.20	SINAPI-I-39216		ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4", PARA ELETRODUTO	UN	12,00	9,07	108,84		0,00	R\$ 0,00	12,00	RS 108,84
4.1.21	SINAPI-I-39177		BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	UN	4,00	1,98	7,92		0,00	R\$ 0,00	4,00	RS 7,92
4.1.22	SINAPI-I-39182		BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4", PARA ELETRODUTO	UN	12,00	11,22	134,64		0,00	R\$ 0,00	12,00	RS 134,64
4.1.23	SINAPI-91895		LUVIA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	15,82	63,28		0,00	R\$ 0,00	4,00	RS 63,28
4.1.24	SINAPI-I-425		GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CONDUTOR DE 10*1 A 50 MM ²	UN	1,00	8,74	8,74		0,00	R\$ 0,00	1,00	RS 8,74
4.1.25	PMFI-PMFI-177		CAIXA BEP 30 X 30 X 20 CM, BARRAMENTO 210A, 3/4" X 3/16" - PADRÃO COPEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	525,29	525,29		0,00	R\$ 0,00	1,00	RS 525,29
4.1.26	PMFI-PMFI-178		CAIXA NS PARA DISJUNTOR 400A COM BARRAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	2909,49	2.909,49		0,00	R\$ 0,00	1,00	RS 2.909,49
4.1.27	PMFI-PMFI-180		CAIXA EN PADRÃO COPEL (PARA 2 MEDIDORES) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	531,29	531,29		0,00	R\$ 0,00	1,00	RS 531,29
4.1.28	PMFI-181		CAIXA FN PADRÃO COPEL (57 X 75 X 26 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	629,19	629,19		0,00	R\$ 0,00	1,00	RS 629,19
4.1.29	PMFI-PMFI-1279		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 300A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020. (BASEADO SINAPI 101878)	UN	1,00	876,23	876,23		0,00	R\$ 0,00	1,00	RS 876,23
4.1.30	PMFI-912		DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 300A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BASEADO SINAPI 101898)	UN	2,00	1646,71	3.293,42		0,00	R\$ 0,00	2,00	RS 3.293,42
4.1.33	SINAPI-I-39465		DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE 20* KA (TIPO AC)	UN	3,00	82,16	246,48		0,00	R\$ 0,00	3,00	RS 246,48
4.1.34	SINAPI-92992		CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	200,00	96,72	19.344,00		0,00	R\$ 0,00	200,00	RS 19.344,00
4.1.35	PMFI-1285		EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO, E PEDIDO DE LIGAÇÃO DE ENERGIA NA CONCESSÃO	UN	1,00	1000,00	1.000,00		0,00	R\$ 0,00	1,00	RS 1.000,00
4.2			ATERRAMENTO					641,35	0,00%		100,00%	RS 641,35
4.2.1	SINAPI-96979		CORDALHA DE COBRE NU 95 MM ² , ENTERADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	3,00	109,59	328,77		0,00	R\$ 0,00	3,00	RS 328,77
4.2.2	SINAPI-91873		ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,00	25,78	77,34		0,00	R\$ 0,00	3,00	RS 77,34
4.2.3	SINAPI-98111		CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	2,00	45,96	91,92		0,00	R\$ 0,00	2,00	RS 91,92
4.2.4	PMFI-PMFI-1115		HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COM CONECTOR (BASEADO SINAPI 96986)	UN	1,00	143,32	143,32		0,00	R\$ 0,00	1,00	RS 143,32
4.3			ADEQUAÇÃO QUADROS INTERNOS					17.457,15	73,48%		26,52%	RS 4.829,15
4.3.1	SINAPI-93655		DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	15,90	47,70		0,00	R\$ 0,00	3,00	RS 47,70
4.3.2	SINAPI-97669		ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	60,00	18,38	1.102,80		0,00	R\$ 0,00	60,00	RS 1.102,80
4.3.3	SINAPI-90446		RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAiores QUE 75 MM. AF_05/2015	M	60,00	35,54	2.132,40		0,00	R\$ 0,00	60,00	RS 2.132,40
4.3.4	SINAPI-90470		CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAiores QUE 75 MM. AF_05/2015	M	60,00	14,17	850,20		0,00	R\$ 0,00	60,00	RS 850,20
4.3.7	PMFI-PMFI-576		CAIXA DE PASSAGEM (ELÉTRICA) 30X30X40CM, EXECUTADA EM ALVENARIA, REBOCO IMPERMEABILIZADO, FUNDO EM CAMADAS DE BRITA E AREIA MÉDIA COM TAMPAS DE CONCRETO.	UN	3,00	165,35	496,05		0,00	R\$ 0,00	3,00	RS 496,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU – PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SMOB
DIRETORIA DE OBRAS – DIOB

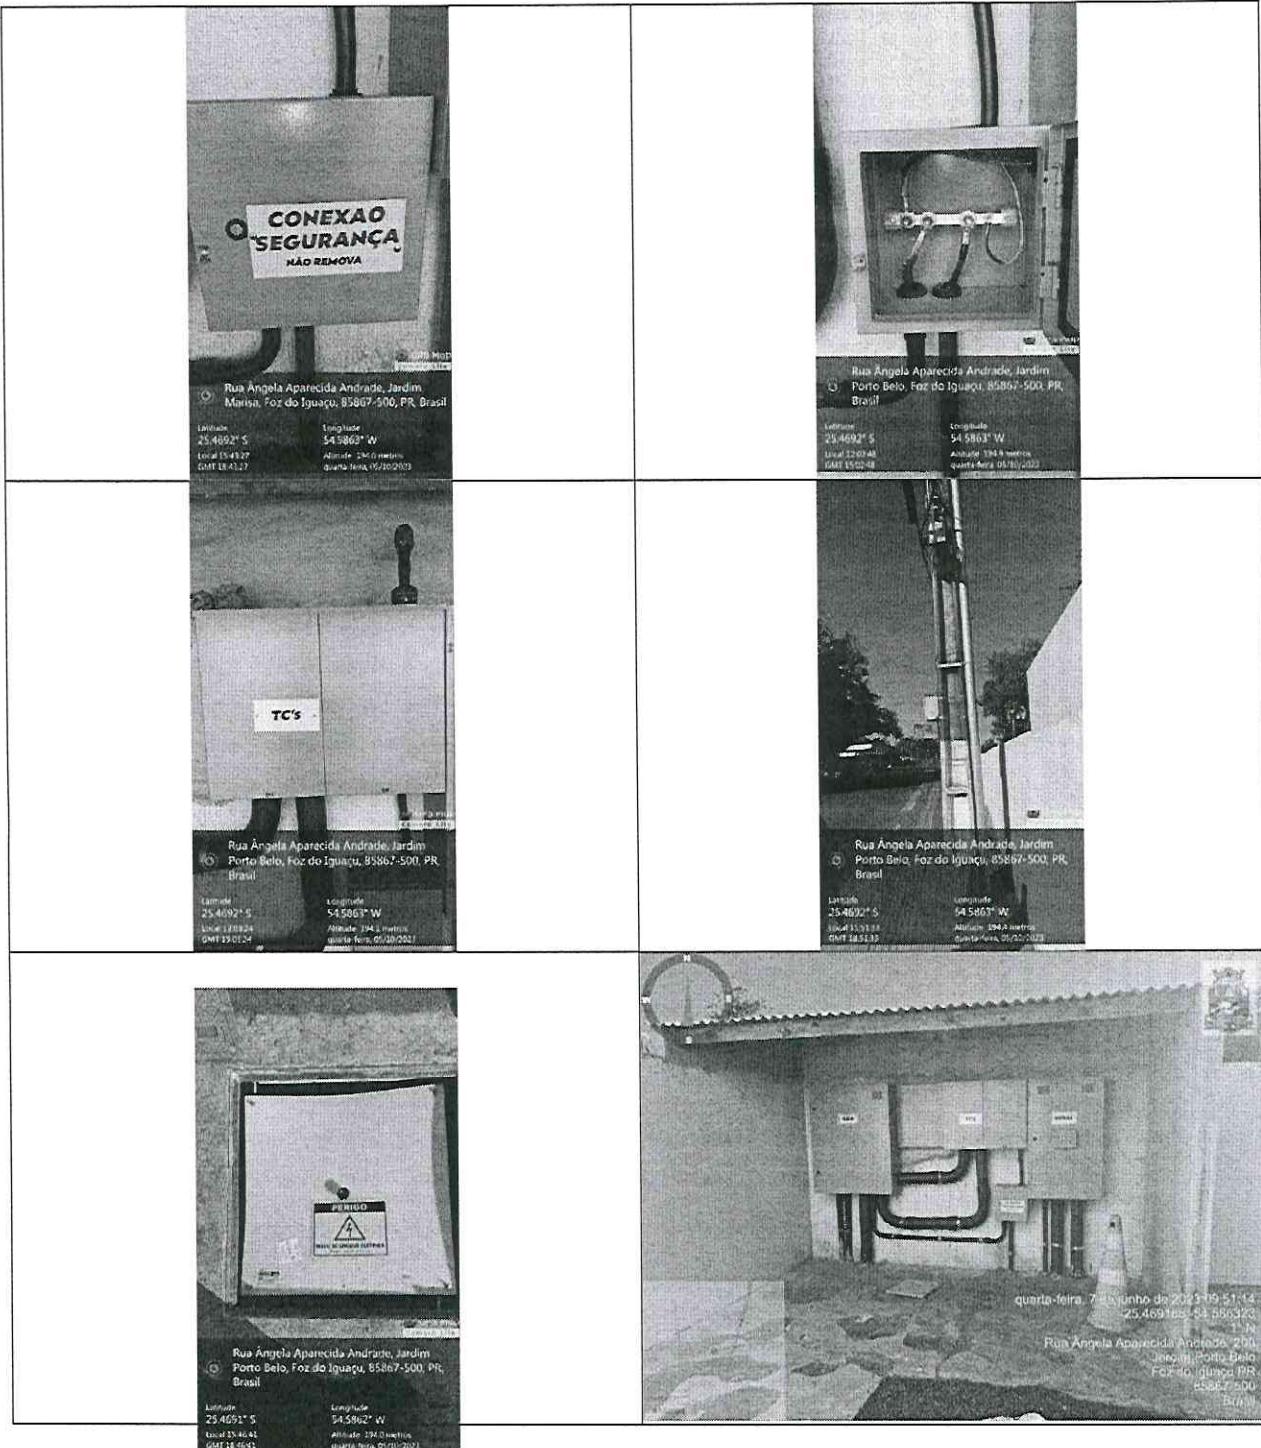

Este documento foi assinado eletronicamente por BRUNA ANDRADE PARCIANELLO CAMPOS.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sistemas.pmfj.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar> e utilize o código 20009857-76e3-4267-9005-0eb42d302250.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sistemas.pmfj.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar> e utilize o código 89b225d7-fbf9-454f-a2e1-867e0555d473.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU – PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SMOB
DIRETORIA DE OBRAS – DIOB



	<p>Rua Ângela Aparecida Andrade, Jardim Manisa, Foz do Iguaçu, 85867-500, PR, Brasil Latitude: 25.4592° S Longitude: 54.5863° W Altitude: 194.0 metros GMT: -03:30</p>
<p>Rua Ângela Aparecida Andrade, Jardim Manisa, Foz do Iguaçu, 85867-500, PR, Brasil Latitude: 25.4592° S Longitude: 54.5863° W Altitude: 194.0 metros GMT: -03:30</p>	<p>Rua Ângela Aparecida Andrade, Jardim Manisa, Foz do Iguaçu, 85867-500, PR, Brasil Latitude: 25.4592° S Longitude: 54.5863° W Altitude: 194.0 metros GMT: -03:30</p>
<p>Rua Ângela Aparecida Andrade, Jardim Manisa, Foz do Iguaçu, 85867-500, PR, Brasil Latitude: 25.4592° S Longitude: 54.5863° W Altitude: 194.0 metros GMT: -03:30</p>	<p>Rua Ângela Aparecida Andrade, Jardim Manisa, Foz do Iguaçu, 85867-500, PR, Brasil Latitude: 25.4592° S Longitude: 54.5863° W Altitude: 194.0 metros GMT: -03:30</p>

Este documento foi assinado eletronicamente por **EDILSON ANDRADE PARCIANELLO CAMPOS**.


Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sistemas.pmfj.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar> e utilize o código 80090683-36e8-4267-9685-0eb1204e022d.

Este documento foi assinado eletronicamente por **Varios signatarios**.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sistemas.pmfj.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar> e utilize o código 89b225d7-fbf9-454f-a2e1-867e0555d473.





PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU – PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SMOB
DIRETORIA DE OBRAS – DIOB

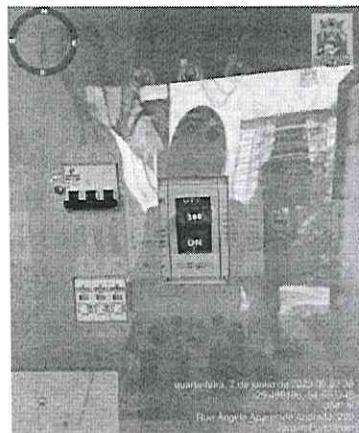



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU – PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SMOB
DIRETORIA DE OBRAS – DIOB

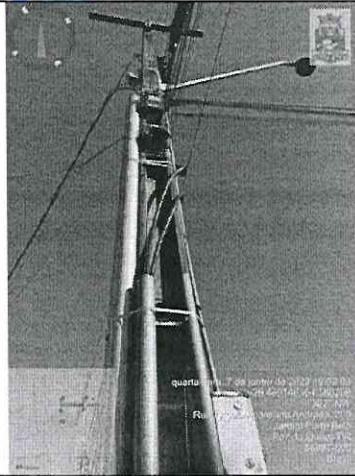



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU – PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SMOB
DIRETORIA DE OBRAS – DIOB



ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO DO ITEM (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	BALDO		1ª MEDICAO	
									A MEDIR	APAGAR	QUANT	CUSTO (R\$)
S			HELENICE MILHORANÇA - 300A					RS 32.722,28	6,77%		93%	RS 30.506,38
5.1			ENTRADA DE ENERGIA					27.728,10	0,89%		89,11%	RS 27.481,61
5.1.1	PMFI-1025	PMFI	MURETA EM ALVENARIA PARA ENTRADA DE ENERGIA 3,5M X 2,00M x 0,20M, INCLUI ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO; ESTACAS ARMADAS (H=2M), VIGA BALDRAME 14X30CM, PILARES 20X20CM E VIGA CINTA, COBERTURA EM TELHAMENTO CERAMICO - EXCLUSIVO ACABAMENTOS	UN	1,00	2000,00	2.000,00		0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 2.000,00
5.1.2	SINAPI-87879	SINAPI	CHAPISCO APICULADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇÃO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014	M2	7,00	4,32	30,24		0,00	R\$ 0,00	7,00	R\$ 30,24
5.1.3	SINAPI-87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇÃO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014	M2	7,00	35,89	251,23		0,00	R\$ 0,00	7,00	R\$ 251,23
5.1.4	SINAPI-88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014	M2	7,00	3,15	22,05		0,00	R\$ 0,00	7,00	R\$ 22,05
5.1.5	SINAPI-88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	M2	7,00	16,39	114,73		0,00	R\$ 0,00	7,00	R\$ 114,73
5.1.6	PMFI-1023	PMFI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, 4" APARENTE, INSTALADO EM PAREDE (OU POSTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BASEADO SINAPI 97552)	M	6,00	267,07	1.602,42		0,00	R\$ 0,00	6,00	R\$ 1.602,42
5.1.7	PMFI-1024	PMFI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO 4", PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BASEADO SINAPI 93026)	UN	1,00	226,05	226,05		0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 226,05
5.1.8	PMFI-1022	PMFI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO EM CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,80X0,80X0,6 M, COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO 60X60 E SUSTAMPA PADRÃO COPEL (BASEADO SINAPI 97889)	UN	1,00	750,00	750,00		0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 750,00
5.1.9	PMFI-906	PMFI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, DN 100 MM (4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BASEADO SINAPI 91855)	M	5,00	21,94	109,70		0,00	R\$ 0,00	5,00	R\$ 109,70
5.1.10	SINAPI-93358	SINAPI	ESCAVACÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF_02/2021	M3	0,45	93,79	42,21		0,00	R\$ 0,00	0,45	R\$ 42,21
5.1.11	SINAPI-101618	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL AF_08/2020	M3	0,08	230,00	17,25		0,00	R\$ 0,00	0,08	R\$ 17,25
5.1.12	SINAPI-90995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE, AF_10/2017	M3	0,37	56,87	21,13		0,00	R\$ 0,00	0,37	R\$ 21,13
5.1.13	PMFI-PMFI-543	PMFI	RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE BLOCO INTERTRAVADO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE PAVER - INCLUSIVE BERÇO, REJUNTAMENTO E COMPACTAÇÃO	M2	2,50	27,77	69,43		0,00	R\$ 0,01	2,50	R\$ 69,43
5.1.14	SINAPI-93026	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	2,00	109,78	219,56		0,00	R\$ 0,00	2,00	R\$ 219,56
5.1.15	SINAPI-91873	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	2,00	25,78	51,56		0,00	R\$ 0,00	2,00	R\$ 51,56
5.1.16	PMFI-PMFI-907	PMFI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 100 MM (4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BASEADO SINAPI 91873)	M	5,00	81,04	405,20		0,00	R\$ 0,00	5,00	R\$ 405,20
5.1.17	SINAPI-91926	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	2,00	25,00	50,00		0,00	R\$ 0,00	2,00	R\$ 50,00
5.1.18	SINAPI-I-1590	SINAPI	TERMINAL METÁLICO A PRESSÃO PARA 1 CABO DE 95 MM ² , COM 1 FURO DE FIXAÇÃO	UN	25,00	15,43	385,75		0,00	R\$ 0,00	25,00	R\$ 385,75
5.1.19	SINAPI-I-39211	SINAPI	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	UN	4,00	1,73	6,92		0,00	R\$ 0,00	4,00	R\$ 6,92
5.1.20	SINAPI-I-39216	SINAPI	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4", PARA ELETRODUTO	UN	12,00	9,07	108,84		0,00	R\$ 0,00	12,00	R\$ 108,84
5.1.21	SINAPI-I-39177	SINAPI	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	UN	4,00	1,98	7,92		0,00	R\$ 0,00	4,00	R\$ 7,92
5.1.22	SINAPI-I-39182	SINAPI	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4", PARA ELETRODUTO	UN	12,00	11,22	134,64		0,00	R\$ 0,00	12,00	R\$ 134,64
5.1.23	SINAPI-91886	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	4,00	15,82	63,28		0,00	R\$ 0,00	4,00	R\$ 63,28
5.1.24	SINAPI-I-425	SINAPI	GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL PARA HASTA DE ATERRAMENTO DE 5/8", CONDUTOR DE 10*0,50MM ²	UN	1,00	8,74	8,74		0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 8,74
5.1.25	PMFI-PMFI-177	PMFI	CAIXA BFP 30 X 30 X 20 CM, BARRAMENTO Z10A, 3/4" X 3/16" - PADRÃO COPEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	525,29	525,29		0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 525,29
5.1.26	PMFI-PMFI-178	PMFI	CAIXA NS PARA DISJUNTOR 400A COM BARRAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	2909,49	2.909,49		0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 2.909,49
5.1.27	PMFI-PMFI-180	PMFI	CAIXA EN PADRÃO COPEL (PARA 2 MEDIDORES) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	531,29	531,29		0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 531,29
5.1.28	PMFI-181	PMFI	CAIXA FN PADRÃO COPEL (57 X 75 X 26 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	629,19	629,19		0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 629,19
5.1.29	PMFI-912	PMFI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 300A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BASEADO SINAPI 101898)	UN	1,00	1646,71	1.646,71		0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 1.646,71
5.1.31	SINAPI-92992	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2021	M	140,00	96,72	13.540,80		0,00	R\$ 0,00	140,00	R\$ 13.540,80
5.1.32	PMFI-PMFI-1285	PMFI	EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO, E PEDIDO DE LIGAÇÃO DE ENERGIA NA CONCESSIONÁRIA	UN	1,00	1000,00	1.000,00		0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 1.000,00
5.2			ATERRAMENTO					595,39	0,00%		100,00%	RS 595,39
5.2.1	SINAPI-96979	SINAPI	CORDALHA DE COBRE NU 95 MM ² , ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2017	M	3,00	109,59	328,77		0,00	R\$ 0,00	3,00	R\$ 328,77
5.2.2	SINAPI-91873	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	3,00	25,78	77,34		0,00	R\$ 0,00	3,00	R\$ 77,34
5.2.3	SINAPI-98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POULETLENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M, AF_12/2020	UN	1,00	45,96	45,96		0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 45,96
5.2.4	PMFI-PMFI-1115	PMFI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COM CONECTOR (BASEADO SINAPI 96986)	UN	1,00	143,32	143,32		0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 143,32
5.3			ADAPTAÇÃO QUADRADO INTERNOS					4.290,19	43,37%		56,63%	RS 2.420,39
5.3.4	SINAPI-97670	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2021	M	10,00	23,44	234,40		0,00	R\$ 0,00	10,00	R\$ 234,40
5.3.5	SINAPI-93358	SINAPI	ESCAVACÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF_02/2021	M3	0,90	93,79	84,41		0,00	R\$ 0,00	0,90	R\$ 84,41
5.3.6	SINAPI-101618	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, AF_08/2020	M3	0,15	230,00	34,50		0,00	R\$ 0,00	0,15	R\$ 34,50
5.3.7	SINAPI-96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE, AF_10/2017	M3	0,74	56,87	42,25		0,00	R\$ 0,00	0,74	R\$ 42,25
5.3.8	SINAPI-90446	SINAPI	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAiores QUE 75 MM, AF_05/2015	M	2,00	35,54	71,08		0,00	R\$ 0,00	2,00	R\$ 71,08
5.3.9	SINAPI-90470	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR UNICO CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAiores QUE 75 MM, AF_05/2015	M	2,00	14,17	28,34		0,00	R\$ 0,00	2,00	R\$ 28,34
5.3.10	SINAPI-92992	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2021	M	20,00	96,72	1.934,40		0,00	R\$ 0,00	20,00	R\$ 1.934,40




PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU – PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SMOB
DIRETORIA DE OBRAS – DIOB



<p>Rua Di Cavalcanti, Foz do Iguaçu, 85864-170, PR, Brasil</p> <p>Latitude: 25.5232° S Longitude: 54.5890° W Altitude: 170.0 metros Data foto: 25/09/2023</p>	<p>Rua Di Cavalcanti, Foz do Iguaçu, 85864-170, PR, Brasil</p> <p>Latitude: 25.5232° S Longitude: 54.5890° W Altitude: 170.0 metros Data foto: 25/09/2023</p>



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU – PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SMOB
DIRETORIA DE OBRAS – DIOB

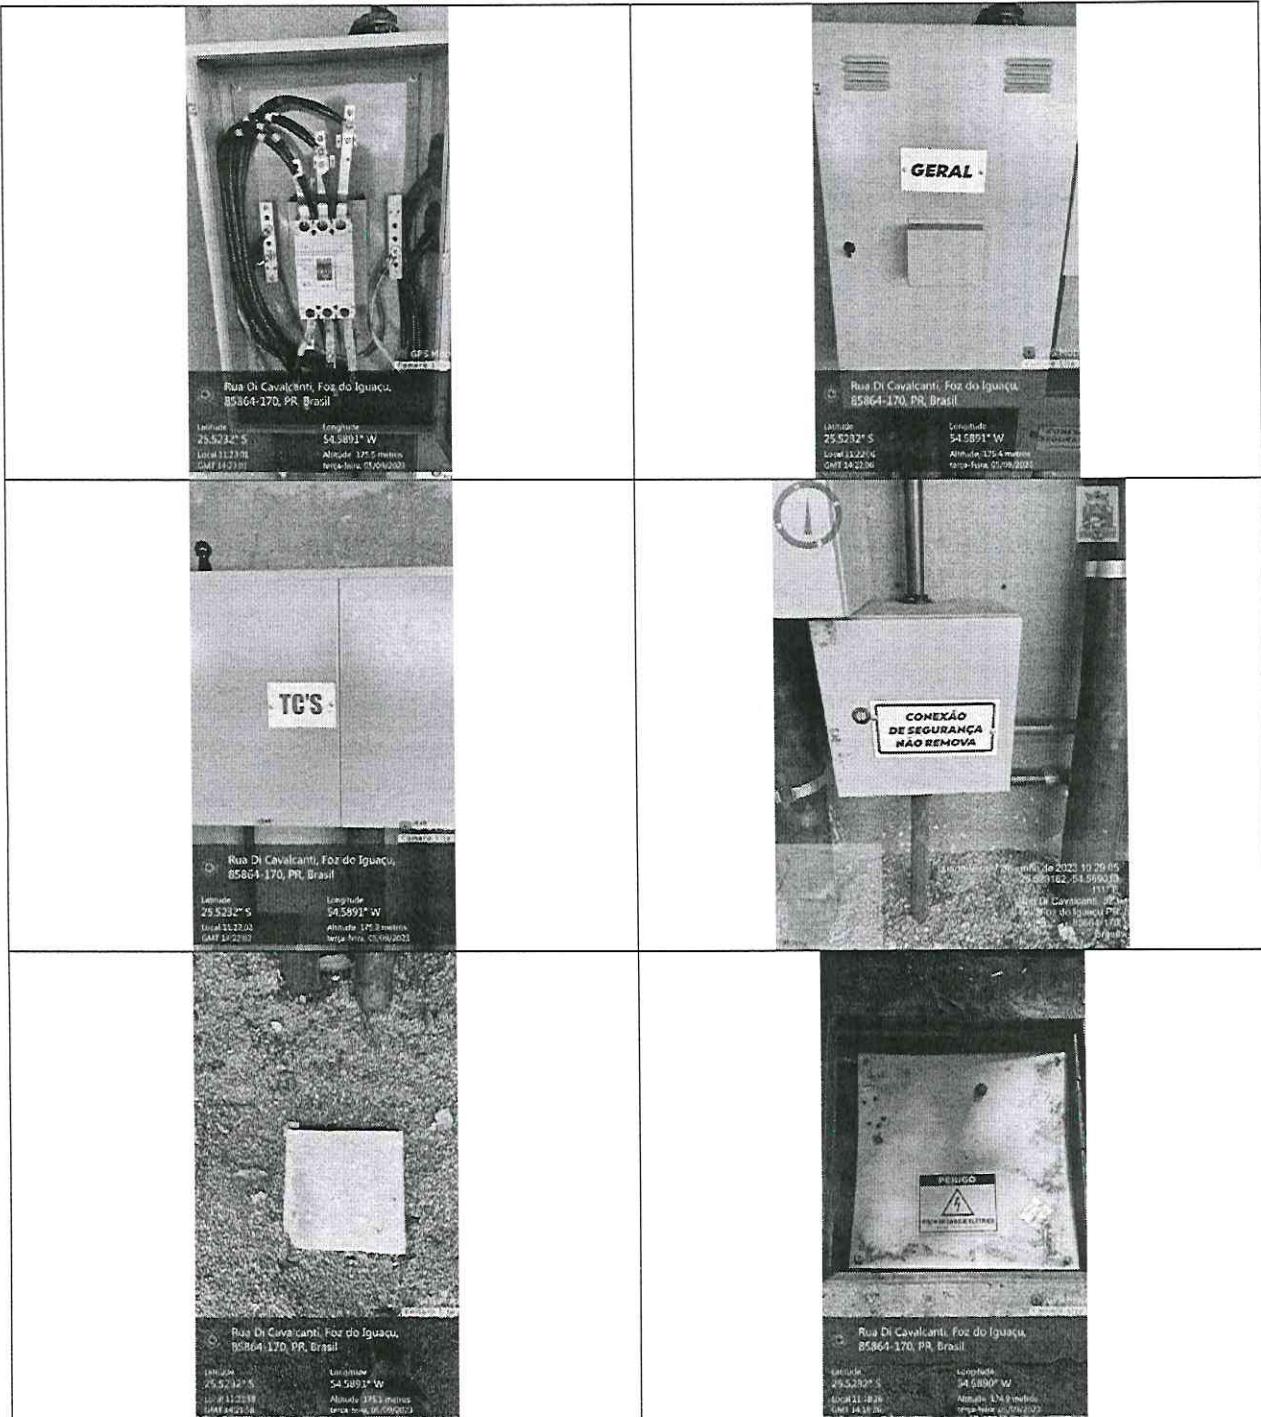

Este documento foi assinado eletronicamente por BRUNA ANDRADE PARCIANELLO CAMPOS.


Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sistemas.pmfj.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar> e utilize o código 35009857-36a3-42d7-9005-02b12b4e02e3.

Este documento foi assinado eletronicamente por Vânia Signatário.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sistemas.pmfj.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar> e utilize o código 89b225d7-fbf9-454f-a2e1-867e0555d473.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU – PR
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SMOB
 DIRETORIA DE OBRAS – DIOB

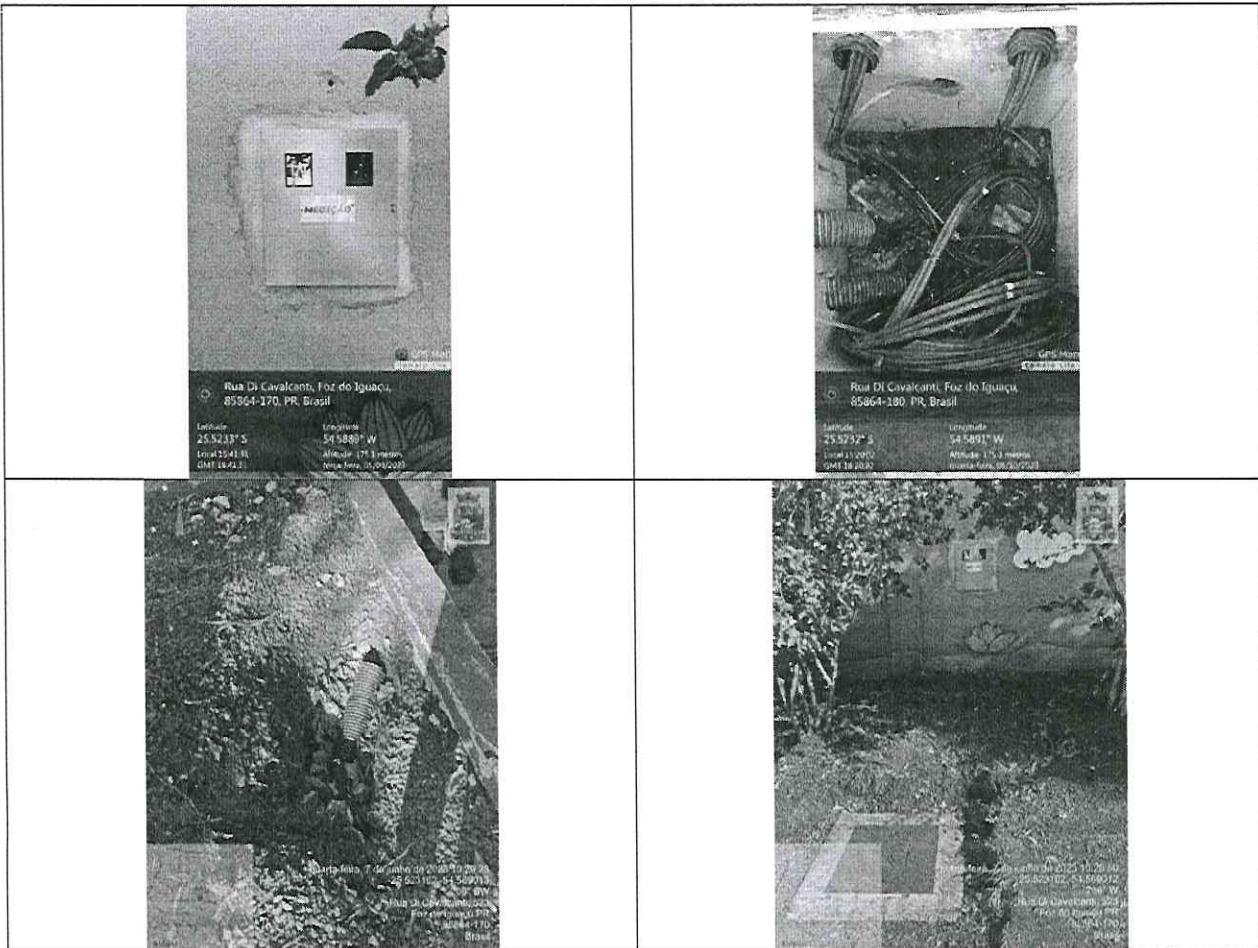

Sem mais para o momento,

Foz do Iguaçu, 12 de junho de 2023.

Bruna Andrade Parcianello Campos
Engª. Fiscal SMOB
Matr.: 2130101

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Número: 1/2023

Assunto: MEDIÇÃO 1 - CT 24/2023

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.

Para verificar as assinaturas clique no link:

<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=32ea36b7-7ce2-42d0-9be2-9e1f28e452a3&cpf=01125414960>

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:

32ea36b7-7ce2-42d0-9be2-9e1f28e452a3

Hash do Documento

F392E2D5F98AF727C5A1092242B41D2CE150F0E68E68A58A194D8FEAFAC542CE

Anexos

MEDICAO 1 PADRÕES ESCOLAS ATT.pdf - af502bc5-1124-4182-82f7-44f4e72a2b6b
2023 - 24- MEDIÇÃO 01 - RELATÓRIO1.pdf - 63e89333-e0df-430d-a60b-ba6476e5b405

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 19/06/2023 é(são) :

BRUNA ANDRADE PARCIANELLO CAMPOS (Signatário) - CPF: ***25414960** em 19/06/2023
10:43:02 - OK

Tipo: Assinatura Eletrônica



A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO N° 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI N° 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo, produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.

PROTÓCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS

Número: 186/2023

Assunto: **EMPRESA: VOGUE TELECOMUNICAÇÕES, OBRA: LIGAÇÃO ENERGIA ESCOLAS MUN., PROC.: 33176/2023**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.

Para verificar as assinaturas clique no link:

<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=2b39983a-36a6-4257-9835-82b434d097c9&cpf=75697742991>
e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:

2b39983a-36a6-4257-9835-82b434d097c9

Hash do Documento

826CCB3358C7ADBB7887F2A5D0E1B7F7D4F364CF334D1F35067FEF99AB1B1D7A

Anexos

NF PADRÃO ESCOLAS 1.pdf - **7ec9904d-912f-4837-93b9-9179922eb110**

BM - BOLETIM DE MEDAÇÃO- Nº 1-2023 (19).pdf - **293d3cf9-9fc9-4472-913d-126c2da34c9b**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 26/06/2023 é(são) :

VALDIR LAVINICKI (Signatário) - CPF: ***09358934** em 21/06/2023 13:09:40 - OK

Tipo: Assinatura Eletrônica

LUIS CEZAR FURLAN (Signatário) - CPF: ***87548900** em 21/06/2023 13:39:03 - OK

Tipo: Assinatura Eletrônica

Maria Justina da Silva (Signatário) - CPF: ***97742991** em 21/06/2023 22:28:19 - OK

Tipo: Assinatura Eletrônica



A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo, produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 030600761-90

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 10.738.123/0001-88

Nome: **VOUGUE FABRICACAO DE ESTRUTURAS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 22/09/2023 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: VOGUE FABRICACAO DE ESTRUTURAS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRICOS LTDA
CNPJ: 10.738.123/0001-88**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.


Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:46:55 do dia 06/06/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/12/2023.

Código de controle da certidão: **C831.B682.6D1A.C7BF**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VOUGUE FABRICACAO DE ESTRUTURAS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
 CNPJ: 10.738.123/0001-88
 Certidão nº: 6241352/2023
 Expedição: 10/02/2023, às 10:29:01
 Validade: 09/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VOUGUE FABRICACAO DE ESTRUTURAS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.738.123/0001-88**, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G332310725044455050
31/08/2023 07:36:14

Dados consultados

Agência	140-6
Conta	44057-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO
Descrição lote	PAG FORNEC DOC
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	29/08/2023
Data para pagamento	30/08/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
MULTIARTE INDUSTRIA E COM	PROCESSADO	748	0217	10.537	20.670,00
ESCOLAR GARCIA EIRELE ME	PROCESSADO	748	0710	79.515	37.596,57
VOUGUE FABRICACAO DE ESTR	PROCESSADO	748	0710	88.483	131.011,53
CORBARI METALURGICA LTDA	PROCESSADO	748	0710	3.890	3.238,00
APLICAR TINTAS LTDA	PROCESSADO	748	0710	59.508	5.023,60
MITA COMERCIO DE FOTOCOPI	PROCESSADO	748	0730	78.129	46.691,90

Transação efetuada com sucesso por: JG301078 JUSELMAR FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

<http://www.pmfifl.pr.gov.br> - pmfi@pmfifl.pr.gov.br

Nota de Liquidação Nº 2 / 2023 - Data: 25/08/2023 Empenho Nº 2.805 / 2023 - Tipo G – Global

Razão Social : **VOUGUE FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA.**

Nome Fantasia :

Endereço : ROD PR-585,S/N

Bairro : JARDIM RECANTO

CEP : 85915090 TOLEDO-PR

CNPJ/CPF : 10.738.123/0001-88

Banco: Agência:

756 - BANCO SICOOB 4351- - Toledo -Pr

237 - BANCO BRADESCO S.A. 3280- - TOLEDO

748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - 0710- - SICREDI (Foz do Iguaçu)

Conta Corrente:

13793-6 - VOGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

39999-0 - VOGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

88483-1 - VOGUE

Orgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Unidade: 02 - DIRETORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Projeto Atividade: 12.02.12.361.0600.1032 - REFORMA, RECONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS DE CONVIVÊNCIA ESCOLA BAIRRO

Nat. Despesa: 4490510105.1.104 - ESCOLAS/COLÉGIOS

Resumo da Despesa

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr. Liquidado	Vlr. Consignado	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
354.364,96	0,00	353.858,09	5.661,71	217.184,85	131.011,53	506,87

Lição: Tomada de Preços Nº13/2.022

Recurso: 66 - Educação 25% sobre Impostos

Contrato: 24 Valor : 354.364,96 Data : 25/1/23

Aditivo: Valor : Data :

Condição de Pagto: Apresentação da N.F. Prazo de Entrega : 90 dias

Hist. Empenho: Reforma e ampliação do padrão de energia das Escolas Municipais: ALTAIR FERRAIS DA SILVA, ANTONIO GONÇALVES DIAS, PROFº ELENICE MILHORANÇA e MONTEIRO LOBATO.

Hist. Liquidação: Liquidação ref. a 2ª Medição do Ct 24/23 aumento de padrões de energia elétrica nas unidades escolares - SMED/SMOB.

Data da Liquidação: 25/08/2023

Documentos Fiscais

Documento	Data	Número	Vencimento	Série	Vlr. Liquidado	Vlr. Consign.	Vlr. Pago	Saldo Pagar
<i>Retenções</i>								
Nota Fiscal	18/08/2023	9270	06/09/2023	F	133.141,79	2.130,26	0,00	131.011,53
	25/08/2023	2188101030201000000	INSS RETIDO DE TERCEIROS			1.464,55		
	25/08/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE			665,71		
							0,00	
Totais...					133.141,79	2.130,26	0,00	131.011,53

BRICAÇÃO DE ESTRUTURAS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELET

RG :

CPF :

Empresa diferenciada, conforme Decreto: 25.676/2017

**Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu**


Praça Getúlio Vargas 280, Centro - CEP: 85851-340 Foz do Iguaçu - PR
E-mail: 24horas@fozdoiguacu.pr.gov.br | Site: <http://www.pmfipr.gov.br/>
Telefone: (45) 3521-1000

COMPROVANTE DO PROCESSO

Nº Processo: 048030 Ano: 2023
Data Processo: 18/08/2023 Hora: 11:09:25
Tipo Processo: [PROCESSO DIGITAL] - COBRANÇA DE FATURA (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)
Requerente: DIOGO RAFAEL GONÇALVES
04917035970
Telefone: 4530546808
Endereço: ÁREA AP, 604 - COOPAGRO
CEP: 85903748 Cidade: Toledo UF: MG
Descrição: NOTA FISCAL CONTRATO 24/2023 AOS CUIDADOS SETOR DE OBRAS

Resultados, pareceres, informações deverão ser consultados através da internet em <http://www.pmfipr.gov.br/prefeitura24h>, na aba **Protocolo** ou pelo telefone (45)3521-1371 ou (45)21051371.

OBSERVAÇÃO: Informações e retiradas de documentos, só serão fornecidas através deste documento/carimbado e assinado pelo responsável da entrada do processo.



MUNICÍPIO DE TOLEDO

Secretaria Municipal da Fazenda e Captação de Recursos
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
www.esnfs.com.br

Número da Nota:
9270

Data e Hora da Emissão:
18/08/2023 10:02:55

Operador Emissor:
VOUGUE F. E. C

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 10738123000188 I.E.: 90475398-00 I.M.: 969774 Telefone: 3054-6808
Nome/Razão: VOUGUE FABRICACAO DE ESTRUTURAS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA
Endereço: ROD PR-585, SN - JARDIM RECANTO - 85915090
Município: Toledo UF: PR e-Mail: vouguetelecom@pop.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 76206606000140 I.E.: ISENTO I.M.:
Nome/Razão: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
Endereço: RUA LISBOA , 510 - JARDIM ALICE - 85858050
Município: Foz do Iguaçu UF: PR e-Mail: cale_bike@hotmail.com

Cód.	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cálc.	Aliq.	ISS
7.02	Prestação de serviço para aumento de carga do padrão de entrada de energia elétrica das unidades escolares, no Município de Foz do Iguaçu/PR	133.141,79	119.827,61	13.314,18	5,00	665,71

CONTRATO 24/2023
EMPENHADO 2805/2023
TOMADA DE PREÇO 13/2022
MATERIAL : 119.827,61
MÃO DE OBRA : 13.314,18

Dedução: MATERIAL

Total Serviços (R\$)	133.141,79
Total ISS (R\$)	665,71
Retenções (R\$)	COFINS 0,00
	ISS (5,00) 665,71
Total Líquido (R\$)	131.011,53

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei R nº 100/2009
A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado em outro município (Foz do Iguaçu).
O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador do Serviço.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

PROCON

Autenticidade: 44C71F65.05887823.D84535E6.883489BD (verificada em 18/08/2023 às 10:03:16)

Equiplano - NFS-e 500.2005u





PREFEITURA MUNICIPAL DE
FOZ DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ

ASSUNTO:EMPRESA: **VOUGUE**
TELECOMUNICAÇÕES - OBRA: LIGAÇÃO
ENERGIA ESCOLAS MUN.- PROC.: 48030/2023

CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS

Certificamos os serviços constantes neste documento: Protocolo Digital n. 48030/2023, Nota Fiscal n. 9270 valor: R\$ 133.141,79, empenho 2805/2023 - SMED, no qual foram executados de acordo ao Contrato n. 24/2023, os serviços são referente à 2^a medição do contrato, valor aplicado em aumento de padrão de energias nas Escolas Municipais deste Município. As medições destes serviços estão devidamente assinadas pela fiscal da obra Eng. Bruna Andrade.

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:

Maria Justina da Silva - Secretária Municipal da Educação

Luis Cezar Furlan - Secretário Municipal de Obras

VALDIR LAVINICKI

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AUMENTO DE CARGA DO PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES ESCOLARES		CONTRATO 24/2023	
	ENDERECO:	Escola Municipal Alair Feraz Zico – Avenida Andradina, 2280 – Jardim Pd, CEP 85869-536; Escola Municipal Antônio Gonçalves Dias – Rua Puns, 234 – Campos do Iguaçu, CEP 85857-130; Escola Municipal Monteiro Lobato – Rua Angélica Apaféca Andrade, 145 – Foz do Iguaçu Parte II, CEP 85867-500; Escola Municipal Professor Elânia Mahraniça – Rua Di Cavalcanti, 523 – Jardim América, CEP 85864-290.		
CONTRATADA:	VOUGUE FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA		TOMADA DE PREÇO 13/2022	
	IGOR DE SOUZA NORRAS BRUNA ANDRADE PARCHANELLO CAMPOS			
PERÍODO MEDIDO :	2 MEDIDA - 13/06/2023 a 14/08/2023	PRAZO EXECUÇÃO:	03/08/2023	
DATA: 15/08/2023 2ª MEDIDA				
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALORES
			UNIDADE DE MEDIDA	QUANTITATIVA/E
		SERVICOS INICIAIS		CUSTO UNITÁRIO
1	PMFI-1	PMFI-1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (BASEADO SINAPI 74209/01)	M2 6,00
1.1	PMFI-1313	PMFI-1313	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - GERENCIAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRA - [ENGENHEIRO CIVIL 10H X MÊS]+ENCARREGADO GERAL 75H X MÊS]	% 100,00
1.3	PMFI-2.1	PMFI-2.1	ALTAIR FERREIRA ZIZO - 4000A	
2	PMFI-179	PMFI-179	ENTRADA DE ENERGIA CAIXA CN PADRÃO COPEL (45 X 35 X 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN 1,00
2.1.29	SINAPI-1018934	SINAPI-1018934	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN 1,00
2.1.33	SINAPI-39465	SINAPI-39465	DISPOSITIVO DIS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	UN 3,00
2.1.34	SINAPI-92992	SINAPI-92992	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2021	M 15,00
2.1.35	SINAPI-92994	SINAPI-92994	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2021	M 125,00
2.1.36				
2.3	SINAPI-97670	SINAPI-97670	ALIMENTAÇÃO QUADRA DE ESPORTES ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2021	M 95,00
2.3.1	SINAPI-93358	SINAPI-93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M 8,55
2.3.2	SINAPI-101618	SINAPI-101618	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, AF_08/2020	M 1,43
2.3.3	SINAPI-96995	SINAPI-96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOquete, AF_10/2017	M 7,80
2.3.4	SINAPI-98504	SINAPI-98504	PLANTIO DE GRAMA BATAIAS EM PLACAS, AF_05/2018	M 23,70
2.3.5	PMFI-543	PMFI-543	RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE BLOCO INTERTRAVADO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE PAVER - INCLUSIVE BERÇO, REJUNTAMENTO E COMPACTAÇÃO	M 6,00
2.3.6	SINAPI-90446	SINAPI-90446	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAiores QUE 75 MM, AF_05/2015	M 5,00
2.3.7	SINAPI-90470	SINAPI-90470	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS Maiores QUE 75 MM, AF_05/2015	M 14,17
2.3.8	PMFI-576	PMFI-576	CAIXA DE PASSAGEM (ELÉTRICA) 30X30X40CM, EXECUTADA EM ALVENARIA, REBOCO IMPERMEABILIZADO, FUNDO EM CAMADAS DE BRITA 3 E ÁREA MÉDIA COM TAMPA DE CONCRETO.	UN 3,00
2.3.9				

Este documento foi assinado eletronicamente por BRUNA ANDRADE PARCHANELLO CARVALHO.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar> e utilize o código 89b225d7-fbf9-454f-a2e1-867e0555d473.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:		IGOR DE SOUZA MORAES		DATA ORDEM DE SERVIÇO		06/03/2023		C/constituindo uma nova cidade			
FISCAL:		BRUNA ANDRADE PARCIANELLO CAMPOS		VIGÊNCIA CONTRATUAL:		210 dias (23/08/2023)		TOQUE SUL			
PERÍODO MEDIDO:		2ª MEDIDA - 13/06/2023 a 14/06/2023		PRAZO EXECUÇÃO:		150 dias (03/08/2023)		Assinatura			
									Data: 15/06/2023		
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO DO ITEM (R\$)	A MEDIR	A PAGAR	QUANT	CUSTO (R\$)
2.3.10	SINAPI	92996	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	285,00	151,91	43.294,35		0,00	R\$ 0,00	285,00
2.3.11	SINAPI	92990	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	190,00	74,86	14.223,40		0,00	R\$ 0,00	190,00
2.3.12	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	15,90	47,70		0,00	R\$ 0,00	3,00
2.4	PMFI	PMFI-92	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	30,00	3,62	108,60	108,60	0,00%	R\$ 0,00	108,60
2.4.1	PMFI	3	ANTONIO GONCALVES - 300A ENTRADA DE ENERGIA				R\$ 34.219,28	0,00%	R\$ 0,00	30,00	R\$ 0,60
3	SINAPI	39465	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	UN	3,00	82,16	246,48	29,635,60	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 4,92,70
3.2.32	PMFI	PMFI-511	PORTA DE AERAR PARA GRADIL, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, MONTANTES VERTICais E HORIZONTALS DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME DE AÇO ZINCADO, FIO 5 MM, MALHA 50X200 MM. INCLUSO FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	5,92	409,80	2.426,02		2.426,02	0,00%	R\$ 246,48
3.4	PMFI	PMFI-92	ADEAQUAÇÃO QUADROS INTERNOS							100,00%	R\$ 2.426,02
3.4.1	PMFI	101835	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	510,21	1.020,42	R\$ 60.600,42	0,90%	R\$ 0,00	2.11%
3.5.2	SINAPI	101896	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	766,99	1.533,98	5.086,72	0,00%	R\$ 0,00	25,11%
3.5.2.12	SINAPI	101895	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	150,00	3,62	543,00		0,00%	R\$ 0,00	R\$ 1.277,20
3.5.2.13	SINAPI	101896	MONTERO LÓPATO 300-A ENTRADA DE ENERGIA				R\$ 64.856,84	36.649,74	0,00%	R\$ 0,00	2.11%
3.5.5	PMFI	PMFI-92	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNI	2,00	157,22	314,44		0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.277,20
3.5.5.1	PMFI	4	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	114,69	114,69		17.457,15	0,00%	R\$ 0,00
4.1	PMFI	PMFI-121	ADEAQUAÇÃO QUADROS INTERNOS							1,00	R\$ 13.365,73
4.1.31	SINAPI	93673	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300,00	15,64	4.692,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.229,00
4.3	SINAPI	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	300,00	27,12	8.136,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.136,00
4.4	PMFI	PMFI-92	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	30,00	3,62	108,60		108,60	0,00%	R\$ 108,60
4.4.1	PMFI	5	HELENICE MILHORANCA - 300A ENTRADA DE ENERGIA				R\$ 32.772,28	6,77%	R\$ 0,00	30,00	R\$ 0,60
5.1	SINAPI	39465	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	UN	3,00	82,16	246,48		0,00	R\$ 0,00	R\$ 221,58
5.3	SINAPI	53	ADEAQUAÇÃO QUADROS INTERNOS							4.290,19	0,00%
										43,37%	R\$ 1.860,81

Este documento foi assinado eletronicamente por ENDAISSE, FERNANDA, FERNANDESE, FÁRCHAS, HELIO CARPOS, e Assinaturas. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sistemas.pmfipr.gov.br/rp/sidpublico/verificar> e utilize o código 89b225d7-fbf9-454f-a2e1-867e0555d473.

ID.: 8/10

CONTRATO DE SERVIÇO				CONTRATANTE				CONTRATADO											
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		IGOR DE SOUZA MORAES		DATA ORDEM DE SERVIÇO		06/03/2023		POZO SISTEMAS ELETRO		CONSTRUINDO UMA NOVA CIDADE									
FISCAL		BRUNA ANDRADE PARCIANELLO CAMPOS		VIGÊNCIA CONTRATUAL:		210 dias (23/08/2023)		PRAZO EXECUÇÃO:		150 dias (03/08/2023)									
2º MEDÍO											Data: 15/08/2023								
											2º MEDICAO								
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO DO ITEM (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	A MEDIR	A PAGAR	QUANT	CUSTO (R\$)							
5.3.1	PMFI	184	BARRAMENTO DE 300 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR + CORRENTE NOMINAL DE 300A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BASEADO SINAP 101.898)	UN	1,00	166,40	166,40	0,00	R\$ 0,00	1,00		R\$ 166,40							
5.3.2	PMFI	912	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	1646,71	1646,71	0,00	R\$ 0,00	1,00		R\$ 1.646,71							
5.3.3	SINAPI	93655	LIMPEZA FINAL DE OBRA	UN	3,00	15,90	47,70	0,00	R\$ 0,00	3,00		R\$ 47,70							
5.4	PMFI	PMFI-92	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	30,00	3,62	108,60	108,60	0,00%	100,00%	30,00	R\$ 108,60							
5.4.1	PMFI	PMFI-92	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	30,00	3,62	108,60	108,60	0,00%	100,00%	30,00	R\$ 108,60							
			TOTAL									R\$ 110.436,12							
			BDI 20,65%									R\$ 22.705,67							
			TOTAL GERAL COM BDI									R\$ 133.141,79							
												37,51%							
									exec:										

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar> e utilize o código 89b225d7-fbf9-454f-a2e1-867e0555d473.



MEDIDAÇÃO 2

CONTRATO:	024/2023	TOMADA DE PREÇO:	013/2022
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AUMENTO DE CARGA DO PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES ESCOLARES	VALOR:	R\$ 354.364,96
ENDEREÇOS:	Escola Municipal Altair Ferraz Zizo – Avenida Andradina, 2290 – Jardim pê, CEP 85869-536; Escola Municipal Antônio Gonçalves Dias – Rua Purus, 234 – Campos do Iguaçu, CEP 85857-130; Escola Municipal Monteiro Lobato – Rua Angela Aparecida Andrade, 145 – Foz do Iguaçu Parte II, CEP 85867-500; Escola Municipal Professora Elenice Milhorança – Rua Di Cavalcanti, 523 – Jardim América, CEP 85864-290.	DATA DO CONTRATO: O.S:	25/01/2023 04/2023 (06/03/2023)
MUNICÍPIO:	Foz do Iguaçu - PR	PRAZO EXECUÇÃO:	150 dias (03/08/2023)
CONTRATADA:	VOUGUE FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	VIGÊNCIA CONTR:	210 dias (23/08/2023)
RESP. TÉC.:	Igor de Souza Moraes	FISCAL DE CAMPO:	Engª Bruna A. P. Campos

Segue relatório fotográfico referente aos serviços executados do contrato supracitado.

O valor total da 2^a medição é **R\$ 133.141,79**, conforme planilha anexa, o que corresponde a uma execução de aproximadamente 37,57% dos serviços previstos no contrato. Os itens 2.1.29 e 2.1.33 destacados em vermelho foram suprimidos conforme o 1º Termo aditivo ao contrato nº 24/2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU – PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SMOB
DIRETORIA DE OBRAS – DIOB

FOZ
108
B

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO DO ITEM (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	SALDO		2ª MEDIDA	
									A MEDR	A PAGAR	QUANT.	CUSTO (R\$)
1			SERVIÇOS INICIAIS					12.430,00	0,00%		52,05%	R\$ 6.470,00
1.1	PMFI	PMFI-1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (BASEADO SINAPI 74209/01)	M2	6,00	545,00	3.270,00		0,00	R\$ 0,00	6,00	R\$ 3.270,00
1.3	PMFI	1313	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - GERENCIAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRA (ENGENHEIRO CIVIL 10H X MÊS) (ENCARREGADO GERAL 75H X MÊS)	%	100,00	80,00	8,000,00		0,00	R\$ 0,00	40,00	R\$ 3.200,00
2			ALTAIR FERREIRA ZIZO - 400A					R\$ 99.704,00	0,42%		84,14%	R\$ 83.991,81
2.1			ENTRADA DE ENERGIA					36.427,15	59,51%		58,35%	R\$ 21.256,22
2.1.29	PMFI	PMFI-179	CAIXA CN PADRÃO COPEL (45 X 35 X 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	234,06	234,06		1,00	R\$ 234,06	0,00	R\$ 0,00
2.1.33	SINAPI	101894	DISJUNTOUR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 10/2020	UN	1,00	186,37	186,37		1,00	R\$ 186,37	0,00	R\$ 0,00
2.1.34	SINAPI-I	39465	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE 20* KA (TIPO AC)	UN	3,00	82,16	246,48		0,00	R\$ 0,00	3,00	R\$ 246,48
2.1.35	SINAPI	92992	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2021	M	15,00	96,72	1.450,80		0,00	R\$ 0,00	15,00	R\$ 1.450,80
2.1.36	SINAPI	92994	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2021	M	125,00	125,59	15.698,75		0,00	R\$ 0,00	125,00	R\$ 15.698,75
2.3			ALIMENTAÇÃO QUADRA DE ESPORTES					62.526,90	0,00%		100,00%	R\$ 62.526,90
2.3.1	SINAPI	97670	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2021	M	95,00	23,44	2.226,80		0,00	R\$ 0,00	95,00	R\$ 2.226,80
2.3.2	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF. 02/2021	M3	8,55	93,79	801,90		0,00	R\$ 0,00	8,55	R\$ 801,00
2.3.3	SINAPI	101618	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL AF. 08/2020	M3	1,43	230,00	327,75		0,00	R\$ 0,00	1,43	R\$ 327,75
2.3.4	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOquete AF. 10/2017	M3	7,80	56,87	443,83		0,00	R\$ 0,00	7,80	R\$ 443,83
2.3.5	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS AF. 05/2018	M2	23,70	10,55	250,04		0,00	R\$ 0,00	23,70	R\$ 250,04
2.3.6	PMFI	PMFI-543	RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE BLOCO INTERTRAVADO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE PAVER - INCLUSIVE BERÇO, REUNITAMENTO E COMPACTAÇÃO	M2	6,00	27,77	166,62		0,00	R\$ 0,00	6,00	R\$ 166,62
2.3.7	SINAPI	90446	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAiores QUE 75 MM AF. 05/2015	M	5,00	35,54	177,70		0,00	R\$ 0,00	5,00	R\$ 177,70
2.3.8	SINAPI	90470	CHUMBIAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAiores QUE 75 MM AF. 05/2015	M	5,00	14,17	70,85		0,00	R\$ 0,00	5,00	R\$ 70,85
2.3.9	PMFI	PMFI-576	CAIXA DE PASSAGEM (ELÉTRICA) 30X30X40CM, EXECUTADA EM ALVENARIA, REBOCO IMPERMEABILIZADO, FUNDO EM CAMADAS DE BRITA 3 E ARGILA MEDIA COM TAMPA DE CONCRETO.	UN	3,00	165,35	496,05		0,00	R\$ 0,00	3,00	R\$ 496,05
2.3.10	SINAPI	92996	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2021	M	285,00	151,91	43.294,35		0,00	R\$ 0,00	285,00	R\$ 43.294,35
2.3.11	SINAPI	92998	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2021	M	190,00	74,86	14.223,40		0,00	R\$ 0,00	190,00	R\$ 14.223,40
2.3.12	SINAPI	93655	DISJUNTOUR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 10/2020	UN	3,00	15,90	47,70		0,00	R\$ 0,00	3,00	R\$ 47,70
2.4			UMPEZA FINAL DE OBRA					108,00	0,00%		100,00%	R\$ 108,00
2.4.1	PMFI	PMFI-92	UMPEZA FINAL DE OBRA	M2	30,00	3,62	108,00		0,00	R\$ 0,00	30,00	R\$ 108,00



ITEM 1 – SERVIÇOS INICIAIS



ITEM 1 – SERVIÇOS INICIAIS




PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU – PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SMOB
DIRETORIA DE OBRAS – DIOB

FOZ
108
6



ITEM 2.1 – ENTRADA DE ENERGIA

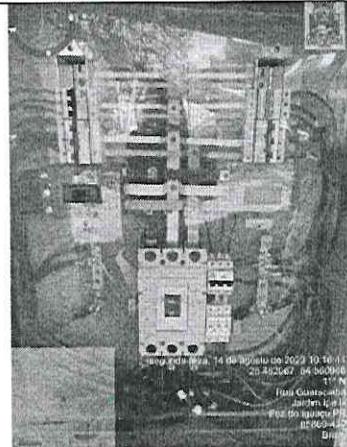

ITEM 2.1 – ENTRADA DE ENERGIA



ITEM 2.1.34– DPS



ITEM 2.1 – ENTRADA DE ENERGIA



ITEM 2.3 – ALIMENTAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES



ITEM 2.3 – ALIMENTAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU – PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SMOB
DIRETORIA DE OBRAS – DIOB

FOZ
108
D



TEM 2.3– ALIMENTAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES



TEM 2.3– ALIMENTAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	PONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO DO ITEM (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	SALDO		2ª MEDIDA	
									A MEDR	A PAGAR	QUANT	CUSTO (R\$)
3			ANTONIO GONÇALVES - 300A					R\$ 94.219,28	0,00%		4,77%	R\$ 4.492,70
3.2			ENTRADA DE ENERGIA					29.635,60	0,00%		0,83%	R\$ 246,48
3.2.32	SINAPI-I	39465	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE 30º KA (TIPO AC)	UN	3,00	82,16	246,48		0,00	R\$ 0,00	3,00	R\$ 246,48
3.4			GRADE DE PROTEÇÃO					2.426,02	0,00%		100,00%	R\$ 2.426,02
3.4.1	PMFI	PMFI-511	PORTÃO DE ABRIR PARA GRADIL, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, MONTANTES VERTICais E HORIZONTais DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME DE AÇO ZINCADO, FIO 5 MM, MALHA 50x200 MM, INCLUSO FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	5,92	409,80	2.420,02		0,00	R\$ 0,00	5,92	R\$ 2.426,02
3.5			ADEQUAÇÃO QUADROS INTERNOS					R\$ 60.500,42	0,00%		2,11%	R\$ 1.277,20
3.5.2			DISJUNTORES					5.086,72	0,00%		26,11%	R\$ 1.277,20
3.5.2.12	SINAPI	101895	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	2,00	510,21	1.020,42		0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 510,21
3.5.2.13	SINAPI	101896	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	2,00	766,99	1.533,98		0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 766,98
3.5.9			LIMPEZA FINAL DE OBRA					543,00	0,00%		100,00%	R\$ 543,00
3.5.5.1	PMFI	PMFI-92	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	150,00	3,62	543,00		0,00	R\$ 0,00	150,00	R\$ 543,00
4			MONTEIRO LOBATO 300-A					R\$ 54.356,84	0,00%		24,36%	R\$ 13.065,73
4.1			ENTRADA DE ENERGIA					30.649,74	0,00%		1,17%	R\$ 429,13
4.1.31	PMFI	PMFI-121	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNI	2,00	157,22	314,44		0,00	R\$ 0,00	2,00	R\$ 314,44
4.1.32	SINAPI	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	114,69	114,69		0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 114,69
4.3			ADEQUAÇÃO QUADROS INTERNOS					17.457,15	0,00%		73,48%	R\$ 12.828,00
4.3.5	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	300,00	15,64	4.692,00		0,00	R\$ 0,00	300,00	R\$ 4.692,00
4.3.6	SINAPI	92984	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	300,00	27,12	8.136,00		0,00	R\$ 0,00	300,00	R\$ 8.136,00
4.4			LIMPEZA FINAL DE OBRA					108,60	0,00%		100,00%	R\$ 108,60
4.4.1	PMFI	PMFI-92	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	30,00	3,62	108,60		0,00	R\$ 0,00	30,00	R\$ 108,60
5			HELENICE MILHORANÇA - 300A					R\$ 32.722,28	6,77%		6,77%	R\$ 2.215,98
5.1			ENTRADA DE ENERGIA					27.728,10	0,00%		0,89%	R\$ 246,48
5.1.30	SINAPI-I	39465	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE 30º KA (TIPO AC)	UN	3,00	82,16	246,48		0,00	R\$ 0,00	3,00	R\$ 246,48
5.3			ADEQUAÇÃO QUADROS INTERNOS					4.290,19	0,00%		43,37%	R\$ 1.860,81
5.3.1	PMFI	184	BARRAMENTO DE 300 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	166,40	166,40		0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 166,40
5.3.2	PMFI	912	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 300A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BASEADO SINAPI 101895)	UN	1,00	1646,71	1.646,71		0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 1.646,71
5.3.3	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	3,00	15,90	47,70		0,00	R\$ 0,00	3,00	R\$ 47,70
5.4			LIMPEZA FINAL DE OBRA					108,60	0,00%		100,00%	R\$ 108,60
5.4.1	PMFI	PMFI-92	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	30,00	3,62	108,60		30,00	R\$ 108,60	30,00	R\$ 108,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU – PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SMOB
DIRETORIA DE OBRAS – DIOB

Foz
108
B

<p>ITEM 3.5.2.12 – DISJUNTOR TRIFÁSICO 125A</p>	<p>ITEM 3.5.2.13 - DISJUNTOR TRIFÁSICO 200A</p>
<p>ITEM 3.2.32 – DPS</p>	<p>ITEM 3.4.1 – GRADIL</p>
<p>ITEM 4.1.31 – DISJUNTOR TRIFÁSICO 60 A 100A</p>	<p>ITEM 4.1.32 – DISJUNTOR TRIFÁSICO 50A</p>





PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU – PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SMOB
DIRETORIA DE OBRAS – DIOB



ITEM 4.3 – ADEQUAÇÃO QUADROS INTERNOS



ITEM 4.3 – ADEQUAÇÃO QUADROS INTERNOS

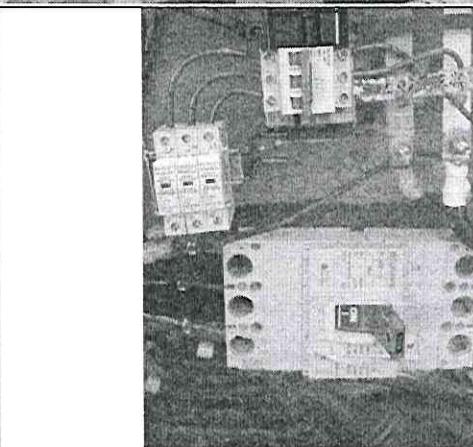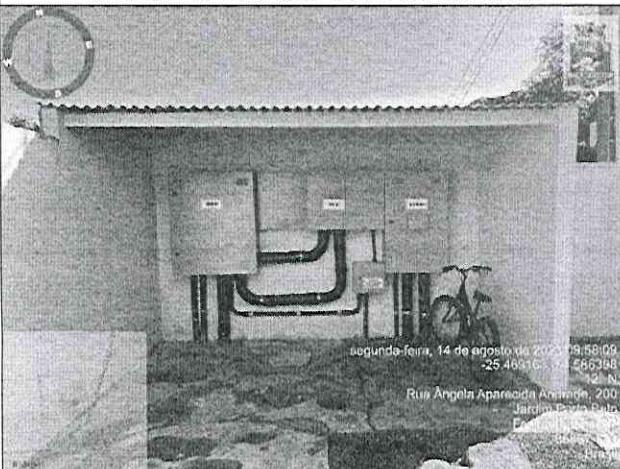


ITEM 5.1.30– DPS




ITEM 5.3.1 – BARRAMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU – PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SMOB
DIRETORIA DE OBRAS – DIOB

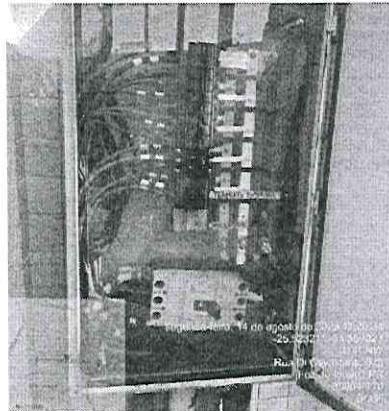

ITEM 5.3.2 – DISJUNTOR TRIFÁSICO 300A

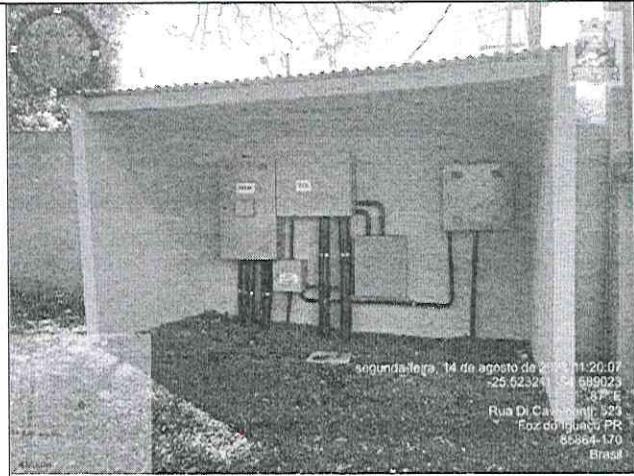

segunda-feira, 14 de agosto de 2023 11:20:07
-25.623211, -52.587515
Rua Dr. Caetano Braga, 525
Foz do Iguaçu PR
85884-170
Brasil

Sem mais para o momento,

Foz do Iguaçu, 15 de agosto de 2023.

Bruna Andrade Parcianello Campos
Eng^a. Fiscal SMOB
Matr.: 2130101

Este documento foi assinado eletronicamente por BRUNA ANDRADE PARCIANELLO CAMPOS.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sistemas.pmfipr.gov.br/rp/sidpublico/verificar> e utilize o código 1065a1uJU200Q4k60Q7Z3JF847501d6f3.

Este documento foi assinado eletronicamente por Vários signatários.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sistemas.pmfipr.gov.br/rp/sidpublico/verificar> e utilize o código 89b225d7-fbf9-454f-a2e1-867e0555d473.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Número: 2/2023

Assunto: MEDIÇÃO 2 - CT 24/2023

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma SID de assinaturas.

Para verificar as assinaturas clique no link:

<https://sistemas.pmfipr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=1ddbafbf-70b0-4e90-8128-9b5c7b9adc57&cpf=01125414960>

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:

1ddbafbf-70b0-4e90-8128-9b5c7b9adc57

Hash do Documento

32CF1C5E0212313A67B4DE43714C2F5C1E3584379F321AA9262B63CF98D344E4

Anexos

MEDICAO 2 - PADRÕES ESCOLAS CERTO.pdf - 802ba227-46fc-4d30-8314-6c7a372deed3
2023 - 24- MEDIÇÃO 02 - RELATÓRIO.pdf - 8d2a18e0-f4d8-49e3-8d22-d23df95087cc

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 22/08/2023 é(são) :

BRUNA ANDRADE PARCIANELLO CAMPOS (Signatário) - CPF: ***25414960** em 15/08/2023
9:41:22 - OK

Tipo: Assinatura Eletrônica



A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO N° 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI N° 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo, produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS

Número: 255/2023

Assunto: EMPRESA: VOGUE TELECOMUNICAÇÕES - OBRA: LIGAÇÃO ENERGIA ESCOLAS
MUN.- PROC.: 48030/2023

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.

Para verificar as assinaturas clique no link:

<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=7363a169-6f1a-4eaa-8726-f6241561de43&cpf=75697742991>
e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:

7363a169-6f1a-4eaa-8726-f6241561de43

Hash do Documento

3097753FDDCF9EA2BA605E38D6607A187BE91D6C30F69732DE84920CD3FD3A5C

Anexos

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO- Nº 2-2023.pdf - **ecba2f73-dcad-4270-b6da-a636c29c1153**
NF9270.pdf - **c1ed3599-279d-462f-ae00-83988d12d80b**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 24/08/2023 é(são) :

Maria Justina da Silva (Signatário) - CPF: ***97742991** em 22/08/2023 11:48:53 - OK

Tipo: Assinatura Eletrônica

LUIS CEZAR FURLAN (Signatário) - CPF: ***87548900** em 22/08/2023 11:39:26 - OK

Tipo: Assinatura Eletrônica

VALDIR LAVINICKI (Signatário) - CPF: ***09358934** em 22/08/2023 10:26:07 - OK

Tipo: Assinatura Eletrônica



A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo, produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.

› Consulta Optantes

Data da consulta: 24/08/2023 13:22:44

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 10.738.123/0001-88

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **VOUGUE FABRICACAO DE ESTRUTURAS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 31/03/2009**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

 Mais informações

[Voltar \(/consultaoptantes\)](#)

[Gerar PDF](#)



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: VOGUE FABRICACAO DE ESTRUTURAS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA
CNPJ: 10.738.123/0001-88

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:46:55 do dia 06/06/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/12/2023.

Código de controle da certidão: **C831.B682.6D1A.C7BF**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.738.123/0001-88

Razão Social: VOGUE FABR DE EST E COM DE EQUIP ELETRI

Endereço: R BARAO DO RIO BRANCO 3054 SALA 01 / CENTRO / TOLEDO / PR / 85905-040

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.


O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/08/2023 a 30/08/2023

Certificação Número: 2023080120212090661998

Informação obtida em 11/08/2023 08:44:14

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VOGUE FABRICACAO DE ESTRUTURAS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.738.123/0001-88

Certidão nº: 41258172/2023

Expedição: 15/08/2023, às 11:25:30

Validade: 11/02/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VOGUE FABRICACAO DE ESTRUTURAS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.738.123/0001-88**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 030600761-90

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **10.738.123/0001-88**

Nome: **VOUGUE FABRICACAO DE ESTRUTURAS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 22/09/2023 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br



MUNICÍPIO DE TOLEDO
ESTADO DO PARANÁ

**CERTIDÃO Positiva com efeito de negativa DE DÉBITOS
RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS (MOBILIÁRIOS E
IMOBILIÁRIOS)**
42820/2023

IMPORTANTE:

FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.

Certificamos que a presente certidão está sendo expedida de forma positiva com efeito de negativa, tendo em vista a existência de créditos não vencidos.

VALIDADE: 14/10/2023

CÓD. AUTENTICAÇÃO: 5ZTJ4J2QET254XZXRPR

FINALIDADE: CADASTRO E/OU CONCORRÊNCIA E/OU LICITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: VOGUE FABRICACAO DE ESTRUTURAS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA

ENDEREÇO: ROD PR-585, SN - JARDIM RECANTO CEP: 85915090 Toledo - PR

INSCRIÇÃO EMPRESA	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ALVARÁ
969774	10.738.123/0001-88	90475398-00	969774

CNAE / ATIVIDADES

4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas, 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica, 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque, 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral, 4399-1/03 - Obras de alvenaria, 4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral, 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico, 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos, 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral, 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 8299-7/01 - Medição de consumo de energia elétrica, gás e água, 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos, 9512-6/00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação, 2330-3/01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda, 2511-0/00 - Fabricação de estruturas metálicas

Observações:

Certidão emitida gratuitamente pela internet em 15/08/2023.

Qualquer rasura invalidará este documento.

Conferir autenticidade em www.toledo.pr.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

<http://www.pmfipr.gov.br> - pmfi@pmfipr.gov.br

Nota de Estorno de Empenho Nº 1 - 10501 / 2023

Razão Social : **VOUGUE FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA**

Nome Fantasia :

Endereço : ROD PR-585,S/N

Bairro : JARDIM RECANTO

CEP : 85915090

TOLEDO-PR

CNPJ/CPF : 10738123000188

Orgão : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Unidade : 02 - DIRETORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Projeto Atividade : 12021236106001032 - REFORMA, RECONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTRO

Despesa : 10501 / 2023

Vlr.Despesa Vlr. Estorno Vlr .Liquidado Vlr .Consignado Vlr. Pago

65.164,60 2.411,20 0,00 0,00 0,00

Licitação : Tomada de Preços nº

Recursos : 44905101051.104 - ESCOLAS/COLÉGIOS

Contrato : 24 Valor : 354.364,96 Data : 25/01/2023

Aditivo : Valor : Data :

Condição Pagto: 90 dias Prazo de Entrega: Apresentação da N.F.

Hist. Empenho: Contratação de empresa para aumento de carga do padrão de entrada de energia elétrica das unidades escolares.

Motivo Estorno: Estorno parcial de empenho em resposta ao MI 52755/2023 SMED/DIAE/DVEOC.

Data Estorno: 22/09/2023

Id Item	Item	Uni. Medida	Qtde.	Total
114614	Aumento de carga do padrão de entrada de energia elétrica na	Serviço	0,04	2.411,20
Valor Estornado...				2.411,20

Proceder estorno do empenho de acordo com a Legislação vigente.

ORDENADOR DA DESPESA



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

ID.: 97/101

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

http://www.pmfipr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Tipo do Contrato: 1 - Obras e Serviços de Engenharia

CONTRATO N°:

24 / 2023

IDENTIFICAÇÃO:

011491

Razão Social : VOGUE FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA

Nome Fantasia :

Endereço : ROD PR-585,S/N

Bairro : JARDIM RECANTO

CEP : 85915090

TOLEDO-PR

CNPJ/CPF : 10738123000188

Contas Corrente do Contratado

Banco:237-BANCO BRADESCO S.A.	Agência:3280-TOLEDO	Conta Corrente:39999	Dt.Desativação:
Banco:756-BANCO SICOOB	Agência:4351-Toledo -Pr	Conta Corrente:13793	Dt.Desativação:
Banco:748-BANCO COOPERATIVO	Agência:0710-SICREDI (Foz do Iguaçu)	Conta Corrente:88483	Dt.Desativação:

Data do Contrato: 25/01/2023 Início: 25/01/2023 Fim: 25/05/2023 Valor: 354364,96

Objeto do Contrato: Prestação de serviço para aumento de carga do padrão de entrada de energia elétrica das unidades escolares, no Município de Foz do Iguaçu/PR, de acordo com as especificações detalhadas no Projeto Básico, do Edital e seus anexos.

Processo Licitatório: Tomada de Preços Nº 13/2022 Assinatura: 25/01/2023 Publicação:

Responsáveis pelo Contrato

Nenhum Responsável Encontrado

Assinaturas no Contrato

Data de Registro	Nome	CPF
25/01/2023	FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO	53736656491

Dotações

Funcional	Natureza Despesa	Descrição	Fonte
12.02.12.361.0600.1032	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.104

Inexecuções

Nenhuma Inexecução Encontrada

Contas Extra Orçamentárias

Nenhuma Conta Contábil Encontrada

Atos Contratuais / Apostilamento - Período: Até:

Tipo do Ato	Número	Tipo	Dt.Termo	Data Fim	Valor	Vl. Atualizado Historico
Prazo	1	Dilatação do Prazo de Vigência	24/05/2023	23/08/2023	0,00	354.364,96 Prorrogam-se os prazos de execução e vigência até 03/08/2023 e 23/08/2023, respectivamente cfe Processos nº 20680/2023 e 15488/2022.
Valor	1	Supressão (Redução de Valor)	24/05/2023		-506,87	419.529,56 Supressão calculada em 0,1430%.
Valor	1	Redimensionamento de Objeto -	24/05/2023		65.671,47	419.529,56 Redimensionamento, sendo o acréscimo calculado em 18,5322%.

Despesas Relacionadas no Contrato - Período: Até:

Empenho	Dt. Despesa	Dotação	Nat.Despesa	Fonte	Tipo	Vlr.Empenhado	Vlr.Liquid.	Vlr.Consig.	Vlr.Pago
2805/2023	16/02/2023	12.02.12.361.0600.1032	4490510105	1.104	G - Global	354.364,96	353.858,09	5.661,71	348.196,38
10501/2023	07/06/2023	12.02.12.361.0600.1032	4490510105	1.104	G - Global	62.753,40	0,00	0,00	0,00
					Estornos:	2.411,20	0,00	0,00	0,00
					Totais:	417.118,36	353.858,09	5.661,71	348.196,38

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sistemas.pmfipr.gov.br/rp/sidpublico/verificar> e utilize o código 88622611813142618686555d473.

C:\inetpub\wwwroot\giig\reports\relatórios\contrato\RelCntContratoExtrato.rpt

Lista de RMS Relacionadas ao Contrato

ID.: 98/101

RMS	Empenho	Órgão/Unidade	Situação
1194/2023	2805/2023	12.SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO / 02.DIRETORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL	Aprovada
4496/2023	10501/2023	12.SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO / 02.DIRETORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL	Aprovada
Valor Contrato: 354.364,96		Total Empenhado: 417.118,36	
Total Aditivos: 65.164,60		Total Liquidado: 353.858,09	
Total Inexecução: 0,00		Total Consignado: 5.661,71	
Total Contrato: 419.529,56		Total Pago: 348.196,38	
Total Empenhado: 417.118,36		Saldo à Pagar: 65.671,47	
Saldo à Empenhar: 2.411,20			
Total Anulação: 0,00			

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar> e utilize o código 885228614819487 - segunda-feira, 23 de outubro de 2023 - 09:22:54.

C:\inetpub\wwwroot\giig\reports\relatorios\contrato\RelCntContratoExtrato.rpt



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

http://www.pmfifor.gov.br - pmfi@pmfifor.gov.br

Despesa Orcamentária Nº 2.805 / 2023 Data: 16/02/2023

Página: 1 de 2

Razão Social :	VOUGUE FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS																
Nome Fantasia :																	
Endereço :	ROD PR-585,S/N																
Bairro :	JARDIM RECANTO																
CEP :	85915090 TOLEDO-PR																
CNPJ/CPF :	10738123000188																
Email :	joselui.vougue@vougue.com.br / vougue@vougue.com.br																
Banco:	Agência: Conta Corrente:																
756 - BANCO SICOOB	4351- - Toledo -Pr 13793-6 - VOUGUE																
237 - BANCO BRADESCO S.A.	3280-8 - TOLEDO 39999-0 - VOUGUE																
748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI	0710- - SICREDI (Foz do Iguaçu) TELECOMUNICAÇÕES LTDA. 88483-1 - VOUGUE																
Orgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO																
Unidade:	02 - DIRETORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL																
Proj. Atividade:	1032 - REFORMA, RECONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS DE CONVIVÊNCIA ESCOLA BAIRRO																
Nat. Despesa:	4490510105 - ESCOLAS/COLÉGIOS																
Fonte:	1.104 - 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente																
Resumo da Despesa																	
Vir. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr. Rev. Estor.	Vir. Líquido	Vir. Consido	Est. Consig.	Sld. à Líqdar	Vir. Pago	Sld.à Pg Lqdo	Sdo.à Pgr Desp								
354.364,96	0,00	0,00	353.858,09	5.661,71	0,00	506,87	348.196,38	0,00	506,87								
Recurso:	Educação 25% sobre Impostos					Slcta. Empenho:	11942023 - 1										
Licitação:	Tomada de Preços - 00013 / 2022					Data Licitação:	19/12/2022										
Contrato:	24		Valor:	354.364,96		Data:	25/01/2023										
Aditivo:			Valor:	0,00		Data:											
Condição Pagto:	Apresentação da N.F.			Prazo de Etrga.:	90 dias												
Destino:	Reforma e ampliação do padrão de energia das Escolas Municipais: ALTAIR FERRAIS DA SILVA, ANTONIO GONÇALVES DIAS, PROFª ELENICE MILHORANÇA e MONTEIRO LOBATO.																
Movimentações																	
Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo				Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor								
Liquidação	1	26/06/2023	Liquidação ref. a 1º Medição do Ct 24/23 aumento de padrões de energia elétrica nas unidades escolares - SMED/SMOB.				220.716,30										
Documento Fiscal																	
Tipo		Número		Série		Data	Vencimento	Valor									
Nota Fiscal		9198		F		13/06/2023	03/07/2023	220.716,30									
Consignação	1	26/06/2023	Consignação de ISSQN.				0,00										
Documento Fiscal																	
Tipo		Número		Número / Ano		Data	Cnt. Consignação	Descrição									
Nota Fiscal		9198		12435 / 2023		26/06/2023	218810103020400000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE									
Consignação	2	26/06/2023	Consignação de INSS.				0,00										
Documento Fiscal																	
Tipo		Número		Número / Ano		Data	Cnt. Consignação	Descrição									
Nota Fiscal		9198		12436 / 2023		26/06/2023	218810103020100000	INSS RETIDO DE TERCEIROS									
Ordem de Pagamento	8945	30/06/2023	Autorização para pagamento				217.184,85										
Documento Fiscal																	
Tipo		Número		Número		Série	Data	Vencimento	Valor								
Nota Fiscal		9198		F		13/06/2023	03/07/2023	220.716,30									
Pagamento de Retenção	1	26/06/2023	Consignação de ISSQN.				1.103,58										
Documento Fiscal																	
Tipo		Número		Número		Série	Data	Vencimento	Valor								
Nota Fiscal		9198		F		13/06/2023	03/07/2023	220.716,30									



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

http://www.pmfifor.gov.br - pmfi@pmfifor.gov.br

Despesa Orcamentária Nº 2.805 / 2023 Data: 16/02/2023

Página: 2 de 2

Pagamento de Retenção	2	26/06/2023	Consignação de INSS.	2.427,87	0,00
Documento Fiscal					
		Tipo	Número	Série	Data
Nota Fiscal					
		9198	F	13/06/2023	03/07/2023
Pagamento	3	30/06/2023	Autorização para pagamento	0,00	217.184,85
Documento Financeiro					
		Conta Corrente do Pagamento	Conta Corrente	Type	Número
Conta Contabil	1111119280000000000	BANCO DO BRASIL C/C 44.057-4 - EDUCACAO 25% (104) - 4405	Borderô	04249	Data
Documento Fiscal					
		Tipo	Número	Série	Data
Nota Fiscal					
		9198	F	13/06/2023	03/07/2023
Liquidação	2	25/08/2023	Liquidação ref. a 2ª Medição do Ct 24/23 aumento de padrões de energia elétrica nas unidades escolares - SMED/SMOB.	133.141,79	
Documento Fiscal					
		Tipo	Número	Série	Data
Nota Fiscal					
		9270	F	18/08/2023	06/09/2023
Consignação	1	25/08/2023	Consignação ISSQN NF nº 9270	0,00	665,71
Documento Fiscal					
		Despesa Extra-Orcamentária			
Type	Número	Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
Nota Fiscal	9270	17719 / 2023	25/08/2023	218810103020400000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE
Consignação	2	25/08/2023	Consignação INSS NF nº 9270	0,00	1.464,55
Documento Fiscal					
		Despesa Extra-Orcamentária			
Type	Número	Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
Nota Fiscal	9270	17720 / 2023	25/08/2023	218810103020100000	INSS RETIDO DE TERCEIROS
Ordem de Pagamento	12080	29/08/2023	Autorização para pagamento	131.011,53	
Documento Fiscal					
		Tipo	Número	Série	Data
Nota Fiscal					
		9270	F	18/08/2023	06/09/2023
Pagamento de Retenção	4	25/08/2023	Consignação ISSQN NF nº 9270	665,71	0,00
Documento Fiscal					
		Type	Número	Série	Data
Nota Fiscal					
		9270	F	18/08/2023	06/09/2023
Pagamento de Retenção	5	25/08/2023	Consignação INSS NF nº 9270	1.464,55	0,00
Documento Fiscal					
		Type	Número	Série	Data
Nota Fiscal					
		9270	F	18/08/2023	06/09/2023
Pagamento	6	29/08/2023	Autorização para pagamento	0,00	131.011,53
Documento Financeiro					
		Conta Corrente do Pagamento	Conta Corrente	Type	Número
Conta Contabil	1111119280000000000	BANCO DO BRASIL C/C 44.057-4 - EDUCACAO 25% (104) - 4405	Borderô	04464	Data
Documento Fiscal					
		Tipo	Número	Série	Data
Nota Fiscal					
		9270	F	18/08/2023	06/09/2023
		133.141,79			



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

http://www.pmfifor.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

Despesa Orcamentária Nº 10.501 / 2023 Data: 07/06/2023

Página: 1 de 1

Razão Social : **VOUGUE FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS**

Nome Fantasia :

Endereço : ROD PR-585,S/N

Bairro : JARDIM RECANTO

CEP : 85915090

TOLEDO-PR

CNPJ/CPF : 10738123000188

Email : josedluis@vougue.com.br / vougue@vouq

Banco:

756 - BANCO SICOOB

Agência:

4351- - Toledo -Pr

Conta Corrente:

13793-6 - VOUGUE
TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
39999-0 - VOUGUE
TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
88483-1 - VOUGUE

237 - BANCO BRADESCO S.A.

3280-8 - TOLEDO

748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. -

0710- - SICREDI (Foz do Iguaçu)

BANSICREDI

Orgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO**Unidade:** 02 - DIRETORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL**Proj. Atividade:** 1032 - REFORMA, RECONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS DE CONVIVÊNCIA ESCOLA BAIRRO**Nat. Despesa:** 4490510105 - ESCOLAS/COLÉGIOS**Fonte:** 1.104 - 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente**Resumo da Despesa**

Vir. Despesa	Vir. Estornado	Vir. Rev. Estor.	Vir.Liquidado	Vir. Consrgdo	Est. Consig.	Sld. à Liqdar	Vir. Pago	Sld.à Pg Lqdo	Sdo.à Pgr Desp
65.164,60	2.411,20	0,00	0,00	0,00	0,00	62.753,40	0,00	0,00	62.753,40
Recurso:	Educação 25% sobre Impostos						Slcta. Empenho:		44962023 - 1
Licitação:	Tomada de Preços - 00013 / 2022						Data Licitação:		19/12/2022
Contrato:	24			Valor:	354.364,96		Data:		25/01/2023
Aditivo:				Valor:	0,00		Data:		
Condição Pagto:	Apresentação da N.F.				Prazo de Etrga.:	90 dias			
Destino:	Contratação de empresa para aumento de carga do padrão de entrada de energia elétrica das unidades escolares.								

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Estorno de Empenho	1	22/09/2023	Estorno parcial de empenho em resposta ao MI 52755/2023 SMED/DIAE/DVEOC.			2.411,20

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **OFÍCIO**

Número: **21.017/2023**

Assunto: **RESPOSTA AO REQUERIMENTO N° 722/2023.**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.

Para verificar as assinaturas clique no link:

<https://sistemas.pmfipr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=89b225d7-fbf9-454f-a2e1-867e0555d473&cpf=53736656491>

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:

89b225d7-fbf9-454f-a2e1-867e0555d473

Hash do Documento

40A04A07A6D067A8ECA82F161F2730B958F9B1EC8261A64CFAB78356B59353A0

Anexos

REQ 722-2023.pdf - **5090cfe4-415c-4aba-812b-134503558b83**

RESPOSTA REQ 722-2023 - MEMORANDO INTERNO- Nº 58720-2023 - SMOB.pdf -

79a88ac2-3db1-4f72-90ad-11e9c1fdb79e

RESPOSTA REQ 722-2023 - MEMORANDO INTERNO- Nº 59414-2023 - SMFA-DVACO ANEXO.pdf -

e53c8fb9-bb90-4383-b681-8d3b375387e5

RESPOSTA REQ 722-2023 - SMFA - DVACO - DOC01181320231023084044.pdf -

03164a87-2690-47eb-96d7-beb2c91fdf0c

RESPOSTA REQ 722-2023 - SMFA - DVACO - DOC01181520231023090025.pdf -

d349c8a7-b861-4596-a197-c84588c6e253

RESPOSTA REQ 722-2023 - SMFA - DVACO - ESTORNO EMP 10501-23.pdf -

6ba88105-7d12-4316-98b7-39bdc11245b5

RESPOSTA REQ 722-2023 - SMFA - DVACO - EXTR CONTR 024-2023.pdf - **7e202f61-3a07-4d69-9e5c-bc541fe98c67**

RESPOSTA REQ 722-2023 - SMFA - DVACO - EXTR DESP 2805-23.pdf - **9db80811-614e-4516-8b92-6d631d3217e0**

RESPOSTA REQ 722-2023 - SMFA - DVACO - EXTR DESP 10501-23.pdf - **04937314-f260-4dc5-857c-c7acf1278937**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 10/11/2023 é(são) :

Nilton Aparecido Bobato (Signatário) - CPF: ***06103934** em 08/11/2023 18:01:05 - **OK**

Tipo: Assinatura Digital

Francisco Lacerda Brasileiro (Signatário) - CPF: ***36656491** em 09/11/2023 6:04:40 - **OK**

Tipo: Assinatura Digital



A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo, produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.
