



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná

www.pmfi.pr.gov.br



Foz do Iguaçu, 09 de março de 2026.

Ofício nº 2401/26 – GAB - GABINETE DO PREFEITO

Assunto: **RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 4/2026**

Senhor Presidente,

Em atenção ao Requerimento nº 4/2026, de autoria da Nobre Vereadora Valentina, encaminhado pelo Ofício nº 060/2026-GP, de 4 de fevereiro de 2026, dessa Casa de Leis, sobre a construção do Complexo Esportivo Multiuso da Pista de Arrancada de Foz do Iguaçu, remetemos as seguintes manifestações:

- Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Juventude e Melhor Idade, por meio do Memorando nº 8186, de 9 de fevereiro de 2026;
- Secretaria Municipal de Obras, por meio do Memorando nº 14435, de 4 de março de 2026; e
- Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, por meio do Memorando nº 14148, de 4 de março de 2026.

Atenciosamente,

Ao Senhor
PAULO APARECIDO DE SOUZA
Presidente da Câmara Municipal
FOZ DO IGUAÇU – PR



c95da1a0-034c-45a6-bdb9-694441fe2e30





PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná

www.pmf.pr.gov.br



MEMORANDO INTERNO

Emitente:	SMEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E MELHOR IDADE	Data: 09/02/2026
Destinatário:	SMAD / DIAD / DVCMR - DIVISÃO DE CONTROLE E MONITORAMENTO DOS REQUERIMENTOS LEGISLATIVOS.	Número: 8186/2026
Assunto:	R: REQUERIMENTO Nº 4/2026	

À

Diretoria de Administração - DIAD

Divisão de Controle e Monitoramento dos Requerimentos Legislativos - DVCMR

Em atenção ao **Memorando Interno Nº. 7617/2026/SMAD/DIAD/DVCMR**, contendo, como anexo, o **Requerimento Nº. 04/2026**, datado de 12 de Janeiro de 2026, de autoria da Vereadora Valentina, solicitando **"informações a respeito da construção do Complexo Esportivo Multiuso da Pista de Arrancada de Foz do Iguaçu"**, pelo presente, a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Juventude e Melhor Idade - SMEL, vem, respeitosamente, prestar os seguintes esclarecimentos:

4). O projeto contempla quais modalidades esportivas, estruturas de apoio e áreas de uso comunitário?

Resposta: As modalidades esportivas, estruturas de apoio e áreas de uso comunitário contempladas por meio da construção do Complexo Esportivo Multiuso da Pista de Arrancada de Foz do Iguaçu são: *Vôlei de Praia, Futebol de Praia, Handebol, Beach Tênis e Automobilismo*.

15). Qual será o modelo de gestão do Complexo após a sua conclusão (administração direta, concessão, parceria)?

Resposta: O modelo de gestão do Complexo após a sua conclusão será Administração Direta.

16). Qual o público estimado a ser atendido pelo equipamento público?

Resposta: A estimativa média de uso é de, aproximadamente, 500 (quinhentas) pessoas por semana, podendo triplicar em períodos de maior demanda, em razão do calendário de eventos (competições), projetos sociais e horários livres disponibilizados à comunidade.

Em relação às questões nº. 01, 02, 03, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, e 14, sugere-se o



Autenticado com senha por ANTONIO APARECIDO SAPIA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E MELHOR IDADE - 09/03/2026 às 09:35:12
Documento Código: e27d3d1d-5e6f-4d7e-b955-8aec7ac87994 - consulta à autenticidade em



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 09/03/2026 às 10:05:34
Documento Código: c95da1a0-034c-45a6-bdb9-694441fe2e30 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c95da1a0-034c-45a6-bdb9-694441fe2e30>



e27d3d1d-5e6f-4d7e-b955-8aec7ac87994



c95da1a0-034c-45a6-bdb9-694441fe2e30

encaminhamento à Secretaria Municipal de Obras - SMOB, por se tratarem de questionamentos afeitos à referida Pasta.

Outrossim, sugere-se o encaminhamento da questão nº. 03 também à Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo.

Sem mais para o momento, renovamos protestos de elevada estima e consideração.


Atenciosamente,

Antonio Aparecido Sapia

Secretário Municipal de Esporte, Lazer, Juventude e Melhor Idade



e27d3d1d-5e6f-4d7e-b955-8aec7ac87994



c95da1a0-034c-45a6-bdb9-694441fe2e30



Autenticado com senha por ANTONIO APARECIDO SAPIA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E MELHOR IDADE - 09/03/2026 às 09:35:12
Documento Código: e27d3d1d-5e6f-4d7e-b955-8aec7ac87994 - consulta à autenticidade em



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 09/03/2026 às 10:05:34
Documento Código: c95da1a0-034c-45a6-bdb9-694441fe2e30 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c95da1a0-034c-45a6-bdb9-694441fe2e30>

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **MEMORANDO INTERNO**

Número: **8.186/2026**

Assunto: **R: REQUERIMENTO Nº 4/2026**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.

Para verificar as assinaturas clique no link:

<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=e27d3d1d-5e6f-4d7e-b955-8aec7ac87994>

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:
e27d3d1d-5e6f-4d7e-b955-8aec7ac87994

Hash do Documento

9F65425C8B549EE55E2D9CE92BB5A614C63332D0F22FADF5E506649776B702D

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 09/03/2026 é(são) :

ANTONIO APARECIDO SAPIA (Signatário) - CPF: ***87761865** em 09/03/2026 9:35:12 - **OK**

Tipo: Assinatura Eletrônica



A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536, DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo, produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.



c95da1a0-034c-45a6-bdb9-694441fe2e30





PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná

www.pmfi.pr.gov.br



MEMORANDO INTERNO

Emitente:	SMOB/DIOB - DIRETORIA DE OBRAS	Data: 04/03/2026
Destinatário:	SMAD / DIAD / DVCMR - DIVISÃO DE CONTROLE E MONITORAMENTO DOS REQUERIMENTOS LEGISLATIVOS.	Número: 14435/2026
Assunto:	R: REQUERIMENTO Nº 4/2026	

Prezados Senhores,

Em resposta ao Requerimento Nº 4/2026, a informação da SMOB está anexa a este memorando



Autenticado com senha por IVATAN BATISTA DOS REIS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS - 04/03/2026 às 14:21:21 e VALDIR LAVINICKI - DIRETOR DE OBRAS - 05/03/2026 às 13:08:41
Documento Código: 4f89e566-4235-44ca-9711-e51bc4615c27 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=4f89e566-4235-44ca-9711-e51bc4615c27>



4f89e566-4235-44ca-9711-e51bc4615c27



c95da1a0-034c-45a6-bdb9-694441fe2e30



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 09/03/2026 às 10:05:34
Documento Código: c95da1a0-034c-45a6-bdb9-694441fe2e30 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c95da1a0-034c-45a6-bdb9-694441fe2e30>

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **MEMORANDO INTERNO**

Número: **14.435/2026**

Assunto: **R: REQUERIMENTO Nº 4/2026**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.

Para verificar as assinaturas clique no link:

<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=4f89e566-4235-44ca-9711-e51bc4615c27>

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:

4f89e566-4235-44ca-9711-e51bc4615c27

Hash do Documento

2546C55AAF179C99948A631F6D97CEAC34A6B52E7D7AAB2680DC9985515692A7

Anexos

OFICIO DE RESPOSTA AOS VEREADORES..docx - **98f1d238-40d8-4dee-9f68-3d43b570ba83**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 05/03/2026 é(são) :

VALDIR LAVINICKI (Signatário) - CPF: ***09358934** em 05/03/2026 13:08:41 - **OK**

Tipo: Assinatura Eletrônica

IVATAN BATISTA DOS REIS (Signatário) - CPF: ***70675960** em 04/03/2026 14:21:21 - **OK**

Tipo: Assinatura Eletrônica



A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536, DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo, produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.



c95da1a0-034c-45a6-bdb9-694441fe2e30





c95da1a0-034c-45a6-bdb9-694441fe2e30



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU – PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SMOB
DIRETORIA DE OBRAS – DIOB



Foz do Iguaçu, 12 de fevereiro de 2026.

OFÍCIO DE RESPOSTA AO MEMORANDO INTERNO- Nº 7617/2026

Em complemento às respostas do Memorando interno 8186/2026 da SMEL

CONTRATO: 456/2024

CONCORRÊNCIA PÚBLICA: 018/2024

OBJETO DO CONTRATO: Construção da 3ª (terceira) Etapa da Pista de Arrancada, localizado na Avenida João Ricieri Maran, nº 170, Loteamento Porto Dourado no município de Foz do Iguaçu/PR

CONTRATADA: MPB CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

CNPJ: 09.372.579/0001-98

Em complemento à resposta já enviada da Secretaria Municipal do Esporte, Lazer, Juventude e Melhor Idade (SMEL), por intermédio do Memorando interno 8186/2026, que aponta as seguintes questões como questionamentos destinados à pasta da Secretaria Municipal de Obras (SMOB):

1. Qual a empresa responsável pela execução do empreendimento?;
2. Em que data teve início o planejamento do Complexo Esportivo Multiuso da Pista de Arrancada?;
3. Qual secretaria ou órgão municipal é responsável pela concepção e coordenação do projeto?;
5. Em que data a obra foi oficialmente iniciada?;
7. Qual o percentual de execução física da obra até a presente data?;
8. Houve aditivos contratuais de prazo ou valor?;
9. Em caso afirmativo, informar quantidade, valores individualizados e justificativas técnicas.;
10. O valor final da obra permanece dentro do orçamento inicialmente aprovado?;
11. Qual o valor total estimado do Complexo Esportivo Multiuso?;
12. Quais são as fontes de recursos utilizadas (recursos próprios, convênios, emendas parlamentares, financiamentos)?;



c95da1a0-034c-45a6-bdb9-694441fe2e30



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU – PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SMOB
DIRETORIA DE OBRAS – DIOB



13. Foram emitidos relatórios técnicos de acompanhamento? (Encaminhar cópias);
14. Houve notificações, paralisações ou apontamentos de irregularidades durante a execução?;
15. Qual será o modelo de gestão do Complexo após sua conclusão (administração direta, concessão, parceria)?;

Primeiramente, é importante ressaltar que a obra em questão foi feita em diversas etapas (inclusive com etapas futuras), sendo cada uma delas elaborada e acompanhada por diferentes profissionais, portanto existe certa restrição nas respostas elaboradas, uma vez que a etapa que foi entregue recentemente é a 3ª Etapa, e não a obra em sua totalidade.

As respostas de tópicos mais específicos serão relacionadas a esta etapa.

Seguem as respostas/posição sobre cada questionamento:

1. Qual a empresa responsável pela execução do empreendimento?;

Cada etapa do empreendimento foi realizada por uma empresa diferente, a 3ª Etapa foi realizada no Contrato 456/2024, em nome de **MPB CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.**

2. Em que data teve início o planejamento do Complexo Esportivo Multiuso da Pista de Arrancada?;

Sugere-se o questionamento junto à Secretaria Municipal de Planejamento Urbano (SMPU) por se tratar de dúvida anterior à etapa de acompanhamento de obra em contrato firmado (Função da SMOB).

3. Qual secretaria ou órgão municipal é responsável pela concepção e coordenação do projeto?;

Sugere-se o questionamento junto à Secretaria Municipal de Planejamento Urbano (SMPU) por se tratar de dúvida anterior à etapa de acompanhamento de obra em contrato firmado (Função da SMOB).



c95da1a0-034c-45a6-bdb9-694441fe2e30



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU – PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SMOB
DIRETORIA DE OBRAS – DIOB**



5. Em que data a obra foi oficialmente iniciada?;

Em fevereiro de 2021, é possível observar no portal da transparência a formalização da 1ª etapa do Complexo, a 3ª etapa teve seu contrato firmado em dezembro de 2024.

7. Qual o percentual de execução física da obra até a presente data?;

Em relação às 3 primeiras etapas, todas estão concluídas, porém, para ter uma noção global de todo o Complexo, sugere-se o questionamento junto à Secretaria Municipal de Planejamento Urbano (SMPU) por se tratar de dúvida anterior à etapa de acompanhamento de obra em contrato firmado (Função da SMOB).

8. Houve aditivos contratuais de prazo ou valor?;

Para a 3ª etapa houve aditivo de prazo, porém, nenhum de valor.

9. Em caso afirmativo, informar quantidade, valores individualizados e justificativas técnicas.;

O prazo precisou ser ampliado por motivos climáticos.

10. O valor final da obra permanece dentro do orçamento inicialmente aprovado?;

Sugere-se o questionamento junto à Secretaria Municipal de Planejamento Urbano (SMPU) por se tratar de dúvida anterior à etapa de acompanhamento de obra em contrato firmado (Função da SMOB).

11. Qual o valor total estimado do Complexo Esportivo Multiuso?;

Sugere-se o questionamento junto à Secretaria Municipal de Planejamento Urbano (SMPU) por se tratar de dúvida anterior à etapa de acompanhamento de obra em contrato firmado (Função da SMOB).





**PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU – PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SMOB
DIRETORIA DE OBRAS – DIOB**



12. Quais são as fontes de recursos utilizadas (recursos próprios, convênios, emendas parlamentares, financiamentos)?;

Sugere-se o questionamento junto à Secretaria Municipal de Planejamento Urbano (SMPU) por se tratar de dúvida anterior à etapa de acompanhamento de obra em contrato firmado (Função da SMOB).

13. Foram emitidos relatórios técnicos de acompanhamento? (Encaminhar cópias);

Segue anexos os relatórios de acompanhamento da última etapa executada, no caso, a 3ª.

14. Houve notificações, paralisações ou apontamentos de irregularidades durante a execução?;

Houve notificações, porém, todas as irregularidades apontadas foram sanadas.

15. Qual será o modelo de gestão do Complexo após sua conclusão (administração direta, concessão, parceria)?;

Sugere-se o questionamento junto à Secretaria Municipal de Planejamento Urbano (SMPU) por se tratar de dúvida anterior à etapa de acompanhamento de obra em contrato firmado (Função da SMOB).

Na seqüência segue um quadro de resumo da última etapa executada (3ª Etapa)

QUADRO DE RESUMO DE OBRA





PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU – PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SMOB
DIRETORIA DE OBRAS – DIOB



OBRA:	3ª (TERCEIRA) ETAPA DA PISTA DE ARRANCADA – PORTO DOURADO		
ENDEREÇO:	Avenida João Ricieri Maran, 170	VALOR:	R\$ 799.999,14
CONTRATO:	456/2024	CONC. PÚBLICA:	018/2024
DATA CONTRATO:	17 de dezembro de 2024	ORDEM DE SERVIÇO:	02 de janeiro de 2025
VIGÊNCIA CONTR:	13 de dezembro de 2025	PRAZO EXECUÇÃO:	01 de julho de 2025
CONTRATADA:	MPB CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	CNPJ:	76.206.606/0001-40
RESP. TÉCNICO:	VINICIUS DAMKE QUINTELA	CAU:	A248851-5
RRT EXECUÇÃO:	15134233		
GESTOR CONTRATO:	Antonio Aparecido Sapia	LOTAÇÃO:	SMEL
FISCAL DE CAMPO:	Alvaro Mari Junior	LOTAÇÃO:	SMOB
ART FISCAL CAMPO:	1720253568823		





Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

14

2		SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 13.893,52			R\$ 6.765,70			
2.1	SNAPI	10189	CANILERO DE OBRAS	M2	6,00	255,24	1.531,45	6,00	R\$ 1.531,45	6	100,00%	0
2.12	SNAPI	10775	LOCAÇÃO E CONTRATO DE 2,50x0,80x1,20M COM 1 SANITÁRIO PARA ESCOTOLO COMPLETO, SEM DIVERSOS NÍVEIS INCLUI DOBLAGEM DE MOBILIZAÇÃO	M2S	6,00	668,26	4.009,57	1,00	R\$ 668,26	1	9,87%	5
2.13	PMFI	1091-15	TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE CONTAINER	UM	1,00	132,10	302,10	1,00	R\$ 302,10	1	100,00%	0
2.14	SNAPI	10777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRAS JUNIOR COM CARGOS COMPLEMENTARES	H	30,00	102,59	3.077,65	15,00	R\$ 1.539,32	15	90,00%	15
2.15	PMFI	1091-15	MOVIMENTAÇÃO E DESMONTAGEM DE TAPALME COM TELA PLÁSTICA LARANJA, COM 120 M DE ALTURA PARA SÓLAMENTO DE OBRAS OU EM VALAS, SUTILIZAÇÕES	M	200,00	14,58	4.102,92	102,00	R\$ 2.854,44	102	64,54%	100
3		FUNDAÇÃO				R\$ 154.483,95			R\$ 79.568,64			
3.1		CORTE E ATERRO PARA REGULARIZAÇÃO DO TERRENO				R\$ 32.852,13			R\$ 17.506,39			
3.1.1	SNAPI	10781	TOPOGRAFIA COM CARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	23,45	1.152,43	40,00	R\$ 1.152,43	40	100,00%	0
3.1.2	SNAPI	10253	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM CARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	11,54	554,12	40,00	R\$ 554,12	40	100,00%	0
3.13	SNAPI	10257	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (CARGA 0,8 M ³), 10% PULVERIZA DE 5 CANTIDADES BASCULANTES DE 10 M ³ , DIT. DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 15 KM/H AF_050200	M3	542,43	17,35	27.683,54	542,43	R\$ 5.738,35	542,43	35,17%	100
3.14	SNAPI	10395	DEDUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE AF_050200	M3	320,00	10,85	3.472,30	100,00	R\$ 1.081,43	100	31,25%	220



3.2		ESTACAS				R\$ 121.037,82			R\$ 17.062,25			
3.2.1	PMFI	1091-109	ESTACA BROCA / TRADO DE CONCRETO FCK 25MPa, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL CONTRA DRENAGEM, NÃO ARMADA (BASE SNAPI 101110)	M	1050,20	81,73	73.500,52	100,00	R\$ 6.973,32	100	9,51%	951,2
3.2.2	PMFI	1091-109	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONTRA DRENAGEM	M	69,08	95,51	6.547,59	20,00	R\$ 1.903,25	20	28,74%	49,6
3.2.3	SNAPI	10525	MOVIMENTAÇÃO E DESMONTAGEM DE ESTACAS DIÂMETRO 40,0 CM AF_050202_PS	KG	2700,56	10,40	28.026,78	500,00	R\$ 5.300,96	500	18,53%	2200,16
3.2.4	SNAPI	10583	MOVIMENTAÇÃO E DESMONTAGEM DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO 40,0 CM AF_050202_PS	KG	806,01	14,38	13.083,93	200,00	R\$ 2.878,54	200	22,07%	706,018
4		ARRUJAMENTO (DEGRAUS)				R\$ 361.779,32			R\$ 1.063,33			
4.1		VIGAS BALDRAME (DEGRAUS DA ARRUJAMENTO)				R\$ 148.549,59			R\$ 1.063,33			



VIGAS BALDRAME (SEGUNDA DA ARDU IRANIANI)							R\$ 160.560,55	R\$ 1.063,33					
4.1.1	SNAPI	10827	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGAS BALDRAME OU SAPATA CORRIDA INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS AF_050204	M3	39,59	212,67	8.199,05	5,00	D6	1.063,33	5	12,88%	34,59
4.1.2	SNAPI	10862	CONCRETO BRUTO PARA LASTRO, TRADO 14,5x15 CM, MASSA SECADA, CIMENTO, AREIA, FIBRA DE VIDRO, 10% PULVERIZA DE 5 CANTIDADES BASCULANTES DE 10 M ³ , DIT. DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 15 KM/H AF_050202_PS	M3	5,24	321,11	3.022,54	1,00	D6	-	0	0,00%	5,24
4.1.3	PMFI	1091-1031	ARRUJAMENTO, MOVIMENTAÇÃO E DESMONTAGEM DE VIGAS BALDRAME, BALDRAMA PARA SÓLAMENTO, 15x15 CM, 10% PULVERIZA DE 5 CANTIDADES BASCULANTES DE 10 M ³ , DIT. DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 15 KM/H AF_050202_PS	M3	791,81	60,30	47.741,91	1,00	D6	-	0	0,00%	791,81
4.1.4	SNAPI	10495	ARRUJAMENTO, MOVIMENTAÇÃO E DESMONTAGEM DE VIGAS BALDRAME, BALDRAMA PARA SÓLAMENTO, 15x15 CM, 10% PULVERIZA DE 5 CANTIDADES BASCULANTES DE 10 M ³ , DIT. DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 15 KM/H AF_050202_PS	KG	3399,03	10,86	36.967,75	1,00	D6	-	0	0,00%	3399,03
4.1.5	SNAPI	10490	ARRUJAMENTO, MOVIMENTAÇÃO E DESMONTAGEM DE VIGAS BALDRAME, BALDRAMA PARA SÓLAMENTO, 15x15 CM, 10% PULVERIZA DE 5 CANTIDADES BASCULANTES DE 10 M ³ , DIT. DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 15 KM/H AF_050202_PS	KG	1020,67	15,13	15.500,96	1,00	D6	-	0	0,00%	1020,67
4.1.6	PMFI	1091-1031	CONCRETO BRUTO DE BLOCOS DE CONCRETO 15x15 CM, 10% PULVERIZA DE 5 CANTIDADES BASCULANTES DE 10 M ³ , DIT. DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 15 KM/H AF_050202_PS	M3	55,38	481,35	26.657,13	1,00	D6	-	0	0,00%	55,38
4.1.7	PMFI	1091-1031	ARRUJAMENTO, MOVIMENTAÇÃO E DESMONTAGEM DE VIGAS BALDRAME, BALDRAMA PARA SÓLAMENTO, 15x15 CM, 10% PULVERIZA DE 5 CANTIDADES BASCULANTES DE 10 M ³ , DIT. DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 15 KM/H AF_050202_PS	M3	791,81	12,31	9.725,57	1,00	D6	-	0	0,00%	791,81





Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

S		MUNDO DE ASSUNTO				R\$ 37.547,41			R\$ 35.270,12		
5.1		VIGAS BALDREME (DEGRADADA DEGRADADA)				R\$ 13.486,30					
5.1.1	SIAPV	94527	ESCALA/CONTINENTAL PARA VIGA BALDREME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS AF_010204)	KG	3,05	212,67	650,76		3,05	R\$ 650,76	
5.1.2	SIAPV	94582	CONCRETO PRADO PARA LUSTRO, TACÃO 14x14,5 CM EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA (MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMAS AF_010201)	KG	0,96	327,11	314,03		0,96	R\$ 314,03	
5.1.3	PMF	PMF-1037	FABRICAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM DE FÓRMAS PARA VIGA BALDREME, EMPALHADEIRA PARA VIGAS, ETC. EM UTILIDADES (BASE SIAPV 1936 AF_010201)	KG	80,77	69,30	4.670,82		80,77	R\$ 4.670,82	
5.1.4	SIAPV	10490	APRIMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDREME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO-ARREDORE (MONTAGEM AF_010204)	KG	281,05	11,58	2.845,70		281,05	R\$ 2.845,70	
5.1.5	SIAPV	10490	APRIMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDREME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO-ARREDORE (MONTAGEM AF_010204)	KG	53,82	15,11	817,32		53,82	R\$ 817,32	
5.1.6	PMF	PMF-1036	CONCRETO DE BLOCOS DE CONCRETO BLOCO VIGAS BALDREME, FOR. 25 NPA, LONDO, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ACABAMENTO E ACABAMENTO (BACADO SIAPV 1936 AF_010201)	KG	5,77	401,75	2.377,35		5,77	R\$ 2.377,35	
5.1.7	PMF	PMF-1037	IMPORTAÇÃO, LANCAMENTO, BLOQUEIO, CORTA E LANCAMENTO, CORTA E LANCAMENTO, CORTA E LANCAMENTO	KG	80,77	12,31	1.043,08		80,77	R\$ 1.043,08	



S		MUNDO DE ASSUNTO				R\$ 7.203,19			R\$ 7.203,19		
5.3		PILARES									
5.3.1	SIAPV	82872	CONCRETO DE PILARES, FOR. 25 NPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ACABAMENTO E ACABAMENTO AF_010202, PS	KG	2,57	488,01	1.244,74		2,57	R\$ 1.244,74	
5.3.2	SIAPV	82783	APRIMAÇÃO DE PLACAS OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO-ARREDORE 12,5 MM - MONTAGEM AF_010202	KG	307,01	7,59	2.331,17		307,01	R\$ 2.331,17	
5.3.3	SIAPV	82785	APRIMAÇÃO DE PLACAS OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO-ARREDORE 12,5 MM - MONTAGEM AF_010202	KG	43,05	12,45	536,18		43,05	R\$ 536,18	
5.3.4	SIAPV	82869	FABRICAÇÃO DE FÓRMAS PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA CORRADA, C-25 MM, AF_010201	KG	31,59	101,02	3.191,19		31,59	R\$ 3.191,19	
5.4		ALVENARIA				R\$ 14.580,83			R\$ 14.580,83		
5.4.1	PMF	PMF-2992	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 35 CM, FOR. 1 SIAPV, UTILIZANDO PAU-DE-BOIA (BASE SIAPV 82855)	KG	62,44	71,20	4.445,34		62,44	R\$ 4.445,34	
5.4.2	PMF	PMF-2971	ARMADO DE CINTA ALVENARIA ESTRUTURAL (DIÂMETRO DE 8,0 MM BASE SIAPV 82855)	KG	116,72	0,91	1.059,00		116,72	R\$ 1.059,00	
5.4.3	PMF	PMF-2971	ARMADO DE CINTA ALVENARIA ESTRUTURAL (DIÂMETRO DE 8,0 MM BASE SIAPV 82855)	KG	161,14	3,17	1.193,45		161,14	R\$ 1.193,45	
5.4.4	SIAPV	81934	GRATUEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAFRANCO EM ALVENARIA ESTRUTURAL AF_010201	KG	2,71	753,97	2.041,64		2,71	R\$ 2.041,64	
5.4.5	SIAPV	81933	GRATUEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL AF_010201	KG	5,17	905,15	4.679,64		5,17	R\$ 4.679,64	
5.4.6	PMF	PMF-4	INTERPRETAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMONST.	KG	62,44	12,31	806,36		62,44	R\$ 806,36	



Medições : Fica esta obra restrita ao acompanhamento através de planilha e cronograma e medições conforme contrato, cronograma e execução do objeto inserido no contrato vigente.

Fica a CONTRATADA advertida a equiparar ao cronograma previsto no certame de conforme inserções do CONTRATO em um prazo máximo de 30 dias.





RELATÓRIO DE VISTORIA DE SERVIÇOS – 04

Contrato nº 456/2024 – Concorrência nº 018/2024 – Processo nº 64150/2024

Objeto do Contrato: construção da 3ª (terceira) Etapa da Pista de Arrancada, localizado na Avenida João Ricieri Maran, nº 170, Loteamento Porto Dourado no município de Foz do Iguaçu/PR

1. Execução física

Data da vistoria: Até 10/07/2025	
Realizado na medição: 12,67% [R\$ 101.329,94]	
Realizado Acumulado (Incluindo medição): 61,95% [R\$ 495.580,69]	
Total da Obra: 100% [R\$ 799.999,14]	
Execução prevista da Obra: 100,00 %	
Data do início da obra: 02/01/2025	Obras: Em andamento
Situação na data da vistoria: Cabe destacar que este relatório é o primeiro da obra feito pela nova fiscalização. Não interferirei nas decisões passadas, mas apontarei algumas inconformidades observadas no intervalo desta primeira medição por mim aferida, (4ª Medição Geral da obra): - Ausência do uso de EPI's; - Concretagem realizada em desalinhamento (possível problema com a montagem de caixarias); - Atraso de obra. Em relação aos serviços, foram verificadas frentes de obras nos serviços em execução e demais itens presentes na medição. Itens observados:	



- Locação de Container;
- Escavação de estacas finais para a obra;
- Execução das vigas do último trecho da arquibancada em concreto (substituição da alvenaria);
- Execução das juntas de dilatação nas vigas das arquibancadas no último trecho da arquibancada.

Observações: Será feita uma notificação formalizando as questões citadas.

2. Anexo fotográfico

Segue relatório fotográfico dos itens observados em obra.



c95da1a0-034c-45a6-bdb9-694441fe2e30





c95da1a0-034c-45a6-bdb9-694441fe2e30





RELATÓRIO DE VISTORIA DE SERVIÇOS – 05

Contrato nº 456/2024 – Concorrência nº 018/2024 – Processo nº 64150/2024

Objeto do Contrato: construção da 3ª (terceira) Etapa da Pista de Arrancada, localizado na Avenida João Ricieri Maran, nº 170, Loteamento Porto Dourado no município de Foz do Iguaçu/PR

1. Execução física

Data da vistoria: Até 15/08/2025	
Realizado na medição: Sem medições devido à não finalização de evento	
Realizado Acumulado (Incluindo medição): 61,95% [R\$ 495.580,69]	
Total da Obra: 100% [R\$ 799.999,14]	
Execução prevista da Obra: 100,00 %	
Data do início da obra: 02/01/2025	Obras: Em andamento
Situação na data da vistoria: - Durante o Intervalo desta medição, foi efetuado uma notificação com multa referente à uso de EPI, devido à reincidência no não cumprimento após notificação. - Até a data desse documento, foram verificados os seguintes serviços: - Locação de Container; - Fixação de guarda-corpos; - Execução de pisos das arquibancadas; - Reboco de muro de arrimo.	




c95da1a0-034c-45a6-bdb9-694441fe2e30






2. Anexo fotográfico

Segue relatório fotográfico dos itens observados em obra.

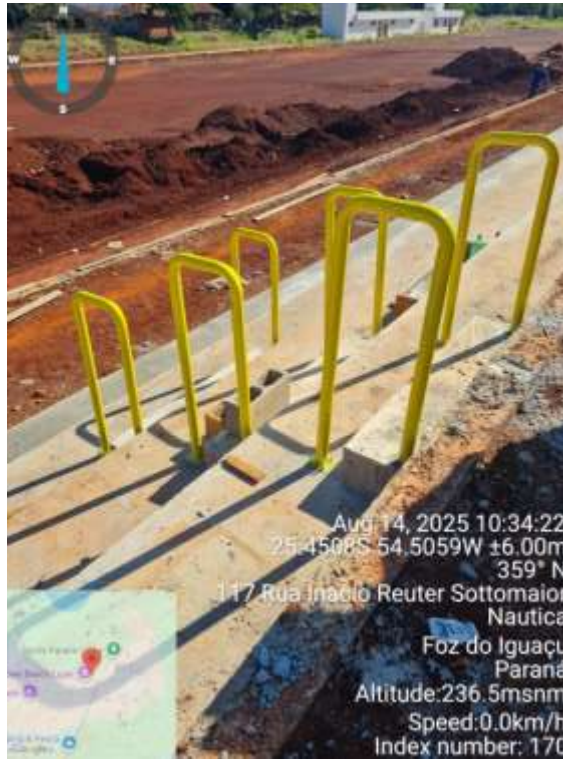

c95da1a0-034c-45a6-bdb9-694441fe2e30



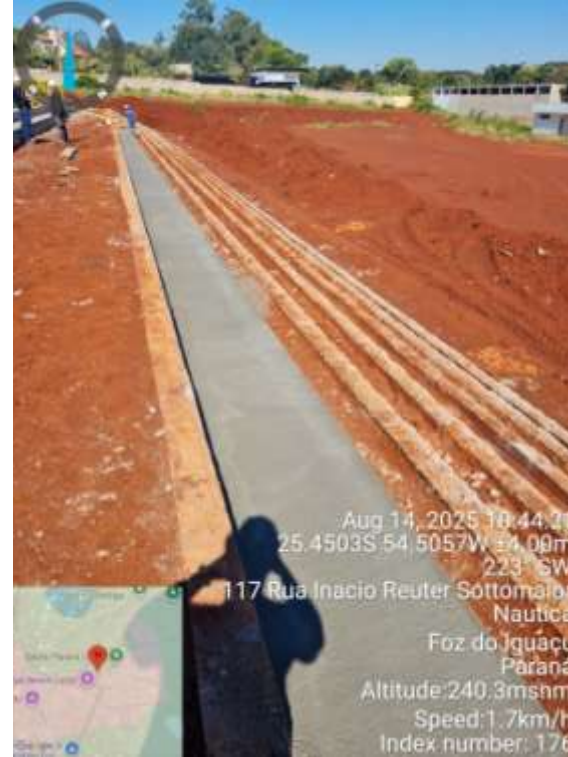

QUADRO DE RESUMO DE OBRA			
OBRA:	3ª (TERCEIRA) ETAPA DA PISTA DE ARRANCADA – PORTO DOURADO		
ENDEREÇO:	Avenida João Ricieri Maran, 170	VALOR:	R\$ 799.999,14
CONTRATO:	456/2024	CONC. PÚBLICA:	018/2024
DATA CONTRATO:	17 de dezembro de 2024	ORDEM DE SERVIÇO:	02 de janeiro de 2025
VIGÊNCIA CONTR:	13 de setembro de 2025	PRAZO EXECUÇÃO:	01 de julho de 2025
CONTRATADA:	MPB CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	CNPJ:	76.206.606/0001-40
RESP. TÉCNICO:	VINICIUS DAMKE QUINTELA	CAU:	A248851-5
RRT EXECUÇÃO:	15134233		
GESTOR CONTRATO:	Antonio Aparecido Sapia	LOTAÇÃO:	SMEL
FISCAL DE CAMPO:	Alvaro Mari Junior	LOTAÇÃO:	SMOB
ART FISCAL CAMPO:	1720253568823		



c95da1a0-034c-45a6-bdb9-694441fe2e30



 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU – PR SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SMOB DIRETORIA DE OBRAS			
RELATÓRIO DE MEDIÇÃO 05 – DEZEMBRO/2025 (CONTRATO 456/2024)			
ASSUNTO:	EVOLUÇÃO FÍSICA DE SERVIÇOS EXECUTADOS ENTRE 18/08/2025 à 03/12/2025		
Contrato:	456/2024	Concorrência Pública:	018/2024
Obra:	PISTA DE ARRANCADA – 3ª ETAPA	Valor do contrato:	R\$ 799.999,14
Endereço:	Avenida João Ricieri Maran, nº 170 – Porto Dourado	Data do Contrato:	17/12/2024
Município:	Foz do Iguaçu - PR	Ordem de Serviço:	02/01/2025
Contratada:	MPB CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	Prazo de Execução:	01/07/2025
Responsável tec.:	Vinicius Damke Quintela	Vigência contratual:	13/12/2025
RRT de exec.:	15134233	Fiscal de campo:	Alvaro Mari Junior
		ART de fiscalização:	1720253568823

Segue relatório de medição do Contrato 456/2024, cujo objeto é a **Construção da 3ª Etapa da Pista de Arrancada, localizada na Avenida João Ricieri Maran, nº 170**, o presente relatório é referente ao período dos serviços realizado entre 18/08/2025 e 03/12/2025. Pelo pagamento estar sendo feito através de Eventograma, o relatório de Evolução Física não caminha junto com os relatórios de medição e pagamento, porém nesta medição todos os serviços foram finalizados e, portanto estão sendo medidos.

O valor total dos pagamentos considerando esta medição ficará em **R\$ 799.999,14**, o que corresponde a **100,00%** dos serviços previstos no contrato.

Em relação aos serviços executados também se encontra em **100%**.

VALOR REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO: R\$ 304.418,45





PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU – PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SMOB
DIRETORIA DE OBRAS

SÍNTESE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS E CONSIDERADOS NESTE RELATÓRIO

Durante o intervalo acompanhado, nota-se a execução dos seguintes serviços:

- Aluguel de Container;
- Pisos das arquibancadas;
- Emboço da Alvenaria e Piso;
- Emboço do Muro de Arrimo;
- Implantação de Guarda-Corpos;
- Implantação de Corrimões;
- Implantação de Paver.

Planilha anexa ilustra os percentuais executados no período da medição.



c95da1a0-034c-45a6-bdb9-694441fe2e30





PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU – PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SMOB
DIRETORIA DE OBRAS

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Seguem fotos ilustrando os serviços acompanhados durante o intervalo de fiscalização referente à medição 05.





PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU – PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SMOB
DIRETORIA DE OBRAS




c95da1a0-034c-45a6-bdb9-694441fe2e30





PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU – PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SMOB
DIRETORIA DE OBRAS

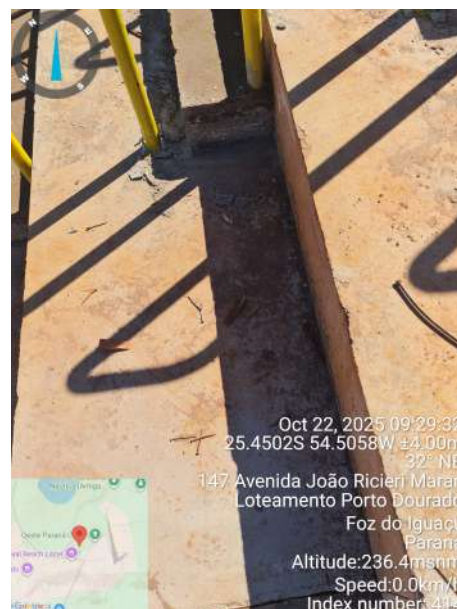

c95da1a0-034c-45a6-bdb9-694441fe2e30





PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU – PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SMOB
DIRETORIA DE OBRAS



c95da1a0-034c-45a6-bdb9-694441fe2e30





PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU – PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SMOB
DIRETORIA DE OBRAS






PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU – PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SMOB
DIRETORIA DE OBRAS

RESUMO DOS PAGAMENTOS

RESUMO DE MEDIÇÕES					
Nº medição	Período	Valor	Percentual	Valor acumulado	Percentual acumulado
01	02/01/2025 a 11/03/2025	R\$ 106.442,95	13,31%	R\$ 106.442,95	13,31%
02	11/03/2025 a 23/04/2025	R\$ 159.771,69	19,97%	R\$ 266.214,64	33,28%
03	24/04/2025 a 20/05/2025	R\$ 128.036,11	16,00%	R\$ 394.250,75	49,28%
04	21/05/2025 a 08/07/2025	R\$ 101.329,94	12,67%	R\$ 495.580,69	61,95%
05	09/07/2025 A 03/12/2025	R\$ 304.418,45	38,05%	R\$ 799.999,14	100,00%

ACOMPANHAMENTO CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

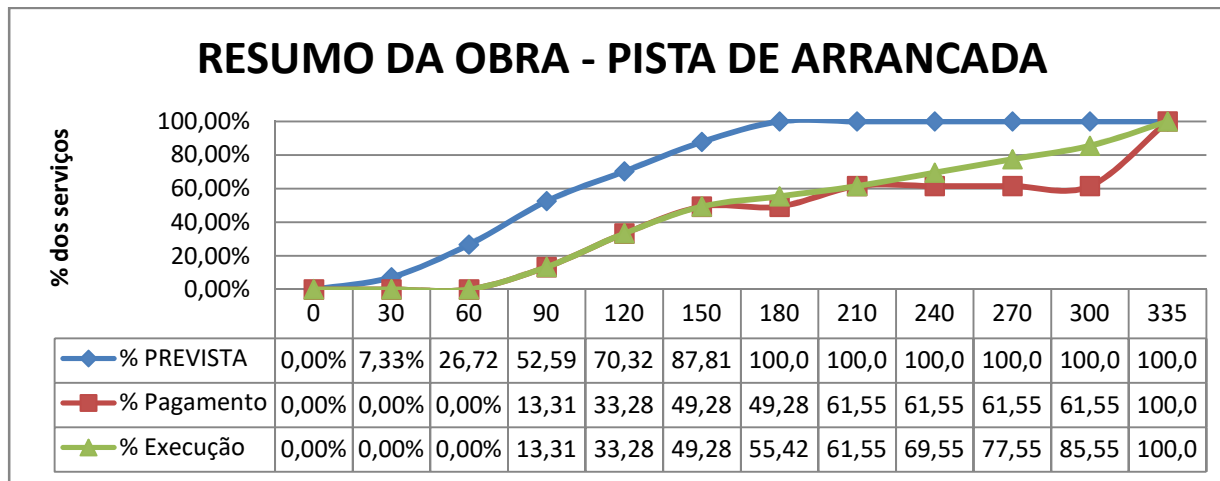

CONVERSÃO DAS INFORMAÇÕES EM m²

AREA TOTAL A CONSTRUIR:	1.175 m²
ÁREA ESTIMADA PAGA (COM MEDIÇÃO)	1.175 m²
ÁREA ESTIMADA EXECUTADA	1.175 m²





PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU – PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SMOB
DIRETORIA DE OBRAS

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com essa medição a obra encontra-se finalizada.

QUADRO DE RESUMO DE OBRA			
OBRA:	3ª (TERCEIRA) ETAPA DA PISTA DE ARRANCADA – PORTO DOURADO		
ENDEREÇO:	Avenida João Ricieri Maran, 170	VALOR:	R\$ 799.999,14
CONTRATO:	456/2024	CONC. PÚBLICA:	018/2024
DATA CONTRATO:	17 de dezembro de 2024	ORDEM DE SERVIÇO:	02 de janeiro de 2025
VIGÊNCIA CONTR:	13 de dezembro de 2025	PRAZO EXECUÇÃO:	01 de julho de 2025
CONTRATADA:	MPB CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	CNPJ:	76.206.606/0001-40
RESP. TÉCNICO:	VINICIUS DAMKE QUINTELA	CAU:	A248851-5
RRT EXECUÇÃO:	15134233		
GESTOR CONTRATO:	Antonio Aparecido Sapia	LOTAÇÃO:	SMEL
FISCAL DE CAMPO:	Alvaro Mari Junior	LOTAÇÃO:	SMOB
ART FISCAL CAMPO:	1720253568823	VALOR DA MEDIÇÃO:	R\$ 304.418,45

Alvaro Mari Junior
Engenheiro Civil CREA PR-116087/D
Fiscal do contrato



c95da1a0-034c-45a6-bdb9-694441fe2e30



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná

www.pmf.pr.gov.br



MEMORANDO INTERNO

Emitente:	SMPU / DIPI - DIRETORIA DE GESTÃO DE PROJETOS PÚBLICOS E INFRAESTRUTURA URBANA	Data: 04/03/2026
Destinatário:	SMAD / DIAD / DVCMR - DIVISÃO DE CONTROLE E MONITORAMENTO DOS REQUERIMENTOS LEGISLATIVOS.	Número: 14148/2026
Assunto:	R: REQUERIMENTO Nº 4/2026	

Prezados,

Em atendimento ao Memorando Interno nº 7617/2026, que solicita o fornecimento de informações para subsidiar a elaboração de resposta ao Requerimento Legislativo nº 4/2026, oriundo da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, a Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, por intermédio da Diretoria de Gestão de Projetos Públicos e Infraestrutura Urbana (DIPI), informa:

1- Qual a empresa responsável pela execução do empreendimento?

R: A execução do complexo esportivo foi dividida pela gestão municipal em etapas conforme a viabilização dos recursos.

Objeto: A contratação de empresa para execução de Pista de Arrancada – Fechamento do terreno (muros/alambrados), de acordo com as especificações detalhadas no Projeto Básico, do Edital e seus anexos.

Modalidade: Concorrência;

Nº: 23/2020

Empresa vencedora do certame: M A SANTOS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

Valor Homologado: R\$ 783.370,27

Objeto: Contratação de empresa para construção do Complexo Esportivo Multiuso da Pista de Arrancadas Cataratas – 2ª Etapa, localizada na Avenida João Ricieri Maranhão, nº 170 – Loteamento Porto Dourado, em atendimento ao Convênio nº 873666/2018 do Ministério da Cidadania, de acordo com as especificações detalhadas no Projeto Básico, do Edital e seus anexos.

Modalidade: Concorrência;

Nº: 12/2021

Empresa vencedora do certame: HARD ROCK TERRAPLANAGEM E DEMOLICOES LTDA

Valor Homologado: R\$ 2.106.754,16

Objeto: Contratação de empresa para construção da Terceira Etapa da Pista de Arrancada, localizada na Avenida João Ricieri Maranhão, nº 170, Loteamento Porto Dourado, no município de Foz do Iguaçu/PR, no regime de empreitada por preço global, de acordo com as especificações detalhadas no Projeto



Autenticado com senha por EDINARDO ANTONIO BORBA DE AGUIAR - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO - 06/03/2026 às 16:47:39 e DIEGO FALKENBERG - DIRETOR DE GESTÃO DE PROJETOS PÚBLICOS E INFRAESTRUTURA URBANA - 06/03/2026 às 16:49:15
Documento Código: d74ad812-c6f3-4fb3-95a3-931f65af8a1a - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=d74ad812-c6f3-4fb3-95a3-931f65af8a1a>



d74ad812-c6f3-4fb3-95a3-931f65af8a1a



c95da1a0-034c-45a6-bdb9-694441fe2e30



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 09/03/2026 às 10:05:34
Documento Código: c95da1a0-034c-45a6-bdb9-694441fe2e30 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c95da1a0-034c-45a6-bdb9-694441fe2e30>

Básico, do Edital e seus anexos.

Modalidade: Concorrência;

Nº: 18/2024

Empresa vencedora do certame: MPB CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

Valor Homologado: R\$ 799.999,14

2- Em que data teve início o planejamento do Complexo Esportivo Multiuso da Pista de Arrancada?

R: A elaboração dos projetos foi iniciada no ano de 2019.

3- Qual secretaria ou órgão municipal é responsável pela concepção e coordenação do projeto?

R: Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu.

4- O projeto contempla quais modalidades esportivas, estruturas de apoio e áreas de uso comunitário?

R: O projeto é destinado à prática da modalidade esportiva automobilística, contemplando a implantação de áreas de estacionamento, estruturas de apoio, tais como sanitários, vestiários e praça de eventos, bem como pista de arrancada com respectivos boxes de apoio.

Adicionalmente, o projeto prevê a implantação de quadra para prática de esportes de areia e arquibancadas voltadas à área da pista de arrancada, destinadas à acomodação do público e à observação das atividades esportivas.

5- Em que data a obra foi oficialmente iniciada?

R: A referida informação deverá ser fornecida pela SMOB, tendo em vista que a gestão e a administração dos contratos executados são de sua competência.

6- Qual o prazo contratual originalmente previsto para conclusão?

R: Conforme apresentado na resposta inicial, os prazos previstos para a execução de cada obra encontram-se estabelecidos nos respectivos contratos de cada etapa. Ressalta-se que tais contratos estão disponíveis no Portal da Transparência para eventuais consultas.

7- Qual o percentual de execução física da obra até a presente data?

R: Estima-se que o percentual de execução do projeto do complexo, até o presente momento de desenvolvimento do projeto final, seja de aproximadamente 40%.

8- Houve aditivos contratuais de prazo ou valor?

R: A referida informação deverá ser fornecida pela SMOB, tendo em vista que a gestão e a administração dos contratos executados são de sua competência.

9- Em caso afirmativo, informar quantidade, valores individualizados e justificativas técnicas.

R: A referida informação deverá ser fornecida pela SMOB, tendo em vista que a gestão e a administração dos contratos executados são de sua competência.

10- O valor final da obra permanece dentro do orçamento inicialmente aprovado?



Autenticado com senha por EDINARDO ANTONIO BORBA DE AGUIAR - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO - 06/03/2026 às 16:47:39 e DIEGO FALKENBERG - DIRETOR DE GESTÃO DE PROJETOS PÚBLICOS E INFRAESTRUTURA URBANA - 06/03/2026 às 16:49:15
Documento Código: d74ad812-c6f3-4fb3-95a3-931f65af8a1a - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=d74ad812-c6f3-4fb3-95a3-931f65af8a1a>



d74ad812-c6f3-4fb3-95a3-931f65af8a1a



c95da1a0-034c-45a6-bdb9-694441fe2e30



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 09/03/2026 às 10:05:34
Documento Código: c95da1a0-034c-45a6-bdb9-694441fe2e30 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c95da1a0-034c-45a6-bdb9-694441fe2e30>

R: Sim, o valor permanece dentro do previsto inicialmente.

11- Qual o valor total estimado do Complexo Esportivo Multiuso?

R: O valor estimado para a execução do complexo esportivo é de aproximadamente R\$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de reais).

12- Quais são as fontes de recursos utilizadas (recursos próprios, convênios, emendas parlamentares, financiamentos)?

R: Royalties de Itaipu e PMFI / Ministério da Cidadania, por meio do Convênio nº 873666/2018. Ressalta-se que tais dotações encontram-se indicadas nos projetos básicos das respectivas etapas.

13- Foram emitidos relatórios técnicos de acompanhamento? Encaminhar cópias.

R: A referida informação deverá ser fornecida pela SMOB, tendo em vista que a gestão e a administração dos contratos executados são de sua competência.

14- Houve notificações, paralisações ou apontamentos de irregularidades durante a execução?

R: A referida informação deverá ser fornecida pela SMOB, tendo em vista que a gestão e a administração dos contratos executados são de sua competência.

15- Qual será o modelo de gestão do Complexo após sua conclusão (administração direta, concessão, parceria)?

R: A referida informação deverá ser fornecido pela SMEL, a qual e a Secretaria responsável pelo complexo.

16- Qual o público estimado a ser atendido pelo equipamento público?

R: A estimativa de público poderá variar conforme a natureza de cada evento, bem como em função de sua organização e da utilização das áreas e dos atrativos disponíveis para o evento.

Atenciosamente.



d74ad812-c6f3-4fb3-95a3-931f65af8a1a



c95da1a0-034c-45a6-bdb9-694441fe2e30



Autenticado com senha por EDINARDO ANTONIO BORBA DE AGUIAR - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO - 06/03/2026 às 16:47:39 e
DIEGO FALKENBERG - DIRETOR DE GESTÃO DE PROJETOS PÚBLICOS E INFRAESTRUTURA URBANA - 06/03/2026 às 16:49:15
Documento Código: d74ad812-c6f3-4fb3-95a3-931f65af8a1a - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=d74ad812-c6f3-4fb3-95a3-931f65af8a1a>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 09/03/2026 às 10:05:34
Documento Código: c95da1a0-034c-45a6-bdb9-694441fe2e30 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c95da1a0-034c-45a6-bdb9-694441fe2e30>

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **MEMORANDO INTERNO**

Número: **14.148/2026**

Assunto: **R: REQUERIMENTO Nº 4/2026**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.

Para verificar as assinaturas clique no link:

<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=d74ad812-c6f3-4fb3-95a3-931f65af8a1a>

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:
d74ad812-c6f3-4fb3-95a3-931f65af8a1a

Hash do Documento

69BDB75E933D5F61D2DDAA39C8FF49BA81FBDE91E4E945AB0A5EC9D0DE192F7E

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 09/03/2026 é(são) :

DIEGO FALKENBERG (Signatário) - CPF: ***08210909** em 06/03/2026 16:49:15 - **OK**

Tipo: Assinatura Eletrônica

EDINARDO ANTONIO BORBA DE AGUIAR (Signatário) - CPF: ***25052902** em 06/03/2026

16:47:39 - **OK**

Tipo: Assinatura Eletrônica



A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTES DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536, DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo, produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.



c95da1a0-034c-45a6-bdb9-694441fe2e30



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **OFÍCIO**

Número: **2.401/2026**

Assunto: **RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 4/2026**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.

Para verificar as assinaturas clique no link:

<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=c95da1a0-034c-45a6-bdb9-694441fe2e30>

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:
c95da1a0-034c-45a6-bdb9-694441fe2e30

Hash do Documento

F8819E87E8E514CBB58F92B808A12D573FA0BD6CFBCC7E3165DD32FE2DD8CAB4

Anexos

REQ 4-2026.pdf - **95edaac5-4384-48b8-b397-5a18e81c2556**

RESPOSTA REQ 4-2026 - MEMORANDO INTERNO- Nº 14435-2026 - SMOB.pdf -

17c36899-c6a7-4316-b695-54e39133761a

RESPOSTA REQ 4-2026 - OFICIO DE RESPOSTA AOS VEREADORES - SMOB - ANEXO 1.pdf -

51dc81b9-e2bc-4fc3-b2a6-7b50783d3245

SMOB RELATORIOS DE ACOMPANHAMENTO_COMPRESSED.pdf - **e97a3561-36cf-48a0-93cc-51a0d92da2fe**

RESPOSTA REQ 4-2026 - MEMORANDO INTERNO- Nº 14148-2026 - SMPU II.pdf -

1108fa19-28a7-4655-aabf-f5711c94e45e

RESPOSTA REQ 4-2026 - MEMORANDO INTERNO- Nº 8186-2026 - SMEL III.pdf -

9a4baf03-1a2a-4ad8-99bf-e0f41b357bb4

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 09/03/2026 é(são) :

JOAQUIM SILVA E LUNA (Signatário) - CPF: ***86476734** em 09/03/2026 10:05:34 - **OK**

Tipo: Assinatura Digital



A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo, produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.

